



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadli

30/04/68

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๖๖๘ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธรณ์ พริมาสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื้อ

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พทท.มณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๑๑๕ , ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา , บางเลน ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้ (ชค)

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 KV	๑ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ผกร.กรย.(ก.๓) ปฏิบัติงานเชื่อมสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อเตรียมการจ่ายไฟ AC สายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณ หน้า บ.ประปาไทย - แยกเคหะการเกษตร	- SLY3YS-04	- SLY3YS-05 - SLY3YS-06	นายวิศิษฐ์ นาคอิน ๐๘๑-๘๔๔๘๗๒๑
๒.	SLY08	๑ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว หน้า ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ มะระ	- BEU01S-07 - SLY04S-05	
๓.	SLY09	๑ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว หน้า ประปาไทย	- Dis ชั่วคราว แยก เคหะการเกษตร - BEU02S-05	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...แนวถนนศาลายา-บางเลน (ขาออก) มุ่งไป ตั้งแต่ น.ประปาไทย - แยกเคหะการเกษตร...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ บุญจรัญทรัพย์ ตำแหน่ง ขส.ปบ โทร. ๐๙๐-๙๖๒๔๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๔๔๕๑๖๕๓ Long ๑๐๐.๓๐๕๗๐๒๖๘

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๗๓๕๒๕๑๑ Long ๑๐๐.๒๙๒๕๐๙๔๕

(นายมานิช แนนเนื้อ)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)

กฟส.พทท.มณฑล

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผพ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 115kV จาก SL445-04 ถึง SL445-05, 06
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 532/68
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ 548 จาก ดย ๓๓. กัมพูชา/กม.ร.๕ ถึง BEU15-07, SL445-05
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ 5479 จาก ดย ๓๓. กัมพูชา/กม.ร.๕ ถึง BEU15-05
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....
25 พ.ค. 68

.....
(.....)
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. พทท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจพ. (.....) (.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณประปาไทย -เคหะการเกษตร | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 1 พ.ค. 68 | เวลา 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.พทท. | งานที่ทำ เชื่อมสายส่ง 115 เควี | ตามใบขอปฏิบัติงาน 532/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว | | วันที่ 27 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 27 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 27 เมษายน 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. น.ส.สุกษษา, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์, นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

[illegible]

[illegible]


[illegible]

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.


1. เมื่อชุด กบร.(ก3) ดำเนินการเชื่อมสายส่งที่จุด A B C D E และรีดออกเครื่องจักรที่จุด F แล้วเสร็จ จะขยปลดเครื่องจักรที่จุด G3 ออก เพื่อทำการจ่ายไฟ AC สายส่งถึง 115 เควี ตั้งแต่ SLY3YS-04 จนถึง ตฟฟ.1.ทพรมณฑล 3 ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. (ช่วงที่ AC สายส่ง 2. วิวนมอร์รี่ และ นรปฎาไทย ยังไม่จ่ายไฟ)

2. หลังจาก AC สายส่งถึง 115 เควีครบ 2 ชม. จะขอคืนไฟสายส่งทั้งหมด SLY3YS-04 จนถึง ตฟฟ.1.ทพรมณฑล 3 และดำเนินการรีดกราวด์สายส่งจุด G3 เพื่อปลดหมอบตา (เปิดวงจร) สายส่งที่จุด D และ E ออก


3. เมื่อชุดงาน กบร.(ก3) ปิดวงจรจุด D และ E แล้วเสร็จ (พร้อมตรวจสอบให้เต็มปลายสายให้เรียบร้อย) หน่วยงาน ไม่มีชุดงานปฏิบัติงานและลงจากเสา แล้ว สถานงาน กบร.(ก3) ปิดวงจรจุดจุด G1 - G5 ออกได้ทั้งหมด วงจร 22 เควี จ่ายไฟกลับถึงระบบได้จนเต็ม ส่วนมาตัง 115 เควี จะจ่ายไฟมายังจุด D ที่เปิดวงจรไว้



แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณ หน้า บ.ประปาไทย - แยกเคหะการเกษตร
 ชุดงาน กรม.(ก3) ปฏิบัติงานเชื่อมสายส่งเพื่อเตรียมการจ่ายไฟ AC สายส่ง 115 เควี
 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

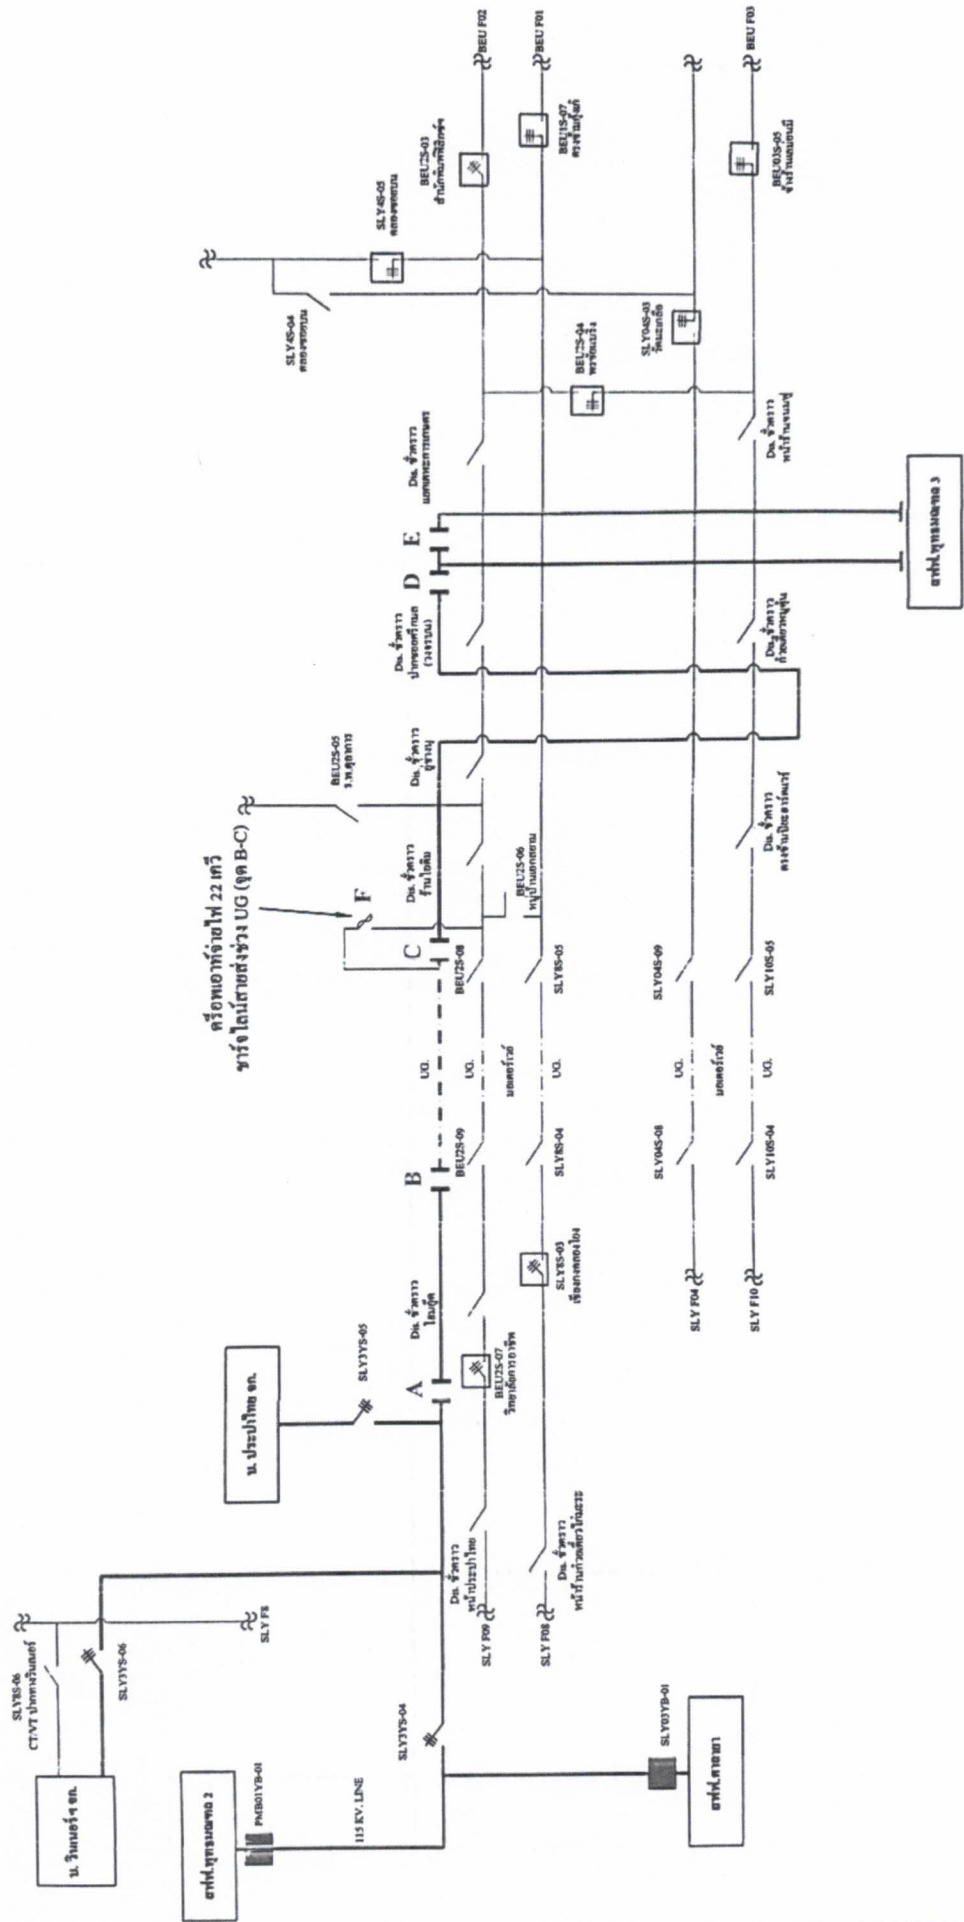

สายส่ง 115 เควี ช่วงข้ามถนน ตั้งแต่จุด D และ E ถึง ตัวอาคาร สฟฟ.พุทธมณฑล 3 ไมล์ไฟ





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟส. พุทธรณทล	
เลขที่รับ.....	2125
วันที่.....	17 เม.ย. 2568
เวลา.....	13:53 น.

จาก ผู้ควบคุมงาน

ถึง ผจก.กฟส.พุทธรณทล

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธรณทล ๓) จ.นครปฐม

เรียน ผจก.กฟส.พุทธรณทล

ตามอนุมัติที่ กรฟ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธรณทล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-PMNT0.0002 โครงการ 6001159272 (TL-C-E) โดยมี นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์ พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงานดังนี้

- เชื่อมสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๔๐๐ ตร.มม. เพื่อจ่ายไฟ

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พุทธรณทล ดำเนินการดังนี้

กฟส.พุทธรณทล

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บั้ม PT ถึง หน้าสถานีพุทธรณทล ๓ ระบบจำหน่าย ๒๒ KV.

และแรงต่ำ ทั้ง ๒ ฝั่งทางถนน

ทั้งนี้ขอให้ กฟส.พุทธรณทล ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานบนถนนทางหลวง และอำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน ตามวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์)

พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓)

ผู้ควบคุมงาน

E/O สยป. กฟส. พทท.

- จัดทำประกาศดับไฟตามวันดังกล่าว เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

- ประชุมชี้แจงคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี ทราบถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯ และขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกการจราจรจาก อบจ.สุพรรณบุรี

(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)

ชผ.ปบ.กฟอ.พุทธรณทล

21 เม.ย. 68

Check List


ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี CUT&TURN (สฟฟ.บางเลน - สฟฟ.ศาลายา) - สฟฟ.บางเลน ๒(พุทธมณฑล ๓) (WBS P-TDD๐๒๑-I-PMNT๐ ๐๐๐๒).....	
สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน...แนวถนน ศาลายา-บางภาษี (ขาออก) (ตั้งแต่ หน้า น.ประปาไทย - แยกเคหะการเกษตร).....	
วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น.จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น.	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....	
ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายไพรัช ท่มวงค์	
ตำแหน่ง.....ชจก.(ท).กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๑-๔๘๔๘๓๖๗.....	
ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์.....	
ตำแหน่ง.....พชง.๖.ผกร.กรย.(ก.๓)..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๑-๔๔๔๔๗๘๑.....	
หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าวชุดงาน ผกร.กรย.(ก.๓) และ ชุดงานระดม	
๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ) ชื่อ ..นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์.....ตำแหน่ง....ชม.ปบ.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๔๖๒๔๑๓๒.....	
๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ผปบ.....	
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่..... G1 G2 G3 G4 G5ผู้รับผิดชอบ.....ชุดเฉพาะกิจ ผปบ. จุดที่๒ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่๓..... ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....	
๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....หนังสือจาก พชง.๖ ผกร.กรย.(ก.๓)พร้อมแผนผัง Switching ☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล..... ☒ อนุมัติ ตามบันทึกที่.....หนังสือจาก พชง.๖ ผกร.กรย.(ก.๓)	
๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๐๙๓/๒๕๖๘, ลว. ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.จุฑารัตน ตนาโป่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล	
๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ ☐ ไม่แจ้ง เหตุผล..... ☒ แจ้ง จำนวน.....๖๐๐.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไฟหรือไม่..... ไม่	
๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่ ☐ ไม่จัดประชุม เหตุผล..... ☒ จัดประชุมวันที่.....๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘.....สถานที่ประชุม.....ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๒ กฟส.พุทธมณฑล วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม ผจก. , ชจก.(ท) , ทผ.ปบ. , ชม.ปบ. , จป.ว. , พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง	
๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่ ☒ ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....จะชี้แจงในวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๘ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน) ☐ จัดชี้แจงวันที่..... วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง	

C3 Safety CAP 01

.....

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

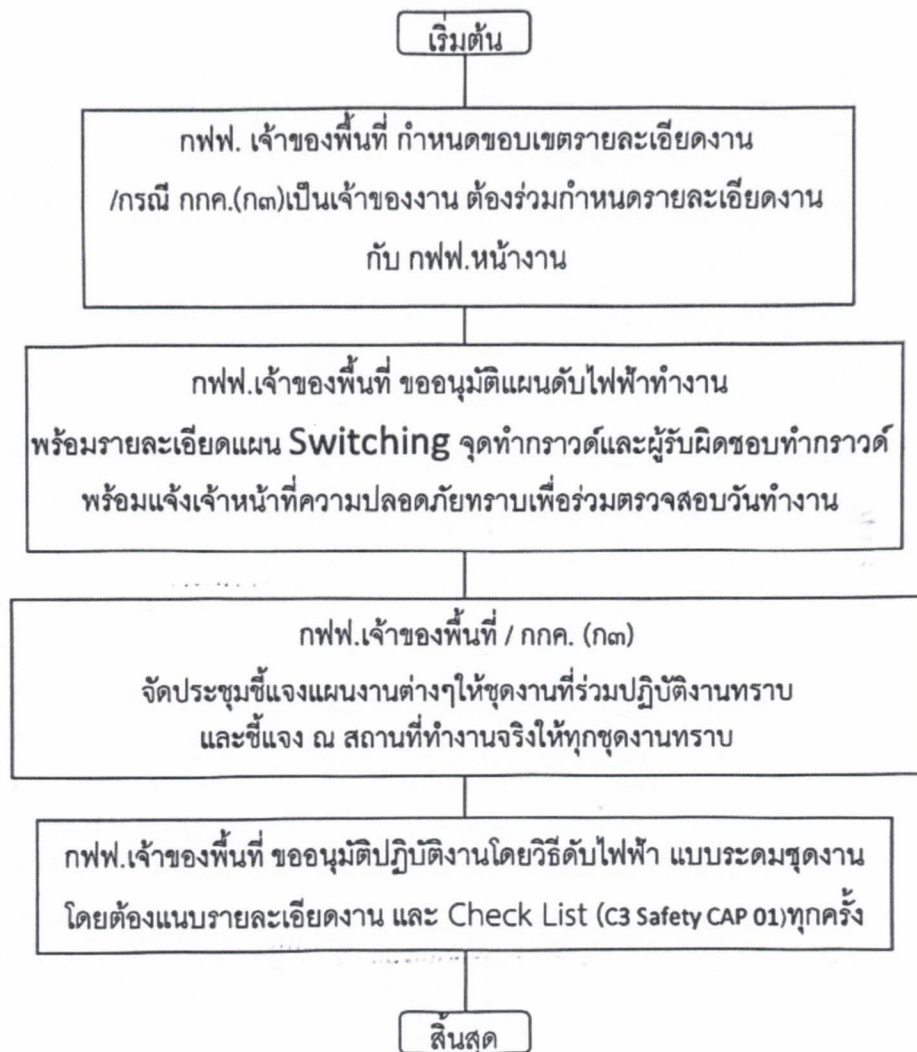



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๐๙๓/๒๕๖๘

วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผกร.กรย. (ก.๓) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานเชื่อมสายส่งเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการจ่ายไฟ งานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี สฟฟ.พุทธมณฑล ๓ บริเวณ แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาออก) ตั้งแต่ หน้า บ.ประปาไทย - แยกเคหะการเกษตร โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาฯ จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงาน ทั้งนี้ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ได้มอบหมายให้ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล เป็นผู้ประสานงานการดับกระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)
ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมานิช นนบเนื้อ)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

โทร ๑๕๔๕๕
