



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

09/04/68

เลขที่ ก.๓ กบข.(บอ) ๘๘๐ / ๒๕๖๘

วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัชรินทร์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

ตำแหน่ง อก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมอุปกรณ์ AIR Break Switch ระบบ ๑๑.๕ kV บริเวณปากซอยบริษัท วาย.อาร์.ซี เท็กไทล์ จำกัด รหัส SAA๐๕YS-๐๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAA๐๕YB-๐๑	๑๓ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับไฟเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ AIR Break Switch ๑๑.๕ kV	DDE ปากซอยเข้าบริษัท วายอาร์ซี เท็กไทล์ จก.	ปลายสาย (บริษัท วาย.อาร์.ซี เท็กไทล์ จำกัด)	นายมนตรี มาลาศรี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี มาลาศรี ตำแหน่ง วิศวกร.พ.สนอ.กบข.(ก๓) โทร ๐๘-๗๘๐๒-๕๗๗๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อก.บษ.(ก๓)

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAA55 จาก DDE ปากซอย ๖๕๕ ถึง ปลายสาย ๖๕๕

ในวันที่ 13 เม.ย ๖๘ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 551/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชนทอน ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายมนตรี มาลาศรี

(นายพัชรินทร์ พิชราสุวรรณชล)
อส.๕ แทน นพ.ดพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ทผ.


มงคลชัย

๒๖ มี.ค.๖๘

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ABS.115 KV หน้า YRC				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ซ่อม ABS.115 KV. หน้า YRC		ตามใบขอปฏิบัติงาน 551/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	5 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. น.ส.สุกษา,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-	
2	ONC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC			
3	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA			
4	เมื่อพร้อมดับไฟ 115 KV							
5	SAA05YS-10	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อมน.			ABS.115 KV.YRC
6	SAA05YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อมน.			ABS.115 KV.YRC
7	แจ้ง HL.115 KV ปลด DDE บริเวณหน้า บ.YRC ก่อนเข้า ABS 115 KV ออกทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ							
8	หลังจาก HL.115 KV ปลด DDE บริเวณหน้า บ.YRC ก่อนเข้า ABS 115 KV ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย							
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
10	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
11	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-	
12	ONC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC			
13	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA			
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
14	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
15	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
16	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-	
17	ONCC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC			
18	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA			
19	แจ้ง HL.115 KV เชื่อม DDE บริเวณหน้า บ.YRCก่อนเข้า ABS 115 KV เข้าทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ							
20	หลังจาก HL.115 KV เชื่อม DDE บริเวณหน้า บ.YRC ก่อนเข้า ABS 115 KV เข้าทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย							
21	SAA05YS-05	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		อมน.			ABS.115 KV.YRC
22	SAA05YS-10	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		อมน.			ABS.115 KV.YRC
23	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-	
24	ONC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC			
25	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA			

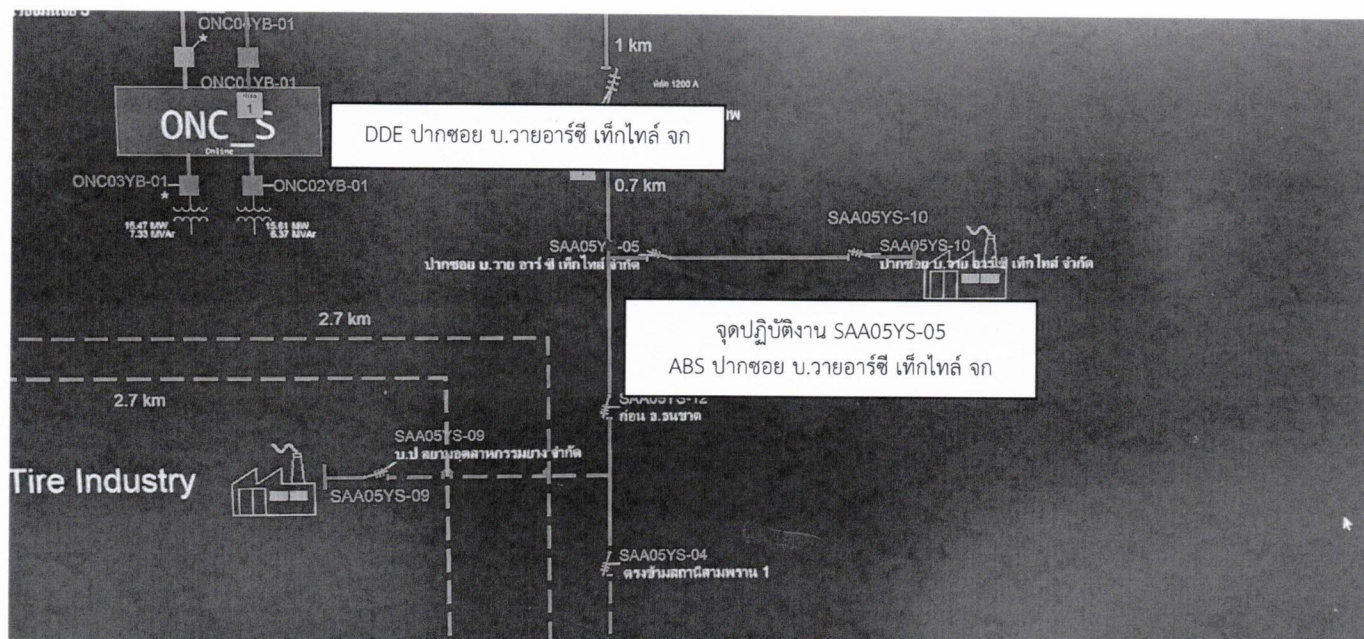



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่ ก.๓ อม.น.(ปป.)

/๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแจ้งดำเนินการแก้ไข Air break switch ๑๑๕ เควี

ถึง กฟจ.สมุทรสาคร

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร

เนื่องจากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ กฟส.อ้อมน้อย ทำการปลด-สับ อุปกรณ์ Air break switch ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ของบริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซิล จำกัด พบปัญหา อุปกรณ์ Air break switch รหัส SAA05YS-05 เฟส A สับไม่สนิท สภาพใบมีดโก่งงอ

รายละเอียด

- Air break switch ๑๑๕ เควี รหัส SAA05YS-05 lat : ๑๓.๗๐๐๐๖๘, ๑๐๐.๒๙๘๘๐๒

ทั้งนี้ บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซิล จำกัด ได้แจ้งกำหนดการดับไฟครั้งต่อไป เป็นวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ดังนั้น กฟส.อ้อมน้อย จึงเห็นควรแจ้ง ให้ กบข.(ก๓) เข้าดำเนินการ ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข ในวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แจ้งส่วนเกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

๑๕ มก ๒๕๖๘

ที่ ก๓ อม.น.(ปป.) ๑๕ /๒๕๖๘

เรียน อก.บข.(ก๓)

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ต่อไปด้วย


(นายวรชัย แก้ววิจิตร)

ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร

20 มกราคม 2568

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร ๑๔๓๖๐



集 綸 織 維 有 限 公 司
บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
Y.R.C. TEXTILE COMPANY LIMITED

134, 134/2, 134/3 หมู่ 6 ถนนเสริมธุรกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
134, 134/2, 134/3 Moo 6, Sathakit 1st Road, Oam Noi, Kratoomband, Samudsakorn 74130
Tel : 0-2810-4500 (30 สาย), 0-2420-2107, 0-2420-0871, 0-2420-1055-6 Fax : 0-2420-1516

กฟส. อ้อมน้อย เลขที่รับ.....
วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๙:๕๒

ที่ แผนกพลังงาน. 02/2568

13 มกราคม 2568

เรื่อง ขออนุญาตดับไฟเพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 KV และแก้ไข DS 115 KV

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย

อ้างถึง หนังสือแจ้ง เลขที่ 01/2568 ลงวันที่ 3 มกราคม 2568

ตามที่บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด ได้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย ตรวจสอบ DS 115 KV. เพื่อให้ตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนอุปกรณ์ ตามที่อ้างอิง นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะบำรุงรักษาสถานี 115/22 KV วันที่ 13 เมษายน 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น. จึงขออนุญาตให้การไฟฟ้าฯ ช่วยส่งเจ้าหน้าที่ทำการตัดไฟก่อนที่บริเวณทางเข้าซอยแปซิฟิกและดำเนินการแก้ไข DS 115 KV. ที่พบปัญหาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

✓	รจก.(ล)
✓	รจก.(ท)
	พชน.๙
	พชน.๘
	นวช.๙
	นวช.๘
	นตก.
	วศก.
	พพ.สน
	พพ.ปร
	พพ.มต
	พพ.บส
✓	พพ.ปบ
	พพ.เส
	ทอ
	จป.ล
	ห้อง LAN

- ☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ผจก. กฟส.อ้อมน้อย

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นายสมโชค สุวดีศักดิ์)

รองผู้จัดการโรงงาน

ผู้ประสานงาน : นายเอกชัย เปี้ยนสูงเนิน

(โทร. 084-4243513)

