



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๕๕๒ /๒๕๖๘

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

ตำแหน่ง ขจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา
ตามแผนผังลึงเซบแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY04	๑๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ผกร.กรย.(ก.๓) ปฏิบัติงานปักเสาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้างสายส่ง ๓๓.๕ เควี บริเวณ หน้า สฟฟ.พุทธมณฑล ๓	- SLY04S-08	- SLY04S-03	นายวีรพัฒน์ นาคอนันต์ ๐๘๑-๙๔๔๙๙๘๘๘
๒.	SLY10	๑๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว ตรงข้ามร้าน ปิยะฮาร์ดแวร์	- Dis ชั่วคราว หน้าร้านขนมกุ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....แนวถนนสวนหลวงวรางภาณี (ขว.เข้า) ตั้งแต่ ตลาดแยกเคหะฯ - ตรงข้ามร้านปิยะฮาร์ดแวร์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบลูจทรัพย์ ตำแหน่ง ขผ.ป.บ. โทร ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

ชื่อผู้ส่ง

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พักพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๖๖๗๒๔๓ Long ๑๐๐.๒๙๕๓๙๔๗

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๖๗๗๗๗๗ Long ๑๐๐.๒๙๐๗๖๒๖๔

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)
ขจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแนบควบคุมการจ่ายไฟ (ผศ.ฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผศ.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SLY4 จาก SLY04S-09 ถึง SLY04S-03

ในวันที่ 10 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 565/2568

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SLY10 จาก อีสต.ทพ.ห้วยมะพร้าวถึง อีสต.วังนพบุรี.

ในวันที่ 10 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ ราชกิจจานุเบกษา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปราโมทย์ เบลูจทรัพย์

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)
๖๓.๕ กก. นพ.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. มกท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวทซึ่ง ๗ แผ่น
แผนผังแนบ ๖ แผ่น

ผจท. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


พิเศษ (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	หน้า สฟฟ.พุทธมณฑล 3					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	10 เม.ย. 68	17.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี			ตามใบขอปฏิบัติงาน 565/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	8 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	จิรัช			วันที่	8 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดาน,นายวัดนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายโมฆ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร์,นายขุนทอง,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-	
3	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-	
4	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	L=4.66MW.	
5	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	L=1.58MW.	
6	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	L=8.04MW.	
7	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	L=1.75MW.	
8	ย้ายโหลด SLY04 บางส่วนไปจ่ายจาก SLY08							
9	SLY04S-05	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 คลองขอยบน	
10	SLY04S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		พทท.	SCADA	SF6 วัดมะเกลือ	
11	ย้ายโหลด SLY10 บางส่วนไปจ่ายจาก SLY09							
12	BEU02S-04	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 พรชัยแบร์	
13	DIS ชั่วคราว SLY10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS หน้าร้านขนมฟู(บน)	
14	เมื่อพร้อมดับไฟ							
15	DIS ชั่วคราว SLY10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS ตรงข้ามร้านปิยะฮาร์ดแวร์(บน)	
16	SLY04S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		UG มอเตอร์เวย์(SLY04)	
17	SLY04S-09	สับ	ปลด		พทท.		UG มอเตอร์เวย์(SLY04)	
18	แจ้ง กฟส.พทท. ตรวจสอบ SF6 SLY04S-05 คลองขอยบน อยู่สถานะ OFF ให้ล๊อคคาน							
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ							
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
24	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้							
26	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-	
27	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-	
28	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-	
29	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-	
30	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-	
31	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-	

[illegible]

แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณ หน้า สฟ.พุทธมณฑล 3


**** ผกร.กรย.(ก.3) ปฏิบัติงานปักเสาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ****
วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

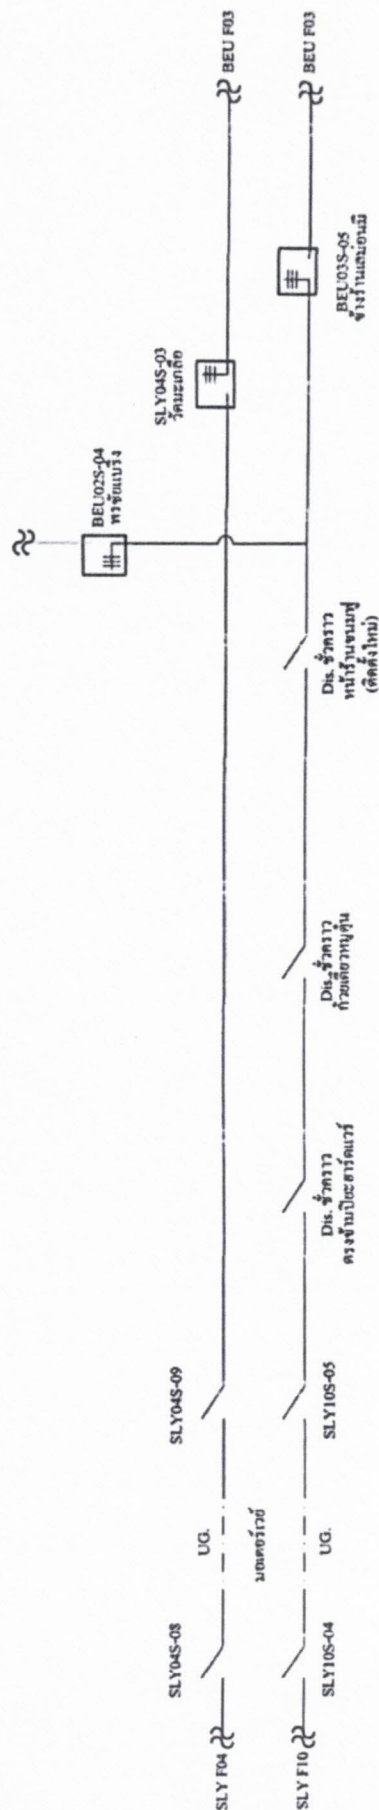

แผนผัง กอนคัฟไฟ บริเวณ หน้า สฟฟ.พพทมณฑล 3

** ผกร.กรย.(ก.3) ปฏิบัติงานปักเสาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี **

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

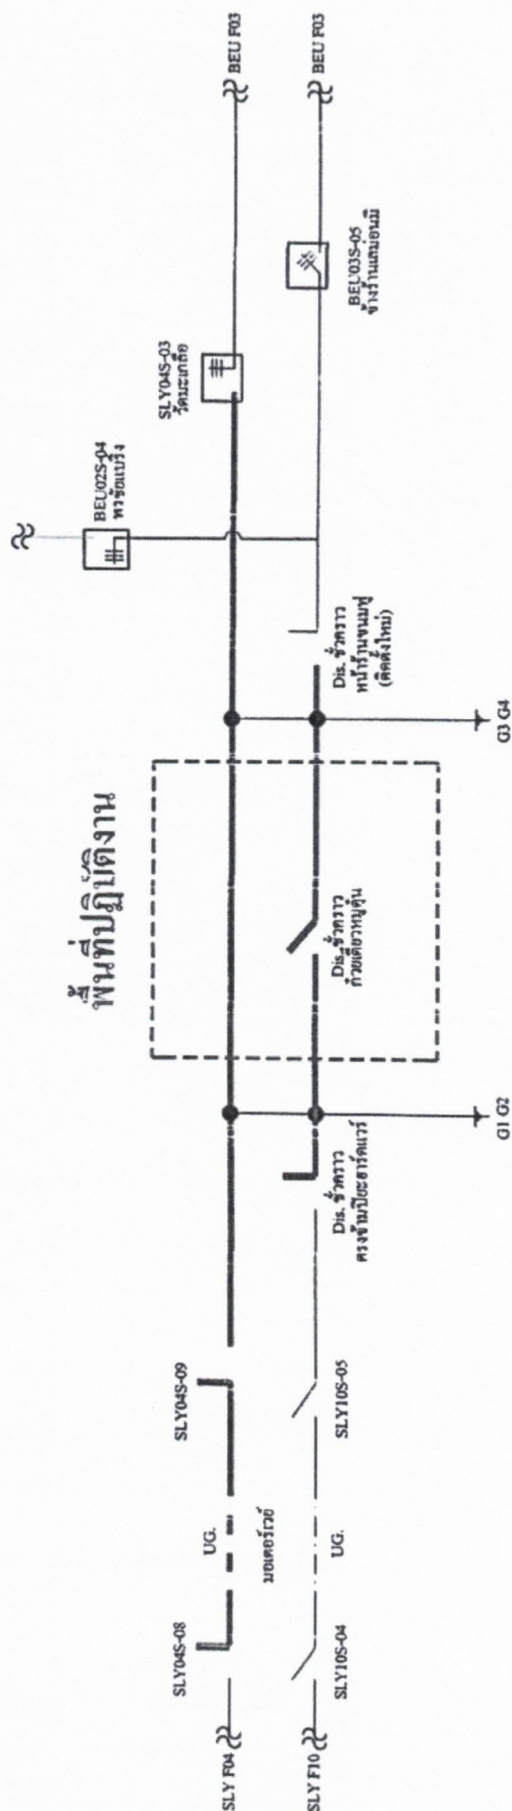

จุดชื้อดกราวด์ / สถานี / พัก	
G1 G2	เสาต้น Dis. ตรงข้ามบิยะฮาร์ดแวร์ 13.8667243, 100.2953947
G3 G4	หน้าร้านกระเพาะเปิดแยกเคหะการเกษตร 13.8763697, 100.2912824

หมายเหตุ 1. วงจร SLY04 ตั้งแต่ SLY04S-08 ถึง SLY04S-03 ไม่มีโหนดหมอนแปลงเกาะในไลน์
 2. Dis. ชั่วคราวหน้าร้านขนมฟูติดตั้งใหม่รอ Hotline เชื่อมเข้าระบบวันที่ 9 เม.ย. 68



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงาน ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้า
บางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม
เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ตามอนุมัติที่ กรฟ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบ
สายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒
(พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-PMNT0.0002 โครงการ 6001159272 (TL-C-E) โดยมี
นายวิวัฒน์ นาคสมัย พงช.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงาน
ดังนี้

- ติดตั้งอุปกรณ์แบบ DDE จำนวน ๒ ชุด
- ปักเสา คอ. ขนาด ๒๒ เมตร จำนวน ๔ ต้น

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV.
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พุทธมณฑล ดำเนินการดังนี้

กฟส.พุทธมณฑล

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ
- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ หน้าสถานีพุทธมณฑล ๓ ระบบจำหน่าย ๒๒ KV.

และเร่งทำ

ทั้งนี้ขอให้ กฟส.พุทธมณฑล ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่
ตำรวจ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานบนถนนทางหลวง และอำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน ตามวันและ
เวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายวิวัฒน์ นาคสมัย)
พงช.๖ ผกร.กรย.(ก๓)
ผู้ควบคุมงาน

อนุมัติตามเสนอ

E/O ศยฟ.กฟส.พุทธมณฑล

- จัดทำประกาศดับไฟตามวันและเวลาดังกล่าว แจ้งทั่วพื้นที่
08.00 - 17.00 น.
- ให้เจ้าหน้าที่ กฟส.พุทธมณฑล ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไปทบท
วันหน้า ทราบต่อไป

(นายปรามทย์ บุญจรรย์)
ชม.ปบ.กฟอ.พุทธมณฑล

1 เม.ย. ๖๔

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี CUT&TURN (สฟฟ.บางเลน - สฟฟ.ศาลายา) - สฟฟ.บางเลน ๒(พุทธมณฑล ๓) (WBS P-TDO๐๒๑-LPMNT๐ ๐๐๐๒).....
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน แนวถนน ศาลายา-บางภาษี ซาเข้า (ตั้งแต่ ตลาดแยกเคหะการเกษตร - ตรงข้ามร้านบิยะฮาร์ดแวร์)
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น.จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น..
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสินใจแก้ไขปัญหาคือ) ชื่อ..... นายไพรัช ทุมวงศ์
 ตำแหน่ง.....ชจก.(ท).กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๑-๔๘๔๘๖๗.....
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายวิรัตน์... นาคลัมย์.....
 ตำแหน่ง..... พชง.๖.ผกร.กรย.(ก.๓)..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๑-๔๔๔๔๗๘๑.....
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว
ชุดงาน ผกร.กรย.(ก.๓) และ ชุดงานระดม

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
 ชื่อ ..นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์.....ตำแหน่ง..... ชผ.ปบ.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๔๐-๔๖๒๔๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ผปบ.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑..... G1 G2 G3 G4ผู้รับผิดชอบ...ชุดแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ผปบ..
 จุดที่๒ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓.....
 ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่... หนังสือจาก พชง.๖ ผกร.กรย.(ก.๓)พร้อมแผนผัง Switching
☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล
☒ อนุมัติ ตามบันทึกที่... หนังสือจาก พชง.๖ ผกร.กรย.(ก.๓)


๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่... ก.๓ พทท.(ปบ.) ๐๘๒/๒๕๖๘ , ลว. ๑ เม.ย.๒๕๖๘
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ... น.ส.จุฑารัตน ดุนาโปง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
☐ ไม่แจ้ง เหตุผล.....
☒ แจ้ง จำนวน ๑๒๐ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ไฟฟ้าในพื้นที่ดับไฟหรือไม่ ไม่

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
☐ ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
☒ จัดประชุมวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๘ สถานที่ประชุม ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๒ กฟส.พุทธมณฑล
 รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผจก. , ชจก.(ท) , ผผ.ปบ. , ชผ.ปบ. , จป.ว. , พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
☒ ไม่จัดชี้แจง เหตุผล...จะชี้แจงในวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)
☐ จัดชี้แจงวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

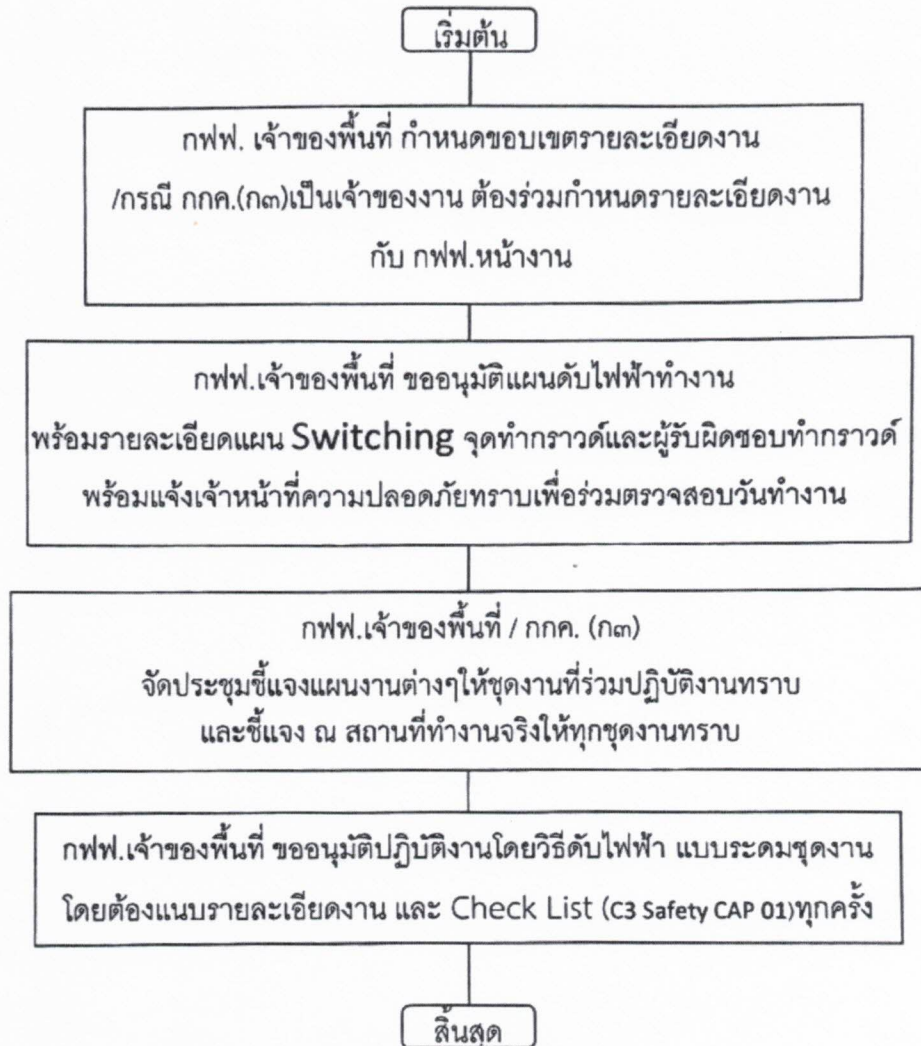



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปป.) ๐๘๒/๒๕๖๘

วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว. เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผกร.กรย.(ก.๓) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปักเสาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณ แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาเข้า) ตั้งแต่ ตลาดนัดแยกเคหะการเกษตร - ตรงข้ามร้านปิยะฮาร์ดแวร์) โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตุนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงาน ทั้งนี้ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ได้มอบหมายให้ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล เป็นผู้ประสานงานการดับกระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)

ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ชจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

โทร ๑๕๔๕๕
