



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 เม.ย. 68

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๒๓๐ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อ ฉีดน้ำล้าง UG ๑๑๕ เควี ปากทางกะเบื่องลิลลา

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ kV	๑๕ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อให้ฮอท ไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี ฉีดน้ำล้าง UG ๑๑๕ เค วี ปากทางกะเบื่องลิลลา ถนนพระราม ๒	SMC๐๖YS-๐๕ มั่นคงพาวิลเลียน	SMC๐๖YS-๑๕ ทางเข้าบริษัทพี ริเออร์	นายจิรวุฒิ บุญพร้อม โทร.๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	๑๑๕ kV	๑๕ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.		SMC๐๖YS-๐๕ มั่นคงพาวิลเลียน	SMC๐๖YS-๐๕ ช่วงปั้มเซลล์ สถานีฯ สก. ๕ SMC 0745-05	กันชนทวลศิลป์
๓	๑๑๕ kV	๑๕ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.		SMC๐๖YS-๐๕ มั่นคงพาวิลเลียน	สถานีฯ สค.๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริษัทพีริเออร์ พัดส์ (ประกวดดับไฟเรียนร้อย)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวุฒิ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก SMC06YS-05 ถึง SMC06YS-15
ในวันที่ 15 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 583/2568

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115kV จาก SMC06YS-05 ถึง สกน. ๙ สก. ๘, SMC06YS-05
ในวันที่ 15 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 583/๖๘

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 115kV จาก SMC06YS-05 ถึง สกน. ๙ สก. ๖ (SMC06YSB-01)
ในวันที่ 15 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 583/๖๘

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ ^{ท.ร.} ~~นาย~~ สุทธิยา วงศ์บุญสม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายรัตนัน บุญพ้อม

^{สุวิภา}
(นางสาวสุวิภา วงศ์บุญสม)
๓๓.๕ แทน นพ.ดล.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟภ. บ.นจ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. 1,2 (สถานี SMC, SMU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	UG 115 เครี ปากทางกระเบื้องสีลา					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 เม.ย. 68	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.	งานที่ทา	ฉัดน้ำล้าง UG 115 เครี	ตามใบขอปฏิบัติงาน 583/2568		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภษา วงศ์บุญมาก			วันที่	6 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.สุภษา,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพิรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SMC06YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
3	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		
4	SMUBR-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMU		
5	SMUBR-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMU		
6	SMUBR-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMU		
7	SMUBR-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMU		
8	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		
9	SMX05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		
10	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
11	EKA02VB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		
12	ย้ายโหลด SMU01 ไปรับไฟจาก EKA02						
13	EKA02S-08	ปลด	ล๊ับ		บนจ		SF6 ยูนิเวอร์แซล
14	SMUBR-01	ล๊ับ	ปลด		SMU		
15	ย้ายโหลด SMU02 ไปรับไฟจาก SMU04						
16	SMU02S-02	ปลด	ล๊ับ		บนจ		DIS หน้าสถานีฯ สค.8
17	SMUBR-02	ล๊ับ	ปลด		SMU		
18	ย้ายโหลด SMU04 ไปรับไฟจาก SMX04 และย้ายโหลด SMU03 ไปรับไฟจาก SMX05						
19	SMX04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SMX		
20	SMU03S-03	ปลด	ล๊ับ		บนจ		DIS หน้าสถานีฯ สค.8 (เก่า)
21	SMUBR-03	ล๊ับ	ปลด		SMU		
22	SMUBR-04	ล๊ับ	ปลด		SMU		
23	SMU01YB-01	ล๊ับ	ปลด		SMU		เบรกเกอร์ 115 เครี
24	SMU01YS-01	ล๊ับ	ปลด		SMU		ใบมิด 115 เครี
25	เมื่อพร้อมดับไฟ ระบบ 115 เครี เวลา 09.30 น.						
26	บริษัท พรีเมียร์ ฟู้ดส์ จำกัด ปลดโหลดภายในเรียบร้อย						
27	SMC06YB-01	ล๊ับ	ปลด		SMC		เบรกเกอร์ 115 เครี
28	SMC06YS-02	ล๊ับ	ปลด		SMC		ใบมิด 115 เครี
29	SMC06YS-03	ล๊ับ	ปลด		SMC		ใบมิด 115 เครี
30	SMC06YS-15	ล๊ับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สค.		ABS ปากทางเข้าบ.พรีเมียร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	ตรวจสอบ SMC06YS-05 LBS หมู่บ้านมั่นคงพาววิลเลียน อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
32	ตรวจสอบ SMC07YS-05 LBS ร้านคณิตสตีล อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
33	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ศค. รับทราบ						
34	เมื่อ กฟส.ศค. ทำการ Test ไฟก่อนปฏิบัติงานพร้อมลงข้อมูลใน WeSafe ให้เรียบร้อย จากนั้นแจ้งปฏิบัติงานได้						
35	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		
36	SMX04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		
37	SMX05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		
38	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		
39	EKA02VB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
40	เมื่อ กฟส.ศค. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
41	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
42	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		
43	SMX04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		
44	SMX05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		
45	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
46	EKA02VB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		
47	จ่ายไฟระบบ 115 เควี						
48	SMC06YS-02	ปลด	สับ		SMC		ใบมีด 115 เควี
49	SMC06YS-03	ปลด	สับ		SMC		ใบมีด 115 เควี
50	SMC06YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
51	SMC06YS-15	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		ศค.	ABS	ปากทางเข้าบ.พีริเชียร์ฟ
52	จ่ายไฟสถานีฯ สมุทรสาคร 8						
53	SMU01YS-01	ปลด	สับ		SMU		ใบมีด 115 เควี
54	SMU01YB-01	ปลด	สับ		SMU		เบรกเกอร์ 115 เควี
55	ย้ายโหลด SMU04 กลับจาก SMX04 และย้ายโหลด SMU03 กลับจาก SMX05						
56	SMUBR-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMU		
57	SMUBR-04	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMU		
58	SMU03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ	DIS	หน้าสถานีฯ ศค.8 (เก่า)
59	SMX04VB-01	สับ	ปลด		SMX		
60	ย้ายโหลด SMU02 กลับจาก SMU04						
61	SMUBR-02	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMU		
62	SMU02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ	DIS	หน้าสถานีฯ ศค.8
63	ย้ายโหลด SMU01 กลับจาก EKA02						
64	SMUBR-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMU		
65	EKA02S-08	สับ	ปลด		บนจ	SF6	ยูนิเวอร์แซล
66	SMC06YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
67	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU		
68	SMUBR-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMU		
69	SMUBR-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMU		
70	SMUBR-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMU		

ร.ร.	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
71	SMUBR-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMU			
72	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX			
73	SMX05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX			
74	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA			
75	EKA02VB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA			
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก								

สถานะการจ่ายไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงาน

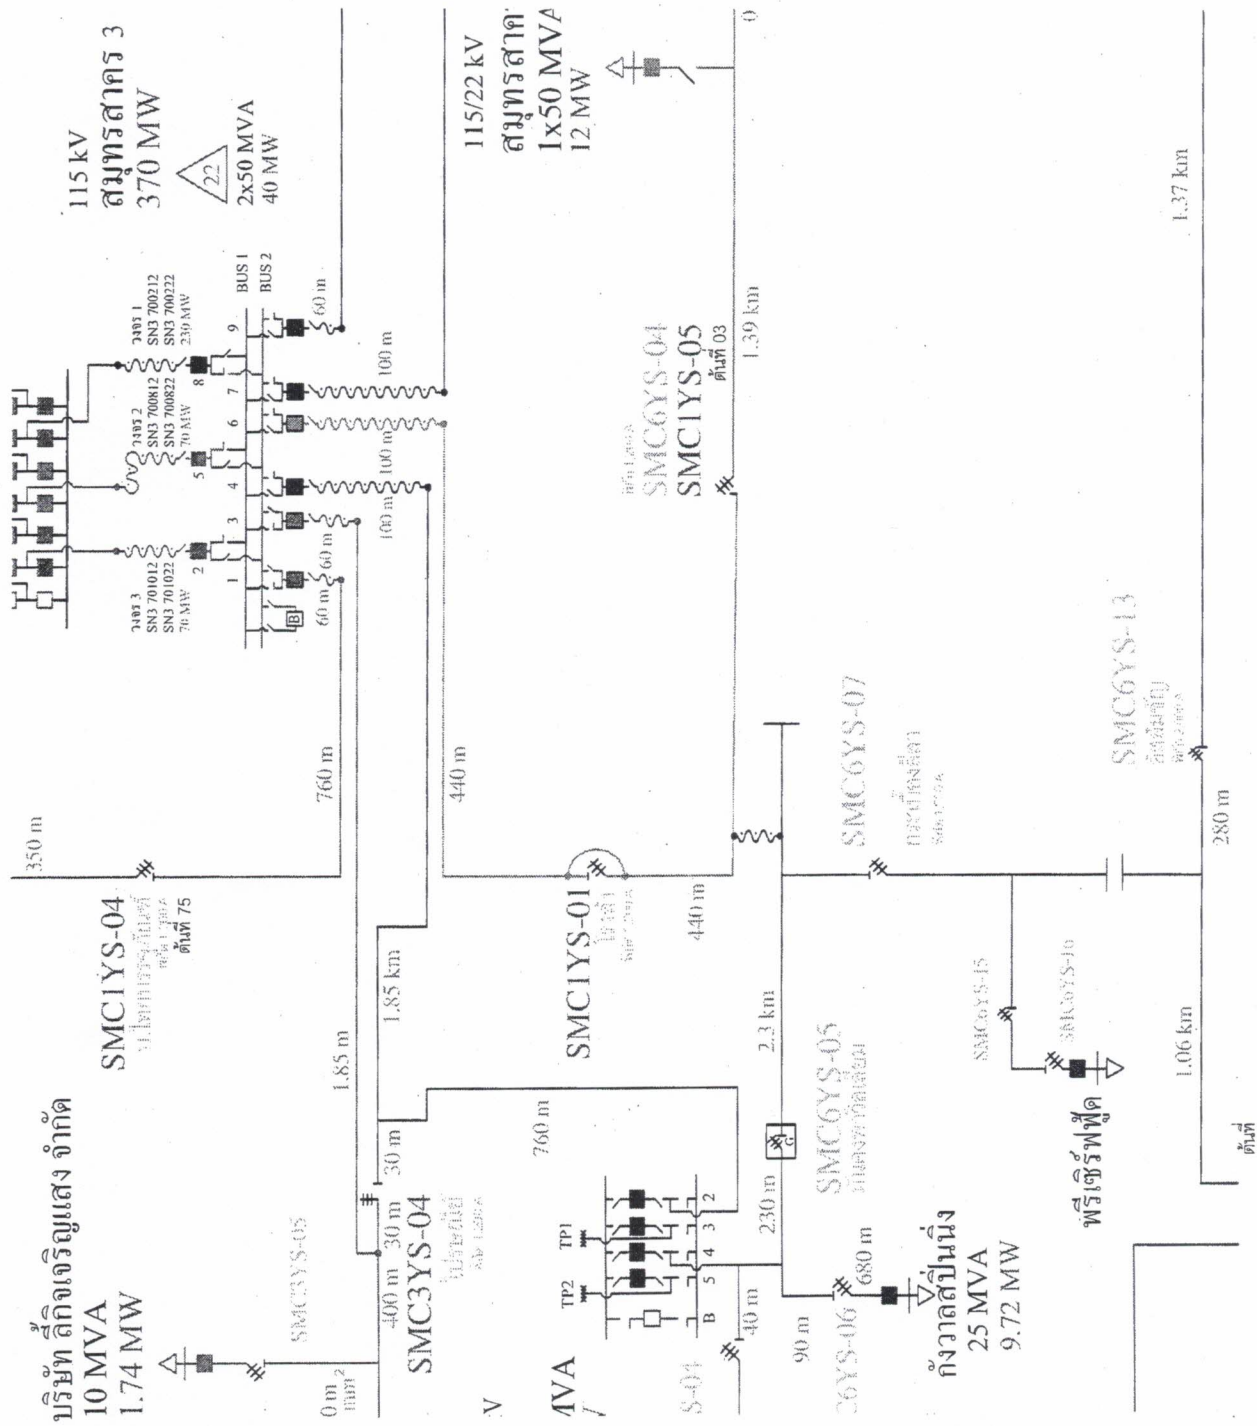



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ สค.(ปป) ๒๒๐๘ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายนิวัฒน์ มาประจวบ
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.บช.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟส.สค.

ด้วย กฟส.เมืองสมุทรสาคร กำหนดแผนงานเพื่อติดตั้งน้ำล้าง UG ระบบสายส่ง ๑๑๕ kV แรงดัน จากกรณีเกิดประกายไฟที่ UG ๑๑๕ kV บริเวณ ปากซอยกระเบื้องสีลา ในวันอังคารที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘ และในการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้ชุดท่อไลน์กระเช้าระบบ ๑๑๕ เควี เข้าร่วมปฏิบัติงานติดตั้งน้ำล้างอุปกรณ์ UG ทั้ง ๒ ฝั่ง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด กฟส.เมืองสมุทรสาคร จึงขอความอนุเคราะห์ กบช.(ก๓) พิจารณาจัดส่งชุดท่อไลน์กระเช้าระบบ ๑๑๕ เควี เข้าร่วมปฏิบัติงานตามวันและเวลาดังกล่าว โดยให้ประสานงานกับ นายยจิววัฒน์ บุญพร้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
โทร. ๑๔๐๕๕
