



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

08/04/68

เลขที่ ก.๓.ลญ.(กป.)- ๑๔๑ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ โจนธรรมเจริญ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ลาดหญ้า

ด้วย.....กฟส.ต.ลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....ดับไฟฉุกเฉินตัดต้นไม้คร่อมระบบจำหน่ายแรงสูง.....ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....๑๗.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TTNo๔	๘ เม.ย.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับไฟฉุกเฉินเพื่อตัดต้นไม้ คร่อมระบบจำหน่ายแรงสูง / บริเวณบ้านหมอเฒ่า	DIS ชั่วคราว ครัวฮาลาล	DIS ชั่วคราว ตรงข้ามวัด หมอเฒ่า	นายจักรพันธ์ พรหมศรี จันทร์ ๐๙๖-๐๐๓-๙๙๖๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจรัสพล โสขิตพล.....ตำแหน่ง.....พช.๗.....เบอร์โทร.....๐๘๔-๘๘๔-๙๙๑๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายสันติ โจนธรรมเจริญ.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ลาดหญ้า.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TTN4 จาก DIS ช. ครัวฮาลาล ถึง DIS ช. ตรงข้ามวัดหมอเฒ่า
ในวันที่ ๙ เม.ย. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 586/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๙๙๔ ทอชอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจรัสพล โสขิตพล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ลาดหญ้า

อภ.บช.(ก.๓), อภ.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายอภ.วิรัตน์ ยางวรวิรัตน์
๑๐๓.5 กก. นว.๐๗.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก๓)

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | TTNBR-04 | Normal | Nonreclosing | | TTN | | R - |
| 3 | ย้ายโหลดเปลี่ยนทางการจ่ายไฟ TTN04 | | | | | | |
| 4 | D/F ชค. TTN04 | ปลด | สับ | | ลญ. | | DF ร้านเพลิน |
| 5 | DIS ชค. TTN04 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ลญ. | | DIS ตรงข้ามวัดหมอเฒ่า |
| 6 | เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน 08.30 น. | | | | | | |
| 7 | DIS ชค. TTN04 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ลญ. | | DIS ครั้วศาลาล |
| 8 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ | | | | | | |
| 9 | แจ้ง กฟส.ลญ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 10 | แจ้ง กฟส.ลญ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 11 | หลังจาก กฟส.ลญ. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย | | | | | | |
| 12 | TTNBR-04 | Nonreclosing | Normal | | TTN | | R - |
| 13 | แจ้งผู้ควบคุมจ่าย ให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | |
| 14 | เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 15 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 16 | TTNBR-04 | Normal | Nonreclosing | | TTN | | R - |
| 17 | แจ้ง กฟส.ลญ. ทำการปลด Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 18 | แจ้ง กฟส.ลญ. ทำการปลด Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 19 | หลังจากชุดปฏิบัติงานปลด Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว | | | | | | |
| 20 | พร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 21 | DIS ชค. TTN04 | ปลด | สับ | | ลญ. | | DIS ครั้วศาลาล |
| 22 | ย้ายโหลดเปลี่ยนทางการจ่ายไฟ TTN04 กลับสภาพปกติ | | | | | | |
| 23 | DIS ชค. TTN04 | ปลด | สับ | | ลญ. | | DIS ตรงข้ามวัดหมอเฒ่า |
| 24 | D/F ชค. TTN04 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ลญ. | | DF ร้านเพลิน |
| 25 | TTNBR-04 | Nonreclosing | Normal | | TTN | | R - |
| | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | |

แผนปฏิบัติการหอผู้ป่วยเฉพาะคน

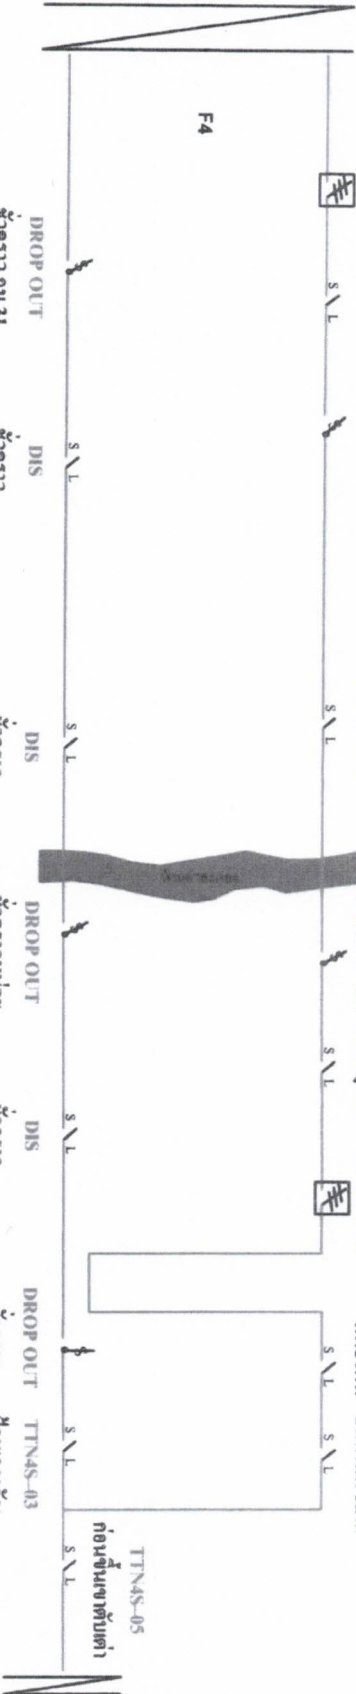


สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุด Short ground G1,G2

พื้นที่พัก

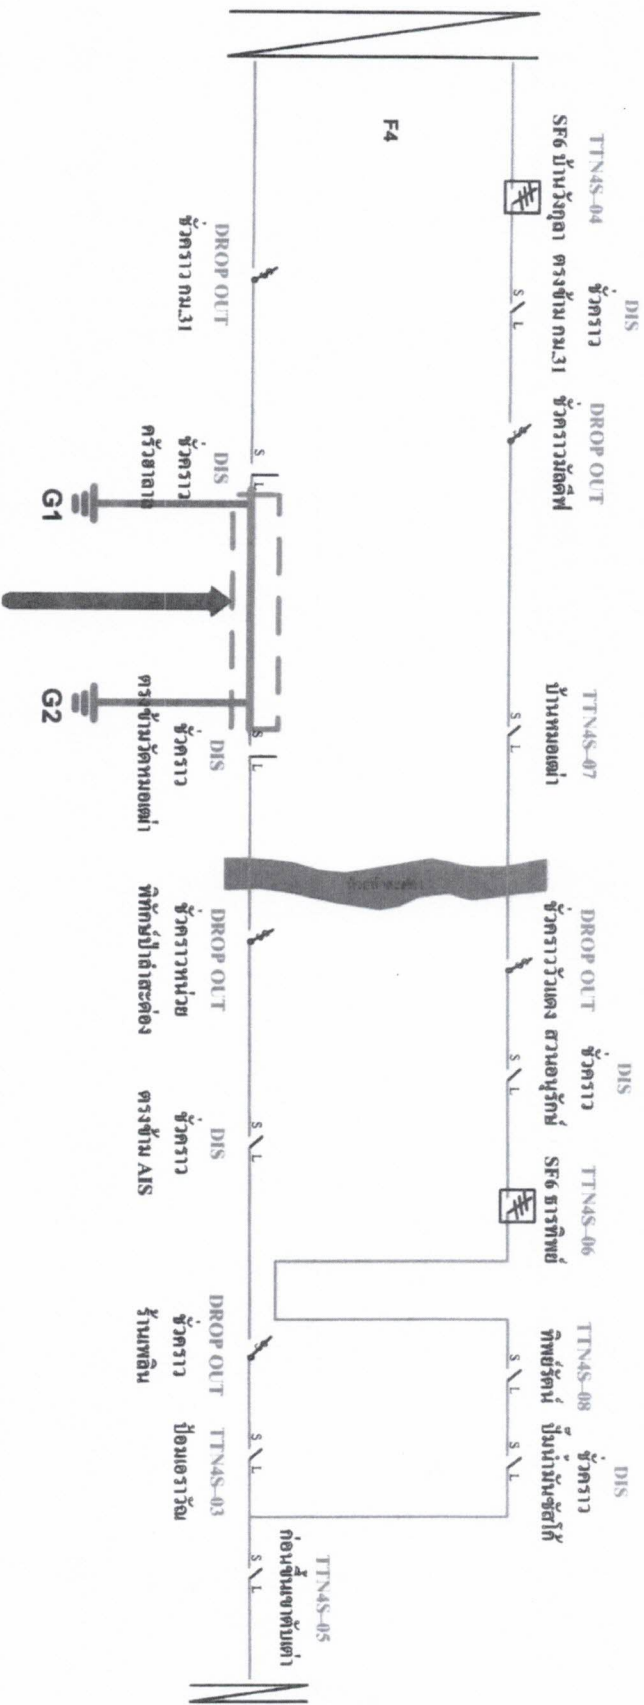

จุดดำเนินการติดตั้ง ไม่ควรระวางตำแหน่งแรงสูง บริเวณบ้านหมอเต่า โดยไม่มี ศพพ. ให้รับผลกระทบ

สถานะการจ่ายไฟฟ้าสู่ปฏิบัติงาน

