



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ) ๓๕๑ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัชรินทร์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง
จำนวนเอกสารแนบ ๑ แผ่น

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า สาขาบ่อพลอย ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน VT ของ SF๖ บ้านเสาหงษ์ รหัส BOP๐๑S-๐๒ บ้านเสาหงษ์ ม.๔ ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๑

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๑ ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑ สถานี บ่อพลอย ๑	๔ เม.ย.๖๘	๑๐.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	สับเปลี่ยน VT ของ SF๖ บ้าน เสาหงษ์ รหัส BOP๐๑S-๐๒	SF๖ บ้านเสา หงษ์ รหัส BOP๐๑S-๐๒	SF๖ บ้าน เสาหงษ์ รหัส BOP๐๑S- ๐๒	นายวิชณุ มีผล พชง.๗(ปพ.) โทร.๐๘๒- ๒๔๒๔๖๘๙

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณเรศ พูลพจน์ ตำแหน่ง พชง.๗ (สข) โทร.๐๘๔-๒๔๖๙๔๒๔

ผู้ประสานงานหน่วยงาน ชื่อ นายวิชณุ มีผล ตำแหน่ง พชง.๗(ปพ.) โทร.๐๘๒-๒๔๒๔๖๘๙

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

☒ ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

☐ ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยิตเส็ง)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บ่อพลอย

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPP1 จาก BPO15-02 ถึง -
ในวันที่ 4 เม.ย. ๖๘ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 599/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายอนุสรณ์ อนุพงษ์ ประสานงานขอดับไฟกับ นายวิฑูรย์ วัฒนา


(นายอนุสรณ์ อนุพงษ์)
๑๗ก.5 แทน ผคฟ.

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผคก. กฟส. บพค.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.psa.co.th

ขั้นตอนทำสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไปจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

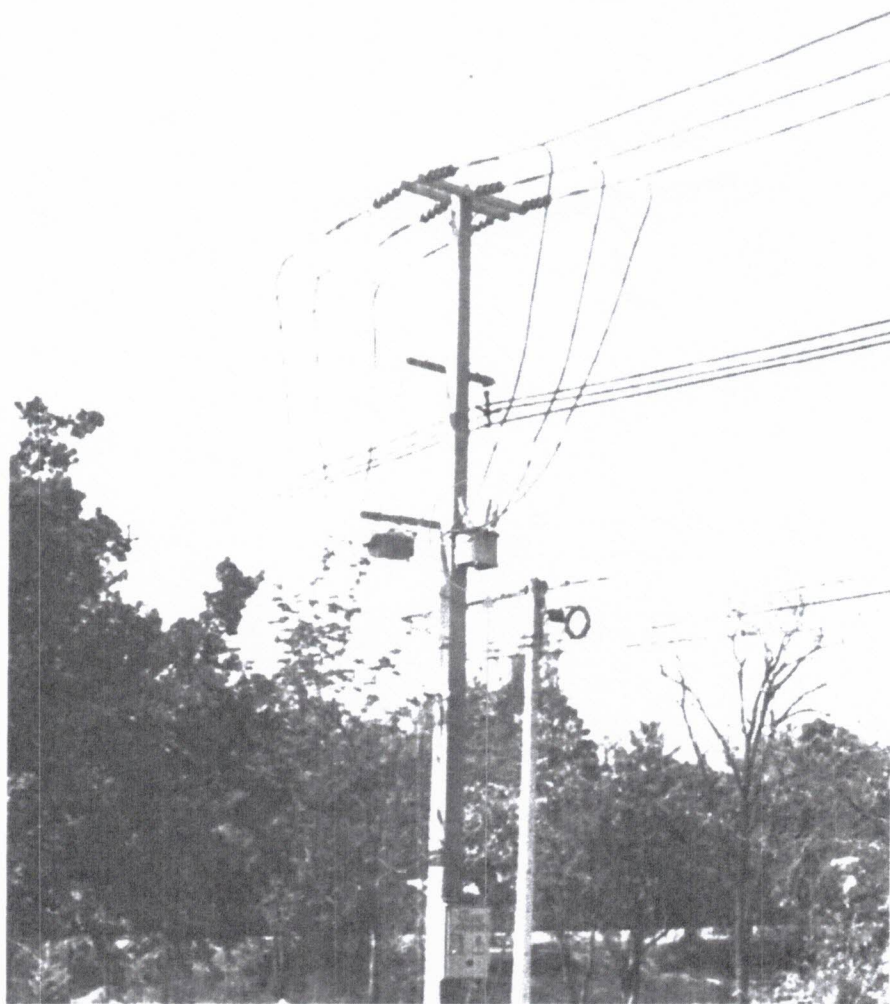

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|-----------------------|-----|-------|----------------------------|---------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | BOP01A-02 SF6 บ้านเสาหงษ์ | | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 4 เม.ย. 68 | ระหว่าง | 10.00 น. | ถึง | 12.00 | น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.บพล. | งานที่ทำ | เปลี่ยน VT.ประกอบ SF6 | | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 599/2568 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ | | | | | วันที่ | 3 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | | | | วันที่ | 3 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | | | วันที่ | 3 เมษายน 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายพิรภัทร,น.ส.สุภาฯ,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
2	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP			
3	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP			
4	BOP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP			
5	BOP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP			
6	- ย้ายโหลด BOP01 ไปจ่ายจาก BOP06							
7	BOP0BVB-01	ปลด	สับ		BOP		CB	22 kV.ขนานเมนบัส
8	BOP01S-03	ปลด	สับ		รถบพล.-		DIS	บ้านเขาดินสอ (บน-ล่าง)
9	BOP01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถบพล.-	SCADA	SF6	บ้านเสาหงษ์ (บน)
10	BOP0BVB-01	สับ	ปลด		BOP		CB	22 kV.ขนานเมนบัส
11	- ดับไฟทำงาน							
12	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมเข้า SF6 รหัส BOP01S-02 ออกทั้ง 2 ด้าน							
13	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมเข้า SF6 รหัส BOP01S-02 ออกทั้ง 2 ด้านเสร็จเรียบร้อย							
14	แจ้ง Hot Line 22 kV.Test ไฟดับ							
15	แจ้งกฟส.บ่อพลอยลงรายละเอียดใน Wesafe ก่อนแจ้งให้ Hot Line 22 kV.ปฏิบัติงาน							
16	แจ้ง Hot Line 22 kV.ปฏิบัติงานได้							
17	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP			
18	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP			
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
19	หลังจากHot Line 22 kV.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
20	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
21	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP			
22	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP			
23	- จ่ายไฟ							

[illegible]



จุดปฏิบัติงานสับเปลี่ยน VT ของ SF๖
บ้านเสาชงษ์ รหัส BOP๐๑S-๐๒
โดยชุดหอไลน์
