



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

8 เม.ย. 68

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๓๕๐/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นางกিজา อินทสวาสดี

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปلام้า ขอตัดไฟฟ้า (ถูกเงิน) MV-BAM๐๒S-๑๐ปบACSR-SAC แยกบ้านสูตร วงจร BAM๐๒
สถานีไฟฟ้าบางปلام้า ตามแผนผังส่งเขแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วันที่	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๐๒	๙ เม.ย. ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	MV-BAM๐๒S- ๑๐ปบ ACSR-SAC แยกบ้านสูตร	จุดจัม BAM02	BAM02S-25	นายวิระพงษ์ ละออเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายวิระพงษ์ ละออเอี่ยม...ตำแหน่ง...พชง.๕...โทร...๐-๙๗๒๑๒-๗๔๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ ๑๔.๔๑๑๗๑๘, ๑๐๐.๑๒๙๖๙๕

(นางกিজา อินทสวาสดี)

ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ BAM๒ จาก BAM๒S-๔S ถึง
ในวันที่ ๙ เม.ย. ๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 610/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ...ฟีดเดอร์...จาก...ถึง...

ในวันที่...ตั้งแต่วันที่...น. ถึง...น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย... ประสานงานการขอตัดไฟกับ... ๗ เม.ย. ๖๘

๗ เม.ย. ๖๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย... ..)

อก.๕ แทน ผอ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์...แผ่น

แผนผังแนบ...แผ่น

ผจก. (สถานี...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่...น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|---|----------|------------------|----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ แยกบ้านสูตร | | | |
| 2. กำหนดวันทำงาน | 9 เม.ย. 68 | เวลา | 09.00 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.บปม. | งานที่ทำ | เปลี่ยนสายแรงสูง | ตามใบขอปฏิบัติงาน 601/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม | | | วันที่ 7 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 7 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 7 เมษายน 2568 |
| 7. ส่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนอช | | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| | 3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร | | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
2	SPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		- -
3	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
4	ตรวจสอบ SF6 BAM2S-25 แยกบ้านสูตร ให้อยู่สถานะ OFF และ ล็อคคาน						
5	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
6	แจ้ง Hotline กระเช้า ปลดจุดจัมป์ไลน์ดิ่งข้ามถนนเข้า SF6 BAM2S-25 แยกบ้านสูตร ออกทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 ด้าน ได้						
7	หลังจาก Hotline กระเช้า ปลดจุดจัมป์ไลน์ดิ่งข้ามถนนเข้า SF6 BAM2S-25 แยกบ้านสูตร ออกทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 ด้านแล้วเสร็จ						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
9	ดำเนินการโดย Hotline ไม่มีข้อควรระวัง						
10	เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการทดสอบ เียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
11	SPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		- -
12	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	SPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		- -
16	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	แจ้ง Hotline กระเช้า เชื่อมจุดจัมป์ไลน์ดิ่งข้ามถนนเข้า SF6 BAM2S-25 แยกบ้านสูตร เข้าทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 ด้าน ได้						
19	หลังจาก Hotline กระเช้า เชื่อมจุดจัมป์ไลน์ดิ่งข้ามถนนเข้า SF6 BAM2S-25 แยกบ้านสูตร เข้าทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 ด้านแล้วเสร็จ						
20	SPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		- -
21	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
22	ให้ทำการปลดล็อคคาน SF6 BAM2S-25 แยกบ้านสูตร						
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอดับไฟฟ้า (ฉุกเฉิน) MV-BAM๐๒S-๑๐๒JACSR-SAC แยกบ้านสูตร วงจร BAM๐๒
ในวันที่ 9 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

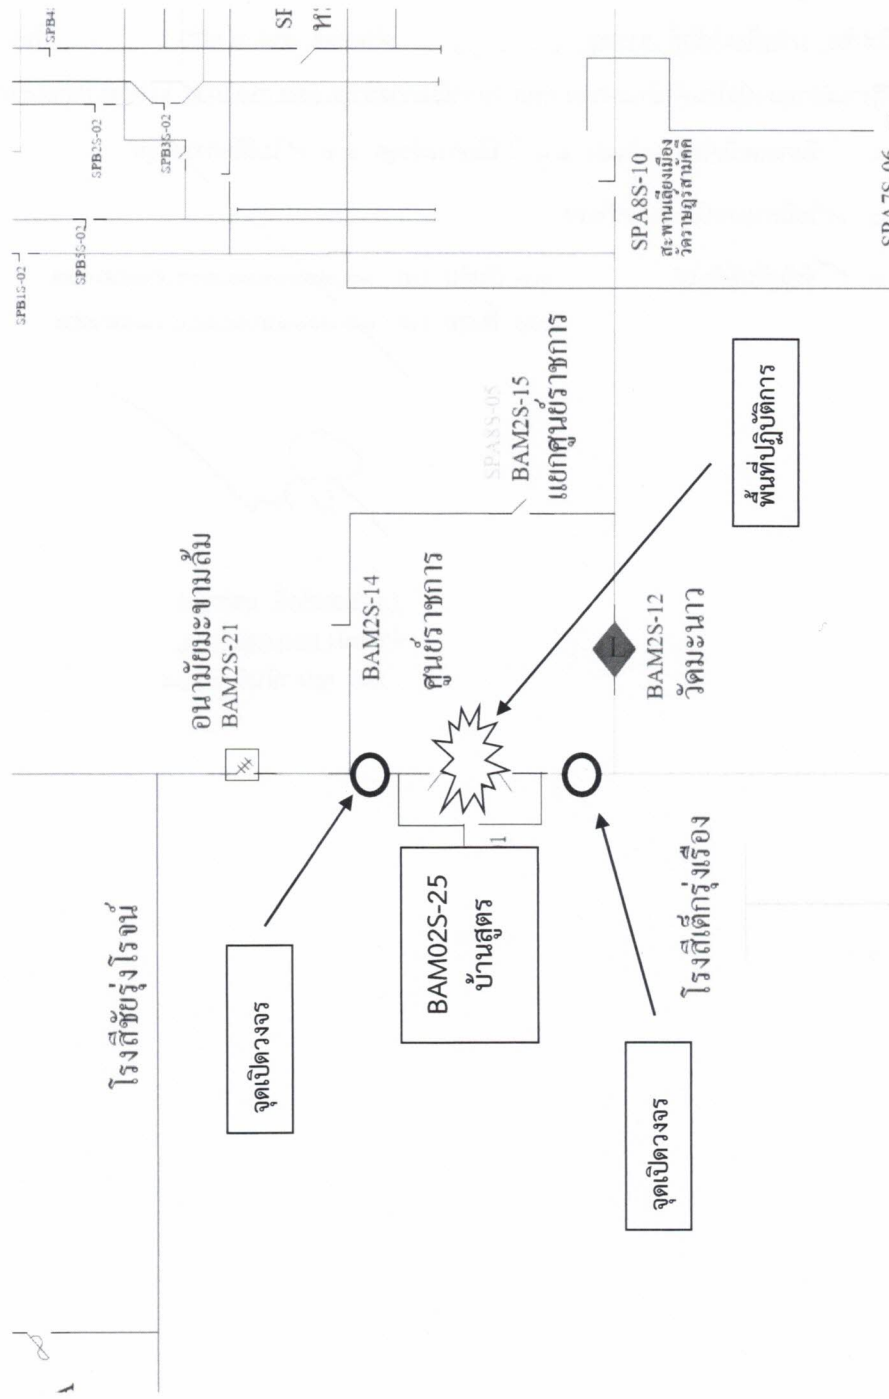

หมายเหตุ จุดเปิดวงจร ดำเนินการโดย HOTLINE
