



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๕๗๘ /๒๕๖๘ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พจิราสุวรรณชล ตำแหน่ง ออ.ปน.(กต)
ชื่อผู้ส่ง นายศาสวัต ครอบประภอนกิจ ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วย กฟส.นครชัยศรี ขอตัดไฟสถานีไฟฟ้านครชัยศรี.๒ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายใน บ.พฉ.น. (TUW) และเปลี่ยน CT/VTตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๓.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB08	12 เม.ย. 68	08.30	14.00	ปป ระบบจำหน่าย เปลี่ยน CT/VT /บ.พฉ.น. (TUW)	- NCB08S-05	-DE	พัฒนสุตา พงษ์เผ่า 085-3614203

บ.พฉ.น. ชุมชนหน้าซอย บ.พฉ.น. ชุมชนคลองบ้านกล้วย เรียบคลองชล ม.๓ ต.วัดละมุด ชุมชนสะพานเขียว ถึงจุดตัด Service Road พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุตา พงษ์เผ่า ตำแหน่งวศก.๕ ผ.บ.กฟส.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(กต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๓๔๖๓๒๔ Long ๑๐๐.๑๙๒๐๖๘๘

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๓๔๖๓๒๔ Long ๑๐๐.๑๙๒๐๖๘๘

(นายศาสวัต ครอบประภอนกิจ...)

ตำแหน่ง...ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน.....

ผจก.กฟส.นครชัยศรี

๘ เมษายน ๒๕๖๘

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCB 8 จาก NCBFS-05 ถึง ย. TUV
ในวันที่ 12 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 626/2568
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....
9 เม.ย. 68

(นาย จิรวัฒน์ ๒๖๖๖๖๖๖๖)
อก.๕ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)

เรียน ผจก. ๖๖๖.๕๕

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น


แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ TUW					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 เม.ย. 68		เวลา	08.30 น.	ถึง	14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นช.	งานที่ทำ	เปลี่ยน CT/VT		ตามใบขอปฏิบัติงาน 626/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม				วันที่	9 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	9 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	9 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นางสาวพิชชา,นางสาวสุกัษชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	NCB08S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS UG.มอเตอร์เวย์
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
6	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
7	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเตสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
8	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
9	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
10	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
11	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
12	แจ้งหน้างาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
14	NCB08S-05	ปลด	สับ		นช.		DIS UG.มอเตอร์เวย์
15	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... ป.ระบบจำหน่ายภายในและเปลี่ยน CT/VT
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... บ.พาฝัน (TUW)
 วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๑๒ เมษายน ๒๕๖๘ เริ่มเวลา..... ๐๘.๓๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๔.๐๐ น.
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี
 ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)
 ชื่อ..... นายศุภวัฒน์ คุชรประกอบกิจ ตำแหน่ง..... ขจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙-๙๕๕๔๔-๓๕๓๙ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เฒ่า
 ตำแหน่ง..... วศก.๕ ผบ.บ.กฟส.นครชัยศรี เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘-๕๓๖๑-๔๒๐๓ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เฒ่า วศก.๕ ผบ.บ.กฟส.นครชัยศรี (U-๖)

๒.ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑..... หน้า TUW ผู้รับผิดชอบ..... นช.๐๔
 จุดที่ ๒..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๓..... ผู้รับผิดชอบ.....
 จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....
 จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... พร้อมแผนผัง Switching

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
☒ ไม่มีข้อทักท้วง ☐ ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....
 วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อน
 วันระดมหรือไม่
☐ ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
☒ จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๘ เมษายน ๒๕๖๘ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑
 รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... ขจก.(ท) , ผบ.บ., ผมต. และ จป.

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่
☐ ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....
☒ ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๘ เมษายน ๒๕๖๘

C๓ Safety CAP ๐๑


หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

- เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน
 เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลง
 หมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้
 จ่ายไฟฟ้า

(นายชลิต สีขาวขำ)

ผ.บ.บ.กฟส.นครชัยศรี

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

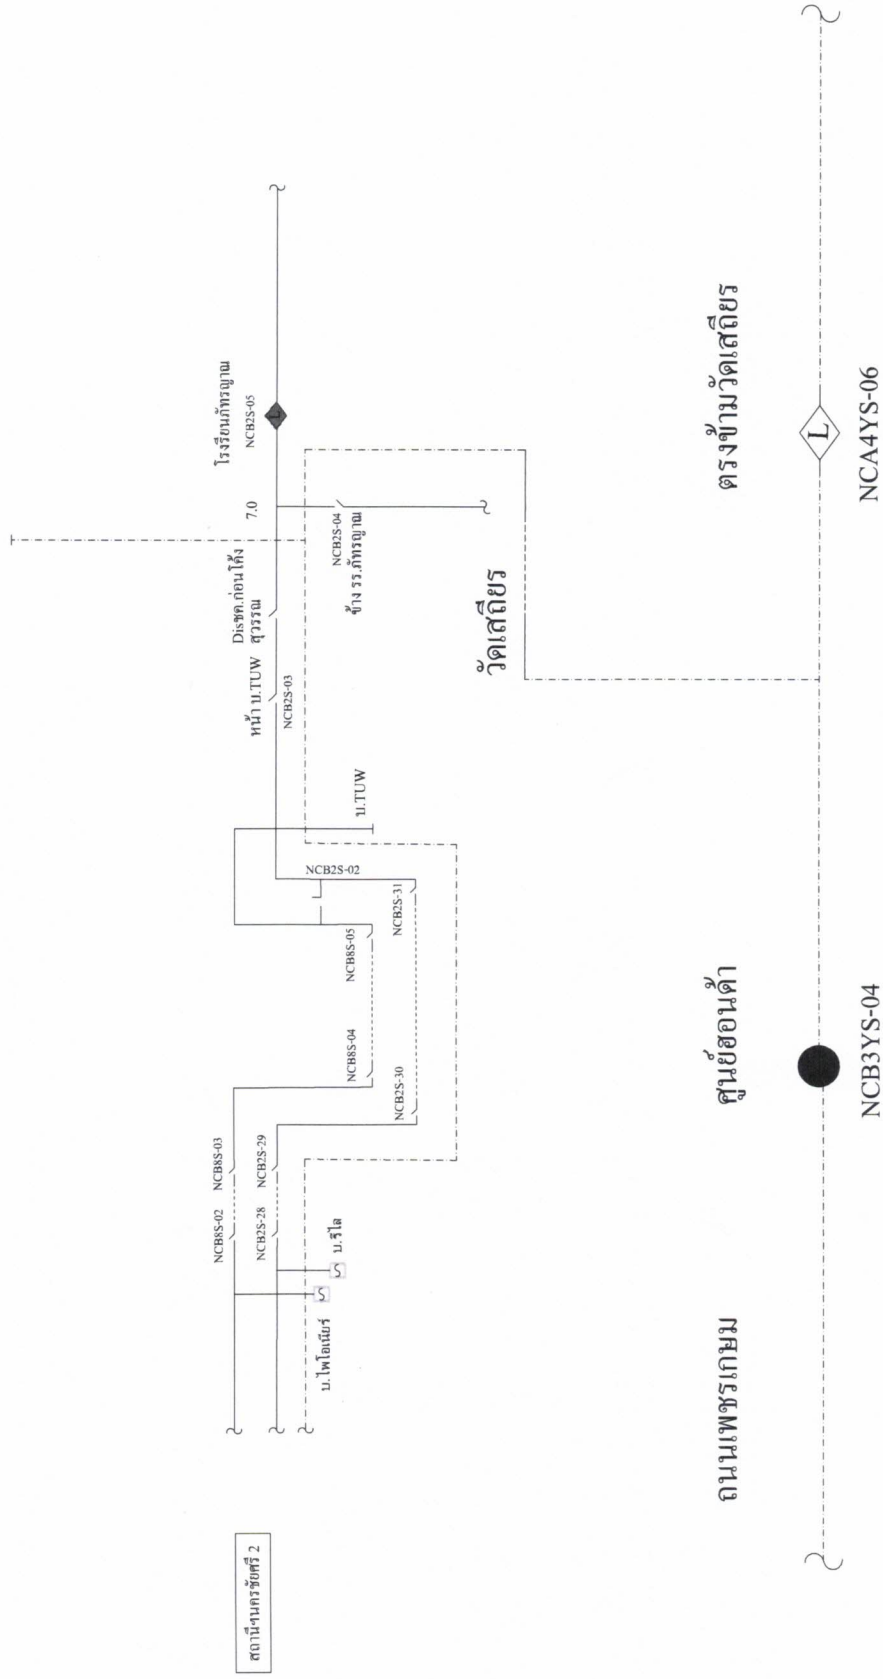

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

