



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

25 เม.ย. 68

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๔๓๔ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทณันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณตั้งแต่สถานีฯ สค.๓ ถึง สถานีฯ เอกชัย ๑

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ kV (SMCo๔Y)	4 พ.ค. 68	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณตั้งแต่ สถานีฯ สค.๓ ถึง สถานี ฯ เอกชัย ๑	สถานีฯ สค.๓	SMCo๓YS-๐๔ ไปรษณีย์	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖๓๘๓๒๐๔๐
๒	๑๑๕ kV (SMCo๔Y)	4 พ.ค. 68	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๓	สถานีฯ เอกชัย ๑	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟดับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พ.ช.๖ โทร ๐๘๖-๓๘๓๒๐๔๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก SMC04YB-01 ถึง EKA02YB-01, SMC03YS-04
ในวันที่ 4 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 646/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สหพงศ์ แก้วใหญ่ ประสานงานการขอดับไฟกับ พนักงานพื้นที่ นฤพร ออม


(นายสมศักดิ์ จิตวงศ์)
วค.๑ ๑๑ พ.ค. ๖๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สท.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. 1, 2 (สถานี SMC, EKA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

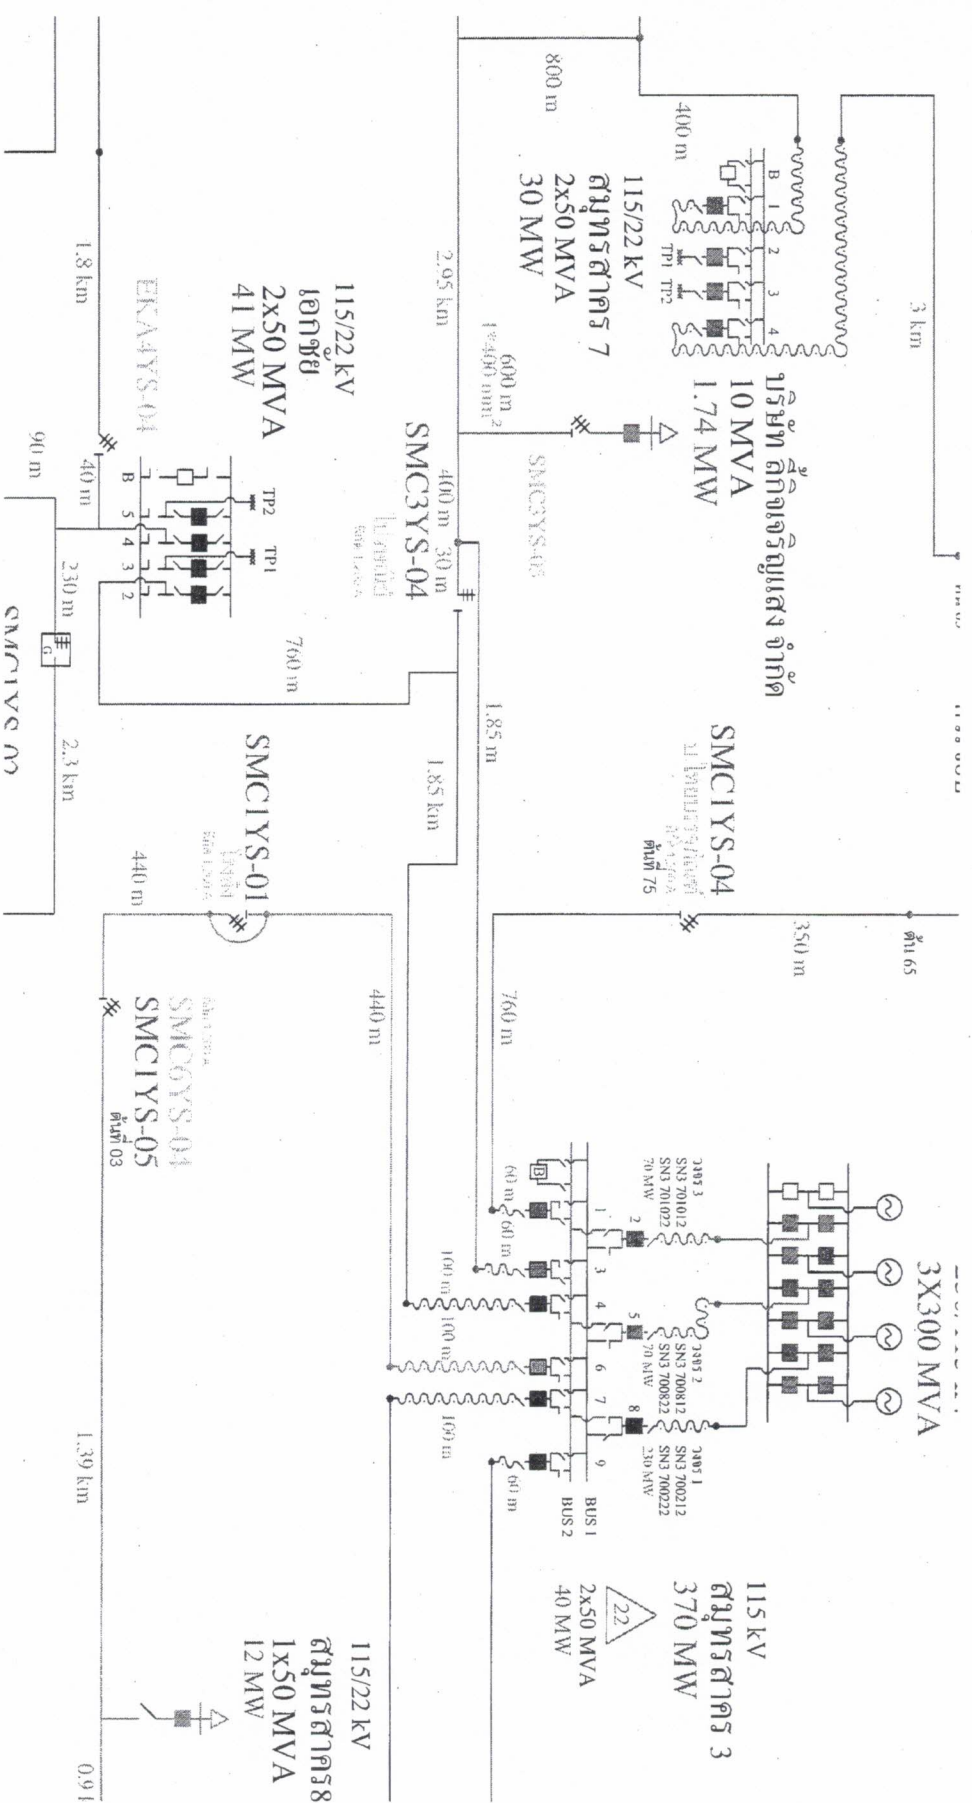

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำ Switching

- | | | | | |
|------------------------|---|----------|-----------------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ สมุทรสาคร 3 (SMC04YB-01,EKA02YB-01) | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 4 พ.ค. 68 | ระหว่าง | 8.30 น. | ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กรมทางหลวง | งานที่ทำ | กรมทางหลวงติดตั้งป้ายบอกทาง | ตามใบขอปฏิบัติงาน 646/2561 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนพล แสงเพ็ญอ่อน | | | วันที่ 21 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 21 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 21 เมษายน 2568 |
| 7. ส่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นายพีระภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต
2. นางสาวสุภัชชา,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นา
3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒน,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สังเกตการณ์	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบ Close Loop 115 kV. SMC-EKA สถานะ Close Loop อยู่						
3	SMC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	EKA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SMC04YB-01	สับ	ปลด		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMC04YS-02	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
7	SMC04YS-03	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
8	EKA02YB-01	สับ	ปลด		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	EKA02YS-01	สับ	ปลด		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
10	EKA02YS-02	สับ	ปลด		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ศ. รับทราบ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
12	แจ้งกรมทางหลวงปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
13	เมื่อกรมทางหลวงปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ Close Loop						
14	EKA02YS-01	ปลด	สับ		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
15	EKA02YS-02	ปลด	สับ		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
16	EKA02YB-01	ปลด	สับ <i>กข Manual</i>		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SMC04YS-02	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
18	SMC04YS-03	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
19	SMC04YB-01	ปลด	สับ <i>กข Manual</i>		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SMC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	EKA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน



พบทั้งแขวงทางหลวงติดต่อ
ไปยังเอกทางไกลสายสง 115

