



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

25 เม.ย. 68

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๔๓๒ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัฒน์ น.พริมาสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต.)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟแก้ไขจุดร้อน บริเวณภายในสถานี สค.๑๐ ชั่วคราว
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMV๐๑	๒๗ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ขอตัดไฟแก้ไขจุดร้อน บริเวณภายในสถานี สค.๑๐ ชั่วคราว	SMV๐๑YS-๐๑	SMV๐๑BR-๐๑	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	SMV๐๒	๒๗ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.		SMV๐๑YS-๐๑	SMV๐๒BR-๐๑	
๓	SMV๐๓	๒๗ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.		SMV๐๑YS-๐๑	SMV๐๓BR-๐๑	
๔	SMV๐๔	๒๗ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.		SMV๐๑YS-๐๑	SMV๐๔BR-๐๑	
๕	SMV๐๕	๒๗ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.		SMV๐๑YS-๐๑	SMV๐๕BR-๐๑	
๖	SMV๐๖	๒๗ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.		SMV๐๑YS-๐๑	SMV๐๖BR-๐๑	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พช.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.


สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMV จาก SMVMS-01 ถึง SMV BR-01.
ในวันที่ 27 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 662/68
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMV จาก SMVMS-01 ถึง SMV BR-02
ในวันที่ 27 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SMV จาก SMVMS-01 ถึง SMV BR-03
ในวันที่ 27 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ SMV จาก SMVMS-01 ถึง SMV BR-04
ในวันที่ 27 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5, 6 ฟีดเดอร์ SMV จาก SMVMS-01 ถึง SMV BR-05, 06
ในวันที่ 27 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชนทอง ฝาจิน ประธานงานการขอดับไฟกับ นายสิริวัฒน์ บุณพร้อม


(นายชนทอง ฝาจิน) ส.อ.ค.ค.ค.ค.
๑๓.๕ ๑๓.๖ ๑๓.๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๑๑, ๑๒, ๑๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SMV)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

- [illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
21	SMA15VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMA			
22	SMV0BR-06	สับ	ปลด		SMV			
23	- ย้ายโหลด SMV02 ไปจ่ายจาก SMJ02							
24	SMJ02S-04	ปลด	สับ		รถทบท-	SCADA	SF6	ปากซอย กม.12
25	SMV0BR-02	สับ	ปลด		SMV			
26	- ย้ายโหลด SMV01 ไปจ่ายจาก SMJ07							
27	SMJ07S-04	ปลด	สับ		รถทบท-	SCADA	SF6	ปากซอย กม.12
28	SMV0BR-01	สับ	ปลด		SMV			
29	- ย้ายโหลด SMV03 ไปจ่ายจาก SMJ06							
30	SMV03S-04	ปลด	สับ		รถสด-		SF6	หน้าธนาคารกสิกรไทยหมู่บ้านฟ้าใส
31	SMV0BR-03	สับ	ปลด		SMV			
32	- ตรวจสอบ SMV BR-04 อยู่ตำแหน่ง OPEN							
33	- ดับไฟสถานี SMV พร้อมจ่ายไฟเลี้ยงหม้อแปลง Station Sevice							
34	SMV01YB-01	สับ	ปลด		SMV			เบรกเกอร์ 115 KV.IN SMV
35	SMV01YS-01	สับ	ปลด		SMV		ABS	115 KV.SMV
36	SMV01S-01/1	สับ	ปลด		รถสด-		DIS	ก่อนเข้าหม้อแปลง Station Service
37	สวิตบายพาส	ปลด	สับ		รถสด-		DIS	สวิตบายพาสของ SMV0BR-01
38	- ปลดใบมีดดัน SOURCE,LOAD ของรีโคลสเซอร์ SMV BR-01,02,03,04,05,06 ออก							
39	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA			
40	ONE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE			
41	SMJ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ			
42	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ			
43	SMJ02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ			
44	SMJ06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ			
45	SMJ07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ			
46	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.			
47	SMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA			
48	SMA11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA			
49	SMA15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA			
50	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ศค. รับทราบ							
51	เมื่อ กฟส.ศค. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
52	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
53	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
54	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		
55	ONE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		
56	SMJ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		
57	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		
58	SMJ02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		
59	SMJ06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		
60	SMJ07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		
61	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
62	SMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		
63	SMA11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		
64	SMA15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		
65	- สับใบมีดด้าน SOURCE,LOAD ของรีโคลสเซอร์ SMV BR-01,02,03,04,05,06 เข้า						
66	ปลดโหลดหม้อแปลง Station Service ของสถานีฯSMV ออก				SMV		
67	สวิตบายพาส	สับ	ปลด		รตสด-		DIS สวิตบายพาสของ SMV0BR-01
68	SMV01S-01/1	ปลด	สับ		รตสด-		DIS ก่อนเข้าหม้อแปลง Station Service
69	- จ่ายไฟ 115 KV						
70	SMV01YS-01	ปลด	สับ		SMV		ABS 115 KV.SMV
71	SMV01YB-01	ปลด	สับ		SMV		เบรกเกอร์ 115 KV.IN SMV
72	ปรับแรงดัน SMV-TP1 ไว้ 22.5 KV.				SMV		
73	- ย้ายโหลด SMV05 กลับคืนจาก SMA11						
74	SMV0BR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		
75	SMA11VB-01	สับ	ปลด		SMA		
76	- ย้ายโหลด SMV06 กลับคืนจาก SMA15						
77	SMV0BR-06	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		
78	SMA15VB-01	สับ	ปลด		SMA		
79	- ย้ายโหลด SMV04 กลับคืนจาก SMA04						
80	SMV0BR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		
81	SMA04VB-01	สับ	ปลด		SMA		

Measurements

Bx1 Max 83.1 °C

Parameters

Emissivity 0.95
 Refl. temp. 24 °C
 Distance 12 m
 Atmospheric temp. 24 °C
 Ext. optics temp. 20 °C
 Ext. optics trans. 1
 Relative humidity 55 %


Geolocation

Location N 13° 36' 44.29", E 100° 17' 17.70"
<http://maps.google.com/?z=17&ll=13.5123,100.2882>


Note

SMV04BR-01 termination kit

11/3/2025 14:10:10

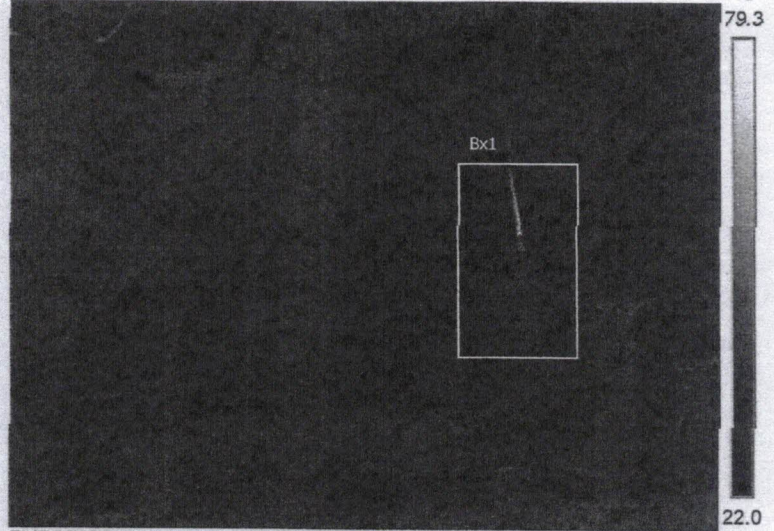

11/3/2025 14:10:10

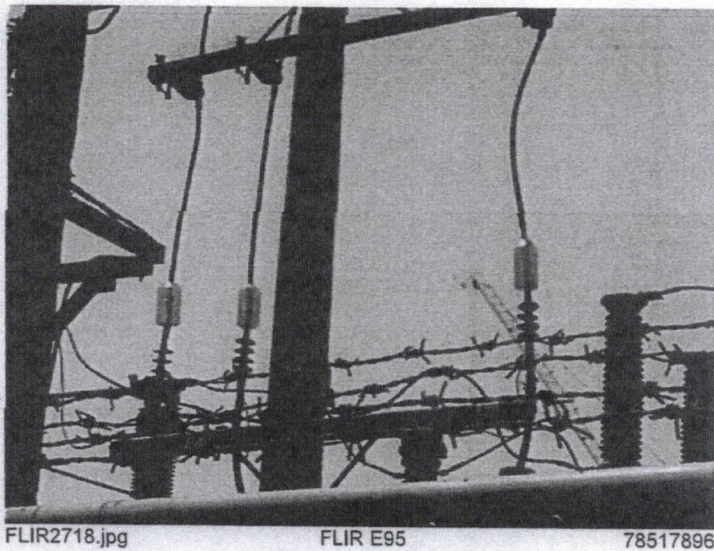

Text annotations

Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลาเพล C

แก้ไขทันที

Measurements

Bx1 Max 103.6 °C

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %


Geolocation

Location N 13° 38' 44.09", E 100° 17' 17.65"
<http://maps.google.com/?z=17&ll=13.6122,100.2882>


Note

SMV04BR-01 ด้านเข้ารีดสเซอร์

11/3/2025 14:08:42

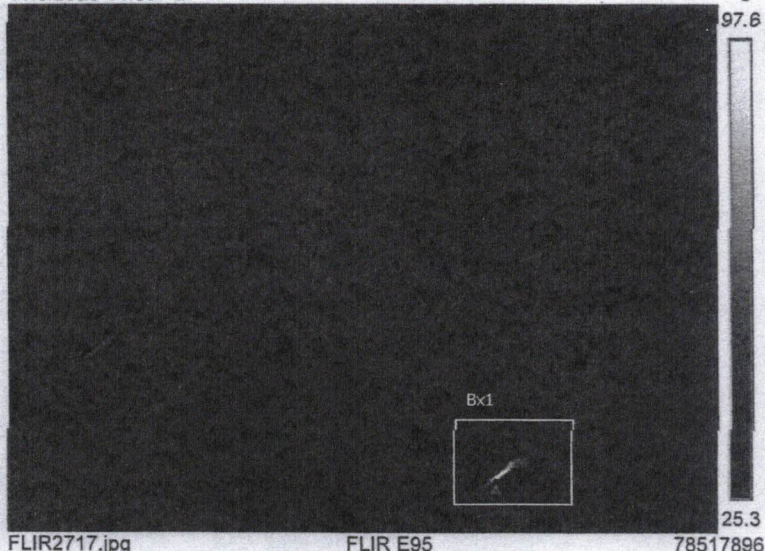

11/3/2025 14:08:42

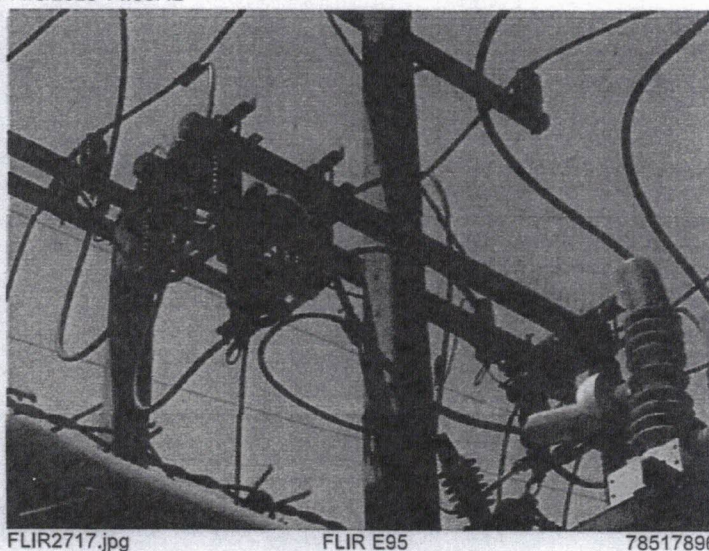

Text annotations

Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลาเพล C ด้าน fixed แก๊สไนโตรเจน

Measurements

Bx1	Max	83.8 °C
Bx2	Max	70.3 °C

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %


Geolocation

Location	N 13° 36' 44.05", E 100° 17' 17.71"
	http://maps.google.com/?z=17&ie=k&q=13.6122,100.2883


Note

SMV04BR-01 ด้านออกกรีโคสเซอร์

11/3/2025 14:08:24

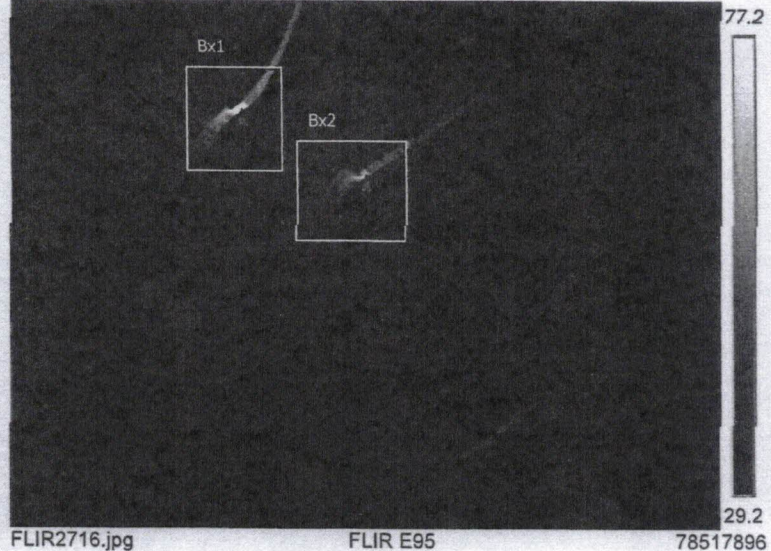

11/3/2025 14:08:24

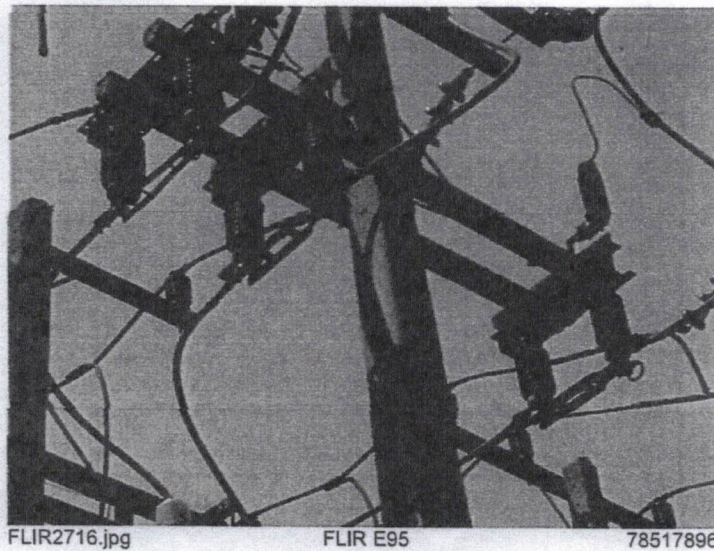

Text annotations

Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลาเฟส A ด้าน fixed	แก้ไขทันที
Bx2 : หน้าสัมผัสทางปลาเฟส B ด้าน fixed	แก้ไขด่วน
