



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

14 พ.ค.68

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๔๗๙ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๒๑ มี.ย. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ให้ชุดฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี เปลี่ยนลูกถ้วย ๑๑๕ เควี บริเวณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

ตามแผนผังส่งเชิงแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๑๗ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ให้ชุดฮอท ไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี เปลี่ยนลูกถ้วย ๑๑๕ เค วี บริเวณ สนามกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร	สถานีฯ สค.๔	BALo๓YS-๑๒ ตรงข้าม หจก.กัณฑ์	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พ.ช.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 15kv จาก SMOZY6-01 ถึง 8AL3YS-12
ในวันที่ 17 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 684/68
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... อดิธ..... ประสานงานการขอดับไฟกับ..... นายโพธิ์..... บก.มรอม.....
9 ม.ค. 68

(.....
.....
.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... 1แผ่น
แผนผังแนบ..... 2แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี..... SMP.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร | | |
| 2. กำหนดวันทำงาน | 17 พ.ค. 68 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สค. | งานที่ทำ | เปลี่ยนลูกถ้วย 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 684/68 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว | | วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 |
| 7. สิ่งทำสวิตชิงโดย | 1. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพิรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		
3	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		
4	KTE02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
5	ตรวจสอบ 115 เควี SME02YB-03 , SME03YB-03 , SME04YB-01 จ่ายไฟแบบ Close Loop ปกติ						
6	SMD02YB-01	ล๊ับ	ปลด		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMD02YS-02	ล๊ับ	ปลด		SMD		ใบมิด 115 เควี
8	SMD02YS-03	ล๊ับ	ปลด		SMD		ใบมิด 115 เควี
9	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
10	BAL03YS-12	ล๊ับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		สด.		ABS ตรงข้าม หจก. กุยหลี
11	แจ้งพื้นที่ไต่ดับให้หน่วยงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟดับให้เรียบร้อย และลงรายละเอียดข้อมูลใน We Safe						
13	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
14	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		
15	KTE02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
16	เมื่อนำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
17	BAL03YB-01	"ON " Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL		
18	KTE02YB-01	"O N " Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE		
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
20	BAL03YS-12	ปลด, ล็อกกุญแจ	ล๊ับ		สด.		ABS ตรงข้าม หจก. กุยหลี
21	Close Loop 115 เควี						
22	SMD02YS-02	ปลด	ล๊ับ		SMD		ใบมิด 115 เควี
23	SMD02YS-03	ปลด	ล๊ับ		SMD		ใบมิด 115 เควี
24	SMD02YB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Auto Reclose		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SMD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		
26	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		
27	KTE02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

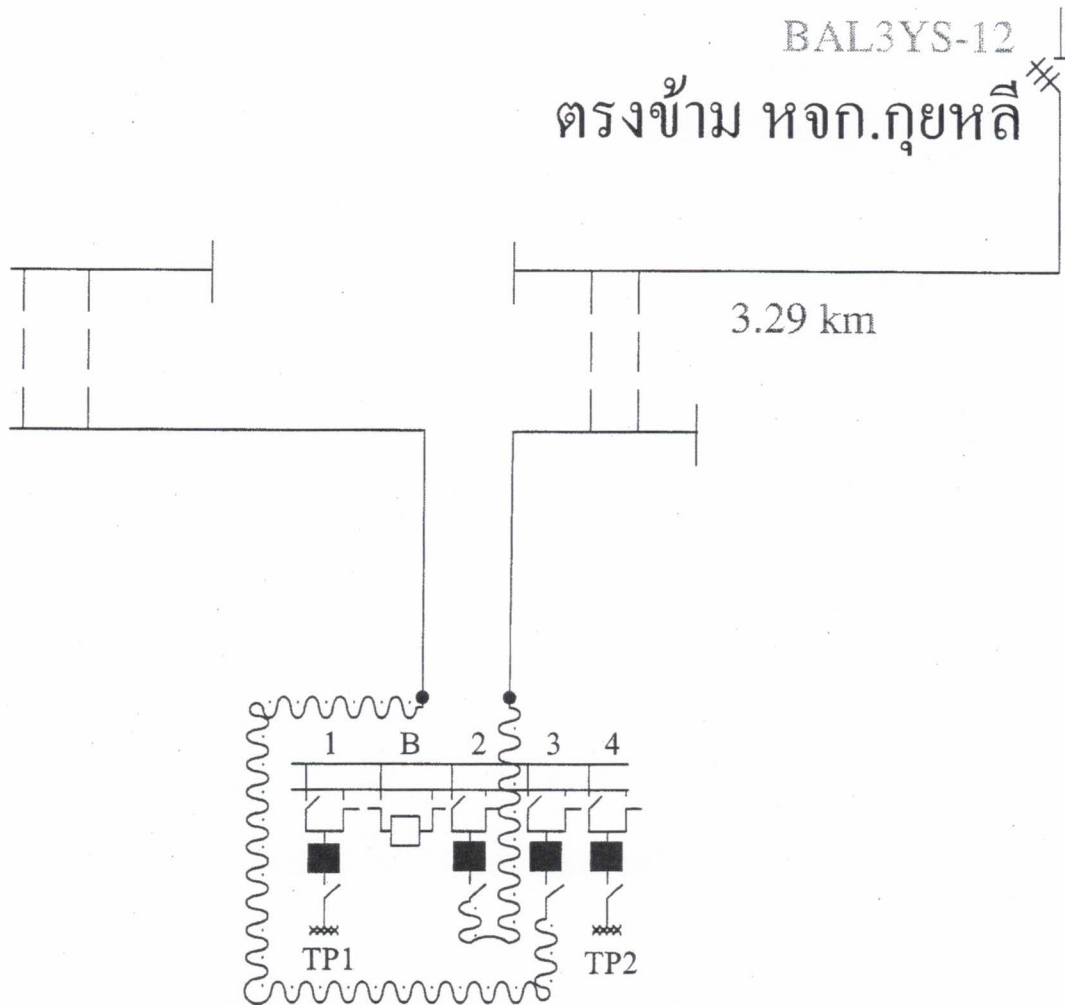

115/22 kV

สมุทราศกร 4

2x50 MVA

38 MW

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

