



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

24 เม.ย. 68

เลขที่ ก.๓.สนย.(กป.)- ๒๔๐ ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ โรจนธรรมเจริญ

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ลาดหญ้า

ด้วย.....กฟส.ลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....ตัดไฟฉุกเฉินตัดต้นไม้คร่อมระบบจำหน่ายแรงสูง.....ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....๑๗.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SVA๐๑	๒๕ เม.ย. ๖๘	๑๐.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟฉุกเฉินเพื่อสับเปลี่ยน Disconnecting Switches ๒๒ KV ชำรด/รีโคลสเซอร์ SVA๑R-๐๑ เขตตัดเต้า	SVA๑S-๐๑ เขตตัดเต้า	SVA๑R-๐๑ เขตตัดเต้า	นายสุรเกียรติ เวสสุวรรณ ๐๘๙-๘๙๑๙๔๔๘

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายสุรเกียรติ เวสสุวรรณ.....ตำแหน่ง.....พช.๔ เบอร์โทร.....๐๘๙-๘๙๑๙๔๔๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสันติ โรจนธรรมเจริญ.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ลาดหญ้า.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์ SVA1 จาก SVA1S-๐1 ถึง SVA1R-๐1
ในวันที่ 25 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 691/2568
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์ ราชวรวิมล ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ.สุรเกียรติ ทรัพย์ธรรม.

(นายสันติ โรจนธรรมเจริญ.....)
๒๐๖.5 ๒๓-๔ เม.ย. ๖๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.ลาดหญ้า, กฟส. ทร.น.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง.....2.....แผ่น
แผนผังแนบ.....3.....แผ่น
ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตช์

- | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|--|--------|----------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | รีโกลเซอร์ SVA1R-01 เซาต์เต่า | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 25 เม.ย. 68 | ระหว่าง | 10.00 น. | ถึง | 25 เม.ย. 68 | 16.00น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ลญ. | งานที่ทำ | เปลี่ยน Sw.Load,ลูกถ้วย Bypass SVA1R-01 เซาต์เต่า ตามใบขอปฏิบัติงาน 691/2568 | | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม | | | วันที่ | 23 เมษายน 2568 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 23 เมษายน 2568 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 23 เมษายน 2568 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ
3. นายนครินทร์,นายพิรภัทร์,นายขุนทอง,นายพนิต | | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	งานที่ทำ 1.เปลี่ยน Sw. ด้าน Load SVA1R-01 เขาดับเต้า 2.เปลี่ยนลูกถ้วย Bypass SVA1R-01 เขาดับเต้า							
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง							
3	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
4	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
5	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.		R	-
6	นำ รีโคลเซอร์ SVA1R-01 เขาดับเต้า เข้าระบบ							
7	ตรวจสอบใบมีดด้าน Source,Load ของ รีโคลเซอร์ SVA1R-01 เขาดับเต้า อยู่สถานะ ลับ							
8	SVA01R-01	ปลด	ลั บ คง Nonreclosing,ALT,GND		ทรน.		R	เขาดับเต้า
9	Sw.Bypass	ลั บ	ปลด		ทรน.		R	เขาดับเต้า
10	ย้ายโหลด SVA01 บางส่วนไปจ่ายจาก TTN04							
11	SVA01S-03	ปลด	ลั บ		ทรน.		SF6	เขาดับเต้า(Loop Line SVA-TTN)
12	SVA01R-01	ลั บ	ปลด		ทรน.		R	เขาดับเต้า
13	Sw.Source (SVA1R-01)	ลั บ	ปลด		ทรน.		R	เขาดับเต้า
14	Sw.Load (SVA1R-01)	ลั บ	ปลด		ทรน.		R	เขาดับเต้า
15	เมื่อพร้อมดับไฟ							
16	SVA01S-01	ลั บ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.		DIS	ก่อน R.บ้านเขาดับเต้า
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ							
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
20	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
21	*คกง Non-reclosing,ALT TTNBR-04 ไว้ขณะทำงาน*							
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้							
23	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
24	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
25	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
26	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
27	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
28	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
29	SVA01S-01	ปลด	ลั บ		ทรน.		DIS	ก่อน R.บ้านเขาดับเต้า
30	ย้ายโหลด SVA01 บางส่วนไปจ่ายจาก TTN04							



[illegible]

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

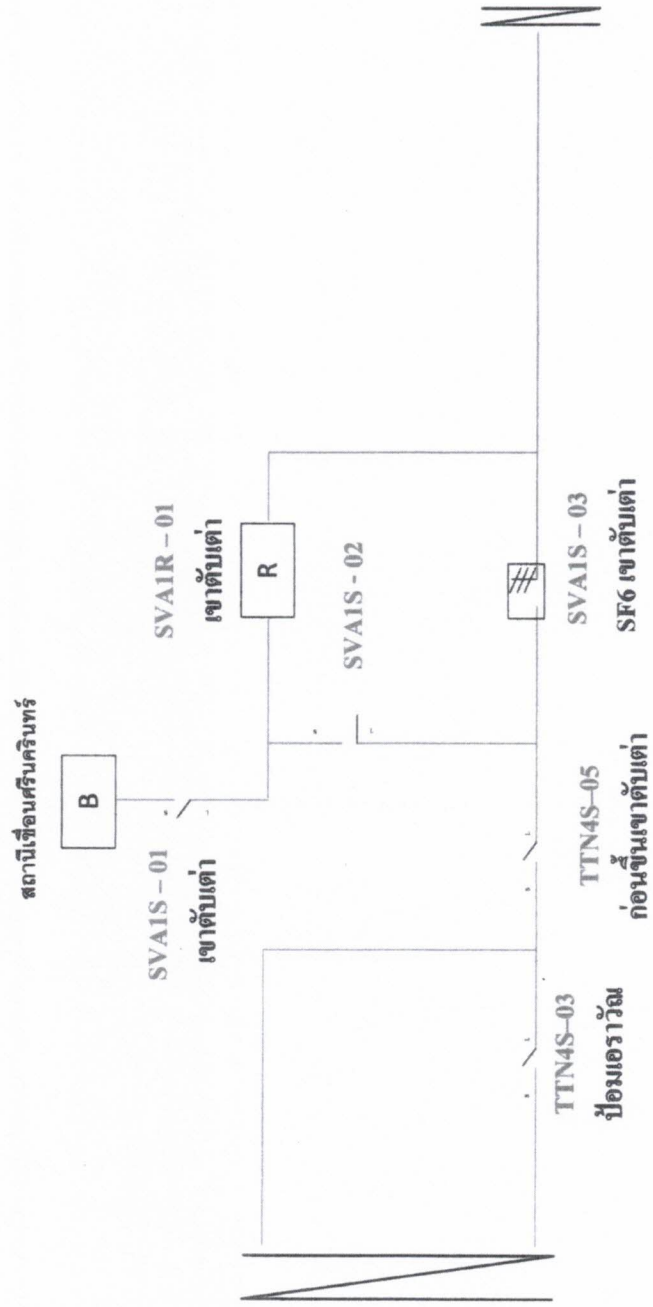

จุดแบ่งแดน ลาดหญ้า - ท่ากระดาน

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

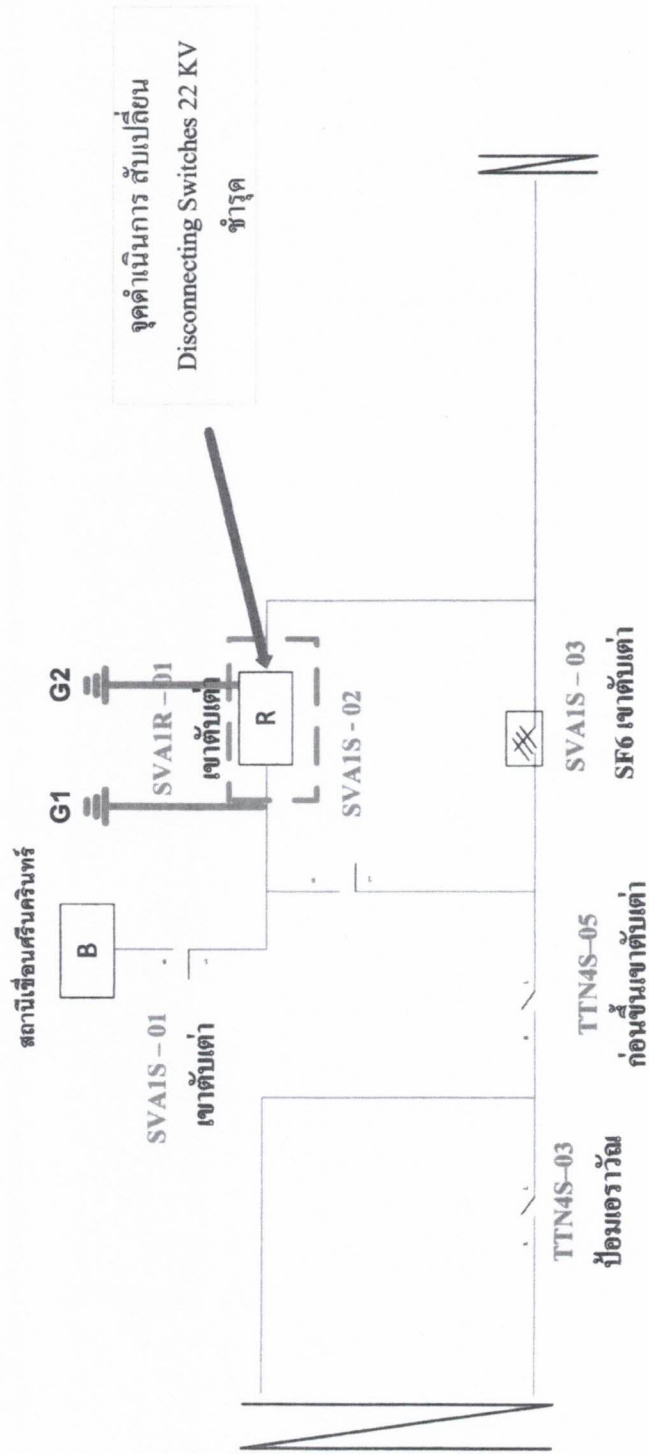

จุดแบ่งแดน ชาติพญา - ทำกระดาน

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

