



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

26 เม.ย. 68

เลขที่ ก.ต.สค.(นน) ๒๕๕๓ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิทนนท์ พิชราสุวรรณพล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง ออ.นบ.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีท่าทราย ๑ เพื่อให้ ผู้รับจ้างยก Sheet pile
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๒๗ เม.ย. ๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบจำหน่าย ๑๑๕ เควี บริเวณฝั่งตรง ข้ามสถานีท่าทราย ๑ เพื่อให้ ผู้รับจ้างยก Sheet pile	สถานีฯ สค.๒	SMB๐๑YS-๐๑ พุลทรัพย์แคน	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	๑๑๕ KV	๒๗ เม.ย. ๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๒	SMB๐๑YS-๐๓ บ.ลัคกี้	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พช.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 ฟีดเดอร์ 1/5พ. จาก SM2-7012 ถึง SM8145-03 SM8145-01
ในวันที่ 27 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 692/2568
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อุบลรัตน์ อรรถพรภักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอิทธิพล วัฒนชัย


(นายอิทธิพล อรรถพรภักดิ์)
27.5 เม.ย. 68

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SM2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายอุบลรัตน์ อรรถพรภักดิ์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายอุบลรัตน์ อรรถพรภักดิ์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 3

ใบสั่งทำ Switching


1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115 kV.ไลน์ SN2-7012 - SMB01YS-03 ABS.บ.ลัคี้					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 เม.ย. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.	งานที่ทำ	ให้ผู้รับเหมายก Sheet Pile		ตามใบขอปฏิบัติงาน	692/2568
4. เตรียมการ Switching โดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	26 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบ Switching โดย				วันที่	26 เมษายน 2568	
6. อนุมัติ Switching โดย				วันที่	26 เมษายน 2568	
7. สั่งทำ Switching โดย	1. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, วรรณพงษ์, มโนช 2. นครินทร์, พีรภัทร, ชุนทอง, พนิต 3. สุภัชชา, พิทยา, ญัฐกาญจน์, ศักดิ์สิทธิ์, สามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
4	SN2-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		
5	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
6	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		
7	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		
8	SMZ03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		
9	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		
10	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
11	- ย้ายโหลด SMZ03 ไปรับไฟจาก KTE02						
12	KTE02S-12	ปลด	ล๊ับ		สค.	SF6	แยกวัดเกาะ (บน)
13	SMZ03VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMZ	CB	SMZ03
14	- ย้ายโหลด SMZ01,02,04,05 ไปรับไฟจาก SMB05						
15	SMB05S-02	ปลด	ล๊ับ		สค.	SCADA	SF6 ทายชอยข้างสฟ. สค.2
16	SMZ01BVB-01	ล๊ับ	ปลด		SMZ	CB	Inc.01
17	- ดับไฟสถานีฯ สมุทรสาคร 16 (SMZ)						
18	SMZ01YB-01	ล๊ับ	ปลด		SMZ	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ THU และบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต ไปรับไฟจาก จากสถานีฯ SME						
20	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟระบบ 115 เควี Loop สถานีฯ SME03YB-03-SME04YB-03 Close Loop อยู่ปกติ						
21	BAL02YB-01	ล๊ับ	ปลด		BAL	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ตรวจสอบ LBS 115 เควี ปากทางสวนสม รหัส SME03YS-08 ไม่ LOW GAS						
23	SME03YS-08	ล๊ับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		สค.	SCADA	LBS ปากทางสวนสม
24	SMB01YS-02	ปลด	ล๊ับ, ล็อคกุญแจ		สค.	ABS	หลังนิคมฯ
25	BAL02YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		BAL	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SN2-7012	ล๊ับ	ปลด		EGAT	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SN2-7017	สับ	ปลด		EGAT		DIS	ใบมีด 115 เควี
28	จ่ายไฟระบบ 115 เควี Close Loop สถานี SME03YB-03-SME04YB-03 Close Loop ตามปกติ							
29	ตรวจสอบ LBS 115 เควี ปากทางสวนสม รหัส SME03YS-08 ไม่ LOW GAS							
30	SME03YS-08	ปลด	สับ,ล๊อคกุญแจ		สค.	SCADA	LBS	ปากทางสวนสม
31	- จ่ายไฟสถานี สมุทรสาคร 16 (SMZ)							
32	SMZ01YB-01	ปลด	สับ		SMZ		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
33	ควบคุมปรับแรงดันหม้อแปลง SMZ-TP1 โวล 22.7 kV							
34	- ย้ายโหลด SMZ01,02,04,05 กลับจาก SMB05							
35	SMZ01BVB-01	ปลด	สับ		SMZ		CB	Inc.01
36	SMB05S-03	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	ท่ายชอยข้างสฟ. สค.2
37	- ดับไฟสายส่ง 115 kV.เวลา 09.00 น.							
38	ตรวจสอบ LBS 115 เควี พูลทรัพย์สินแคน รหัส SME01YS-01 สถานะ <u>ปลด,ล๊อคกุญแจ</u>							
39	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
40	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียดใน We Safe เรียบร้อย							
41	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
42	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
43	SMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
44	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME			
45	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL			
46	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ			
47	SMZ01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ			
48	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ			
49	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
50	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
51	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียดใน We Safe เรียบร้อย							
52	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching							
53	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
54	SMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB			
55	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME			
56	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL			
57	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ			
58	SMZ01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ			
59	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ			
60	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE			
61	- จ่ายไฟสายส่ง 115 kV.							
62	SMB01YS-03	ปลด	สับ,ล๊อคกุญแจ		สค.		ABS	บ.ล็คกี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
63	- ย้ายโหลด SMZ01,02,04,05 ไปรับไฟจาก SMB05							
64	SMB05S-02	ปลด	ล๊ับ		สค.	SCADA	SF6	ท่ายชอยข้างสฟ. สค.2
65	SMZ01BVB-01	ล๊ับ	ปลด		SMZ		CB	Inc.01
66	- ดับไฟสถานีฯ สมุทรสาคร 16 (SMZ)							
67	SMZ01YB-01	ล๊ับ	ปลด		SMZ		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
68	- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ THU และบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต กลับจากสถานีฯ SME							
69	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟระบบ 115 เควี Loop สถานีฯ SME03YB-03-SME04YB-03 Close Loop อยู่ปกติ							
70	ตรวจสอบ LBS 115 เควี ปากทางสวนสม รหัส SME03YS-08 ไม่ LOW GAS							
71	SME03YS-08	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		สค.	SCADA	LBS	ปากทางสวนสม
72	SN2-7017	ปลด	ล๊ับ		EGAT		DIS	ใบมีด 115 เควี
73	SN2-7012	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		EGAT		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
74	BAL02YB-01	ล๊ับ	ปลด		BAL		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
75	SMB01YS-02	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		สค.		ABS	หลังนิคมฯ
76	BAL02YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		BAL		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
77	จ่ายไฟระบบ 115 เควี Close Loop สถานีฯ SME03YB-03-SME04YB-03 Close Loop ตามปกติ							
78	ตรวจสอบ LBS 115 เควี ปากทางสวนสม รหัส SME03YS-08 ไม่ LOW GAS							
79	SME03YS-08	ปลด	ล๊ับ,ล๊อคกุญแจ		สค.	SCADA	LBS	ปากทางสวนสม
80	- จ่ายไฟสถานีฯ สมุทรสาคร 16 (SMZ)							
81	SMZ01YB-01	ปลด	ล๊ับ		SMZ		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
82	ควบคุมปรับแรงดันหม้อแปลง SMZ-TP1 โวล 22.7 kV							
83	- ย้ายโหลด SMZ01,02,04,05 กลับจาก SMB05							
84	SMZ01BVB-01	ปลด	ล๊ับ		SMZ		CB	Inc.01
85	SMB05S-03	ล๊ับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	ท่ายชอยข้างสฟ. สค.2
86	- ย้ายโหลด SMZ03 กลับจาก KTE02							
87	SMZ03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SMZ		CB	SMZ03
88	KTE02S-12	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6	แยกวัดเกาะ (บน)
89	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
90	SMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
91	SN2-7012	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT			
92	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME			
93	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL			
94	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ			
95	SMZ03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ			
96	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ			
97	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
	%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%							

2x50 MVA
41 MW

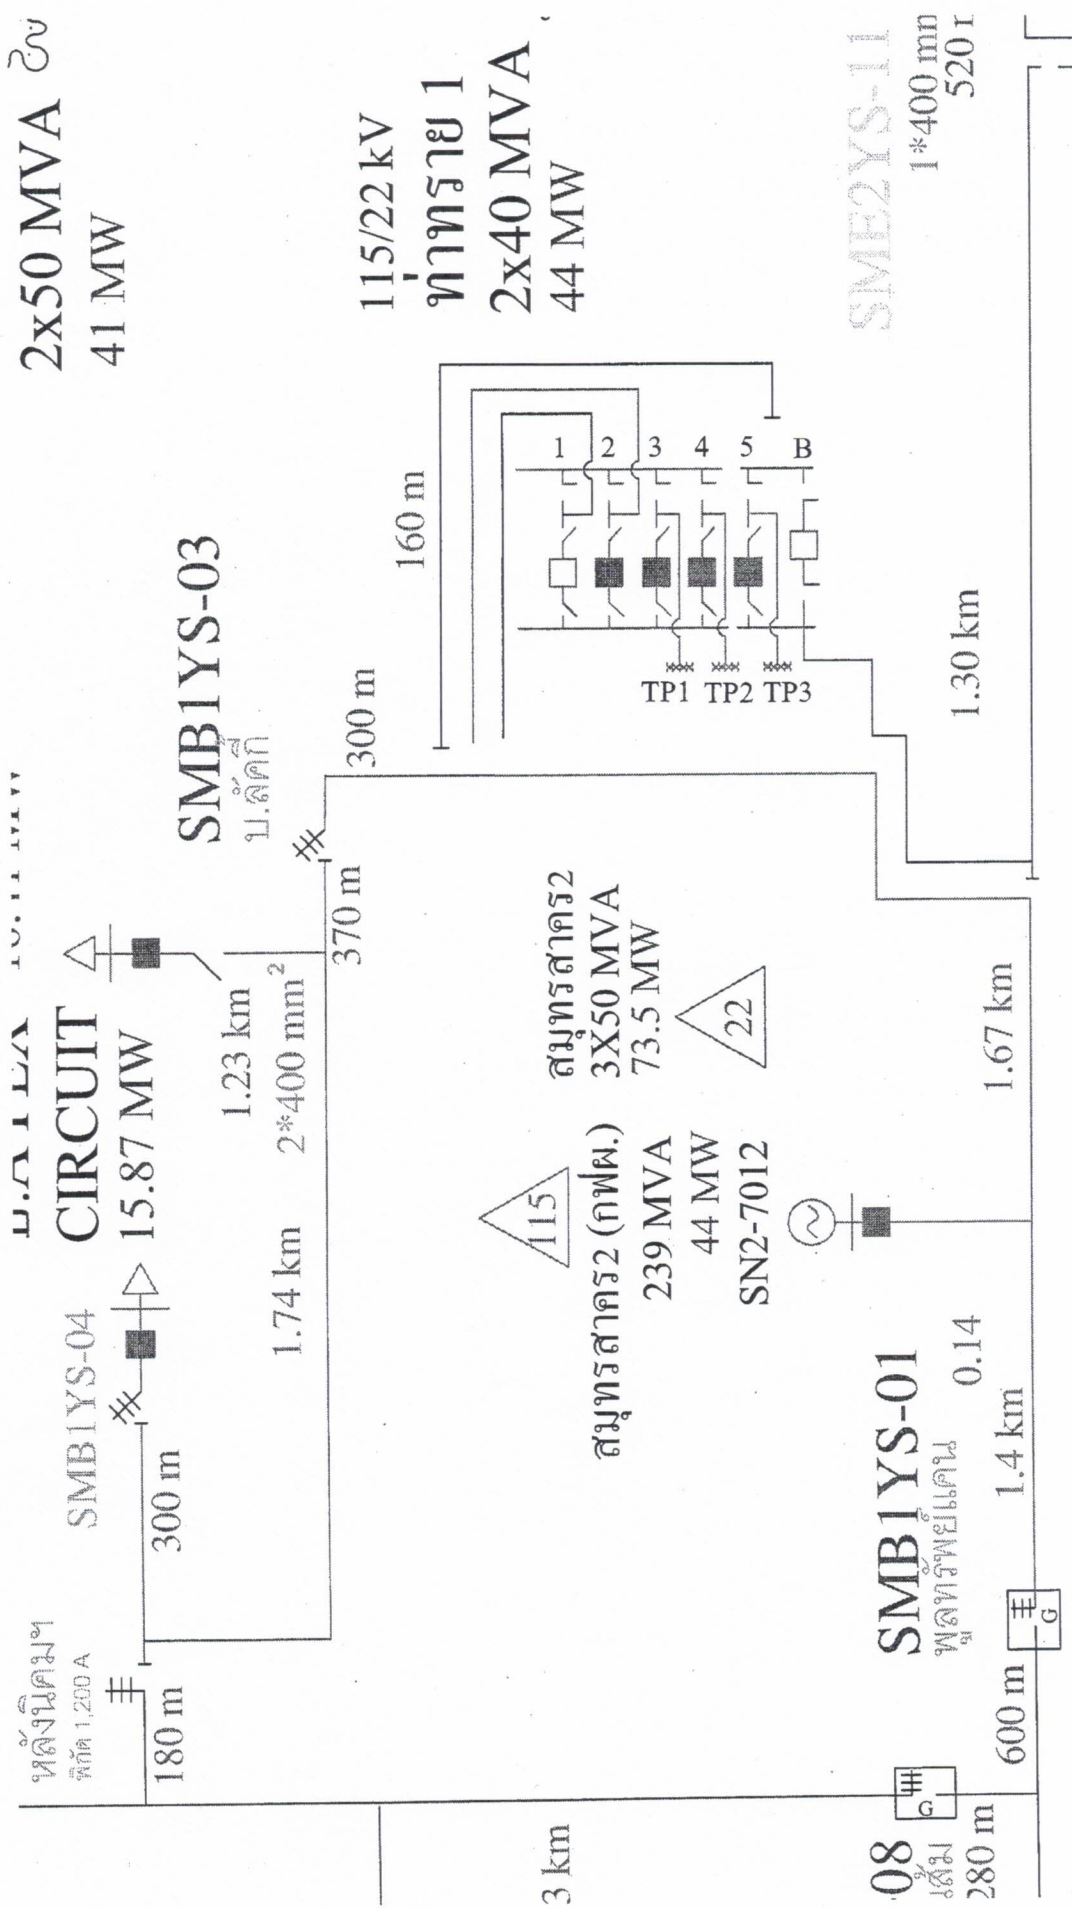

LINDBL
 2x50 MVA
 41 MW

