

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปป.) ๖๗๕ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื่อ ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รษ.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า...อ.พุทธมณฑล...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า สามพราน
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SAC02	28 เม.ย. 68	08.30	16.30	ชุดงานก่อสร้างและงานซ่อมย่อย ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อ รองรับการติดตั้งไฟส่องสว่างของกรม ทางหลวง	- SAC02S-06 วงเวียนหอม เกร็ด	- SAC02S-03 บ.เอเซีย พลาตติก	นายศรีสนธิ แก้วสมบัติ ๐๘๗-๑๔๑๖๘๘
2.	SAC07	28 เม.ย. 68	08.30	16.30		- SAC07S-04 ก่อนยูเทิน หอมเกร็ด	- SF6 PMB01S-04 ร้านแก้วฟ้า ตุ๊กตา	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...แนวถนนบรมราชชนนี - ปิ่นเกล้า (ขาเข้า) ตั้งแต่ แยกยูเทินหอมเกร็ด ถึง ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจางวัน นิตสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๒-๔๖๕๓๔๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๗๘๓๓๒ Long ๑๐๐.๒๔๖๐๒

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๗๘๕๘๔ Long ๑๐๐.๒๗๒๒๐

(นายมานิช แนนเนื่อ)
 ผจก.(ระดับ ๑๑) รษ.ผจก.(ระดับ ๑๐)
 กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พัดเตอร์ SAC02 จาก SAC02S-06 ถึง SAC02S-03 ม.101 ชั้นอาคาร
ในวันที่ 28 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 693/2568
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. พัดเตอร์ SAC01 จาก SAC01S-04 ถึง 9P6 PMB01S-04
ในวันที่ 28 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 314 และ 315
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สามารถ จันทนะศักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย อ. พงษ์วัฒน์ นิลสุวรรณ

.....
(นางสาวรุจิรา วรรณวิภา)
๐๙ ก. ๕ 11 น. พคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. พล.ร. พงษ์ นพ. พล.ร. นพ. พล.ร. นพ.

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	แนวนอนบรรณราชชนนี - แยกยูเทินหอมเกล็ด (SAC02,07)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	693/68		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่	25 เมษายน 2568		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 เมษายน 2568		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 เมษายน 2568		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย							
		1. นายจิรวัดน์, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
		2. นส.สุภัชชา, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
		3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
2	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		LOAD 1.09 MW
3	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		LOAD 4.25 MW
4	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
5	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
6	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		LOAD 1.94 MW
7	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		LOAD 6.17 MW
8	ย้ายโหลด SAC07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก PMB10						
9	PMB10S-16	ปลด	ล๊ับ		พทท.	SCADA	SF6
10	ย้ายโหลด SAC02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก PMB06 และ ย้ายโหลด SAC07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก PMB01						
11	SAC02S-04	ปลด	ล๊ับ		สพร.	SCADA	SF6
12	SAC02S-06	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS
13	SAC07S-02	ล๊ับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6
14	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
15	SAC07S-04	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS
16	SAC02S-03	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS
17	แจ้ง กฟส.พทท. ตรวจสอบ SF6 PMB01S-04 (แก้ฟัดักดา) อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม "ล๊อคคาน"						
18	แจ้ง กฟส.พทท. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
19	แจ้ง กฟส.พทท. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
20	แจ้ง กฟส.พทท. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G3						
21	แจ้ง กฟส.พทท. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G4						
22	แจ้ง กฟส.พทท. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G5						
23	แจ้ง กฟส.พทท. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G6						
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ						
25	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
26	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
27	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
28	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-

[illegible]


แผนผังก่อนดับไฟ บริเวณ วงเวียนหอมมกริด ถึง ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา

วัน จันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น.

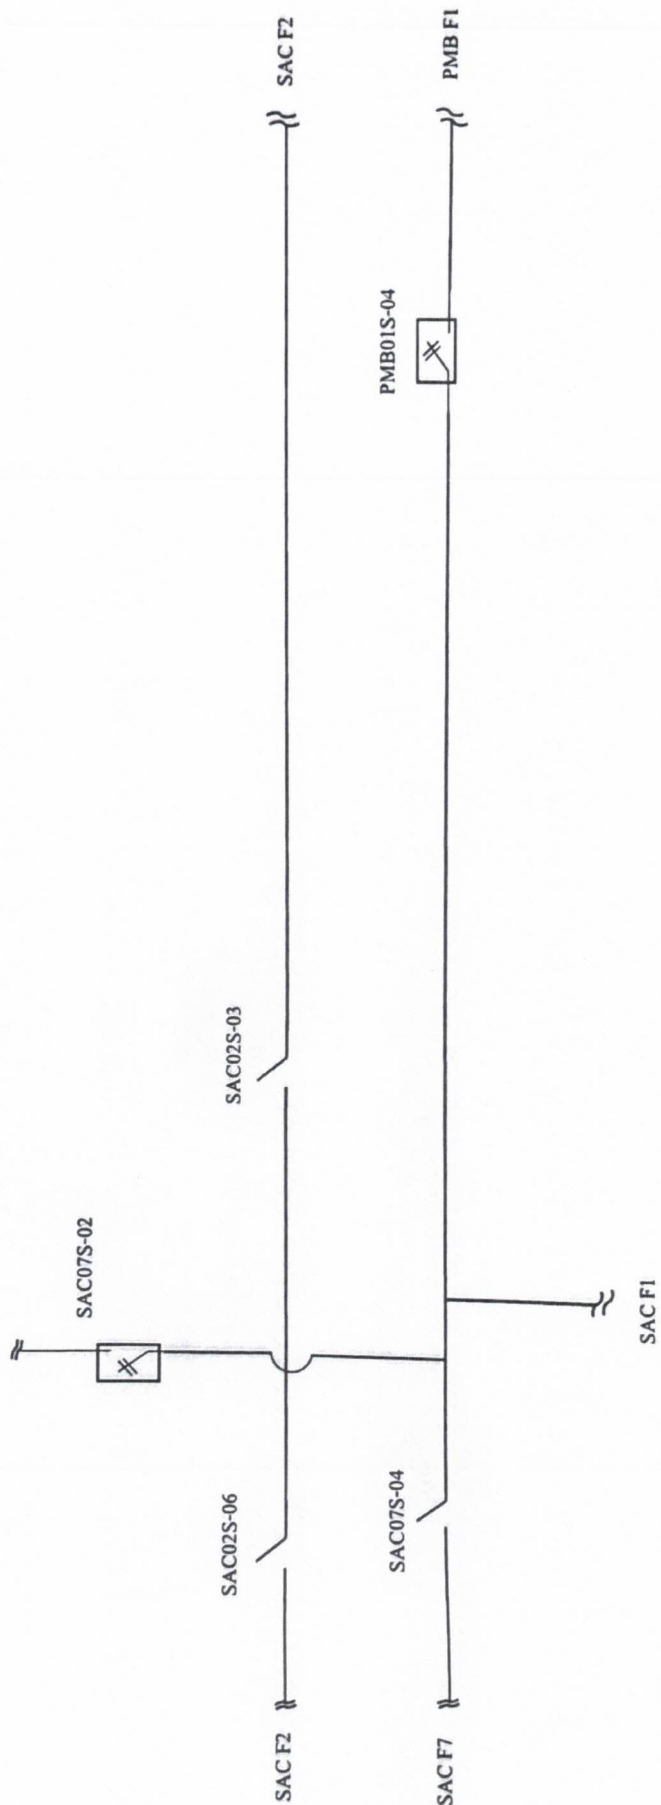

แผนผังหลังดับไฟ บริเวณ วงเวียนหอมเกร็ด ถึง ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น.

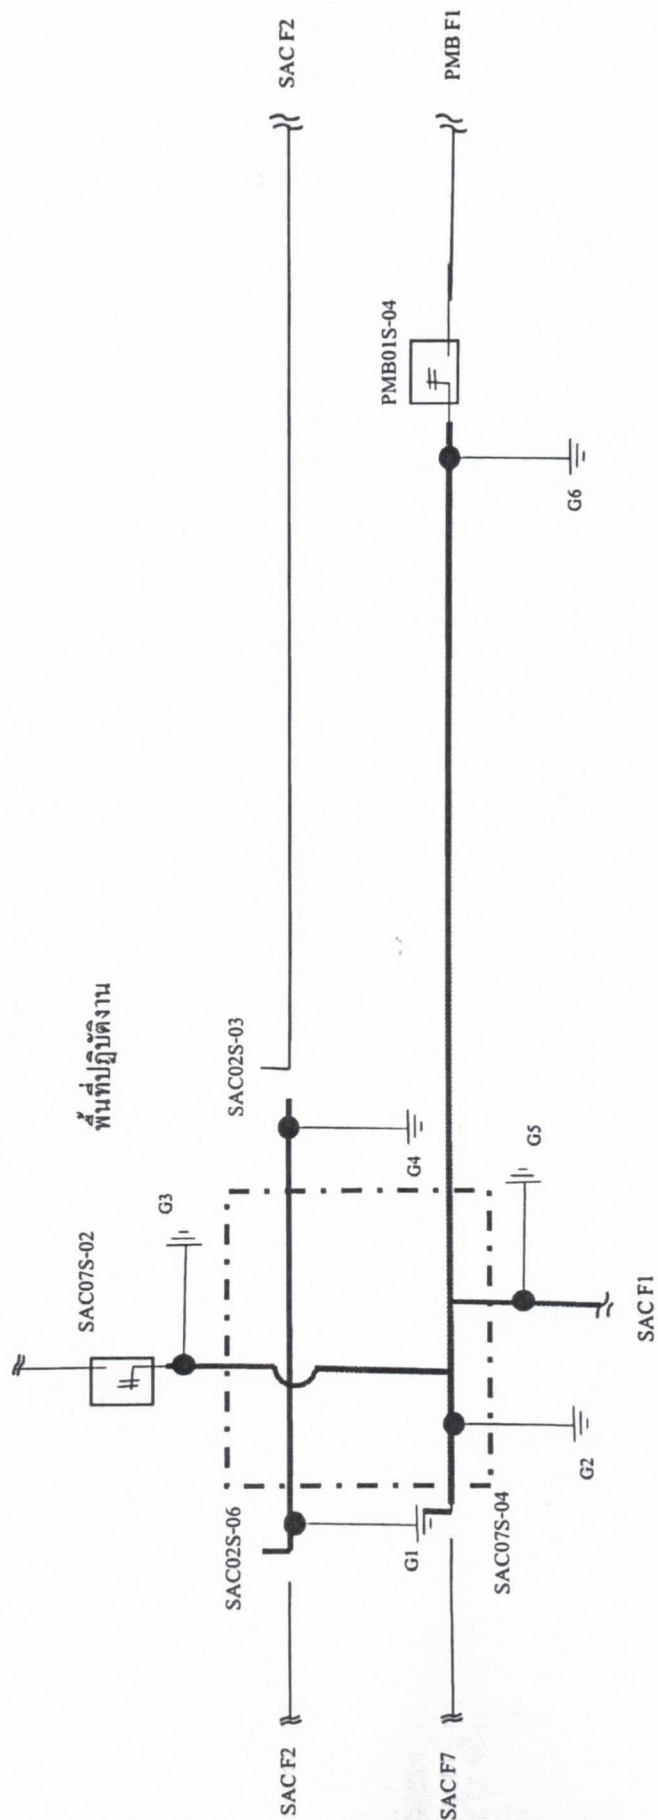

ด่วนที่สุด

ที่ สส.๗/๒๕๖๓/๒๕๖๔



กฟส.พุทธสมถล

เลขที่รับ 2174

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี
(ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม ๒๑ มี.ย. 2568
๔๔/๗ หมู่ ๕ ถ.บรมราชชนนี ต.หอมเกร็ด ๐๙:๐๖ น.
อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รื้อย้ายสายไฟฟ้ากีดขวางงานติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูงแบบแขนยื่น (Overhang Sign)

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธสมถล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพสายไฟฟ้าที่กีดขวางงานติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูงแบบแขนยื่น (Overhang Sign)
บนทางขนาน ทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ กม.๒๓+๔๗๕ ด้านขวาทาง

อ้างถึงสัญญาที่ สส.๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้าง บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง ๒๕๖๖ จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาทำการ ๙๙๐ วัน ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒๕๔ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗, ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒๑ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑๑๑ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗, ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๗ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ และได้รับการอนุมัติให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔๒๕ วัน รวมระยะเวลาทำการ ๑,๘๐๘ วัน ค่างานก่อสร้าง ๓๖๓,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

ด้วย โครงการฯ ได้รับแจ้งจากทางผู้รับจ้าง พบว่ามีสายไฟฟ้า กีดขวางงานติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูงแบบแขนยื่น (Overhang Sign) บริเวณทางขนาน บนทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ กม.๒๓+๔๗๕ (กม.๒๖+๗๐๐ เดิม) ด้านขวาทาง (ขาเข้ากรุงเทพฯ) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ จำเป็นต้องรื้อย้ายสายไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ในการนี้ โครงการฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธสมถล ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสายไฟฟ้าซึ่งกีดขวางงานติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูงแบบแขนยื่น (Overhang Sign) และเร่งดำเนินการรื้อย้ายสายไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวให้กับโครงการฯ โดยด่วนที่สุด ทั้งนี้โครงการฯ มอบหมายให้ นายนิธินัย เกษรมาลา ตำแหน่งวิศวกร บจก.ธงชัยเจริญก่อสร้าง ๒๕๖๖ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๐๙๔๒๗ และนายสุรศักดิ์ หัสตินรัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ กรมทางหลวง โทรศัพท์ ๐๙๒-๗๖๘๘๖๑๕ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์กับโครงการฯ ด้วย จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนศักดิ์ ออบเชย)

ชค.สส. สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน)

จ.นครปฐม ๑ แห่ง

๐๗๖๖๖
