



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๘.....

ชื่อผู้รับ นายพัฒน์ พิชราสุวรรณชล.....

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดช.....

Switching Deadline

27/04/68

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.น.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟส.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อก่อสร้างประตูเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPA06	๒๘/๐๔/๖๘	๑๓.๐๐	-	ดับไฟเพื่อก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิม พระเกียรติ	Disชั่วคราว ร.ร.กาญจนา	DDE จุด A	โทร.๐๔๑-๗๓๘๗๖๑๗
2.	SPA06				หน้าทางเข้าโรงเรียนกาญจนา	DDE จุด B	Disชั่วคราว หนองศาลกาบ	นายณฤทธิ์ สาดเนร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พช.๖ (สข.) โทร ๐๔๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดช.....)

ตำแหน่ง.....ร.จ.ก.(ท.) กฟส.สพ.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.น.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPA06 จาก Disชั่วคราว.กาญจนา ถึง DDE จุด A

ในวันที่ 28 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 700/68

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SPA06 จาก DDE จุด B ถึง Dis ช.ก. หนองศาลกาบ

ในวันที่ 28 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ส. สว่าง ออ.ศูนย์ฯ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณกร สุวรรณประทีป

จ.จ.ก.

(.....นางสาวสุกัญญา วงศ์บุญพัก.....)

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....1.....แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3), ผจก. กปจ. ลพ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง.....2.....แผ่น

แผ่นผังแนบ.....1.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าโรงเรียนกาญจนาฯ (ไม่มีโหลด ผขฟ)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 เม.ย. 68	ระหว่าง	13.00 น.	ถึง	-	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพ.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยนเสา 12 เมตร เนื่องจากรถชนเสา		ตามใบขอปฏิบัติงาน 700/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	27 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายวิวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA		
3	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
4	SPA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA		
5	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
6	SPA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	สวิตช์
7	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
8	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		
9	SPB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
10	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA02						
11	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		ขนานบัส
12	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.		Dis
13	DIS ชด. ในไลน์ SPA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		Dis
14	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		ขนานบัส
15	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPB06						
16	SF6 ชด. Tile line SPA06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพ.		SF6
17	SPA07S-02	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6
18	DIS ชด. ในไลน์ SPA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		Dis
19	SPA07S-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6
20	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 13.00 น.						
21	ระหว่างจุดที่จะดำเนินการตัด DDE ทั้ง 2 จุด ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟฟ้า						
22	แจ้ง ชุด HL ทำการตัด DDE จุด A แยกออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
23	เมื่อ ชุด HL ทำการตัด DDE จุด A แยกออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
24	แจ้ง ชุด HL ทำการตัด DDE จุด B แยกออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
25	เมื่อ ชุด HL ทำการตัด DDE จุด B แยกออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
26	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กฟส.สพ. รับทราบ						
27	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
28	SPA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPA		
29	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
30	SPA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA			
32	SPA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	สหวิทย์
33	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA			
34	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB			
35	SPB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB			
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก								
36	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
37	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง							
38	SPA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA			
39	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA			
40	SPA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA			
41	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA			
42	SPA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R	สหวิทย์
43	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA			
44	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB			
45	SPB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB			
46	แจ้งชุด HL ดำเนินการเชื่อม DDE จุด A เข้าสวิตช์กันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ							
47	เมื่อชุด HL ดำเนินการเชื่อม DDE จุด A เข้าสวิตช์กันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แล้วเสร็จ							
48	แจ้งชุด HL ดำเนินการเชื่อม DDE จุด B เข้าสวิตช์กันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ							
49	เมื่อชุด HL ดำเนินการเชื่อม DDE จุด B เข้าสวิตช์กันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แล้วเสร็จ							
50	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนกลับจาก SPB06							
51	SPA07S-02	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	ไทยสมุทรฯ
52	DIS ชด. ในไลน์ SPA06	ปลด	สับ		สพ.		Dis	ชั่วคราวหนองตาลกาบ
53	SF6 ชด. Tile line SPA06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ชั่วคราวเลยขนส่งสุพรรณ
54	SPA07S-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ไทยสมุทรฯ
55	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนกลับจาก SPA02							
56	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA			ขนานบัส
57	DIS ชด. ในไลน์ SPA06	ปลด	สับ		สพ.		Dis	ชั่วคราว รร.กาญจนาฯ
58	SPA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		Dis	เสี่ยงเมืองสถานพินิจ
59	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA			ขนานบัส
60	SPA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPA			
61	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA			
62	SPA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPA			
63	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA			
64	SPA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	สหวิทย์
65	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA			
66	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB			
67	SPB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.สพ./รจก.(ท) กฟส.สพ.

ถึง ผจก.กฟส.สพ.


วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

ด้วยในวันที่.. ๒๘ เม.ย.๖๘ ... ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... หน้าทางเข้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยกชুমประตูลิขิตพระเกียรติ โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟิดเดอร์..๖..สถานี...สุพรรณบุรี ๑...ตั้งแต่บริเวณ.. หน้าทางเข้าโรงเรียนกาญจนาฯ ทั้ง๒ฝั่งถนน

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายณฤทธิ์ สาเดณ..ตำแหน่ง ..พช.๕ผบ.กฟส.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่...๐๙๑-๗๓๘๗๖๑๗..เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายพิบูล ปานข้า ตำแหน่ง ผผ.ปบ.กฟส.สพ. โทร ๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

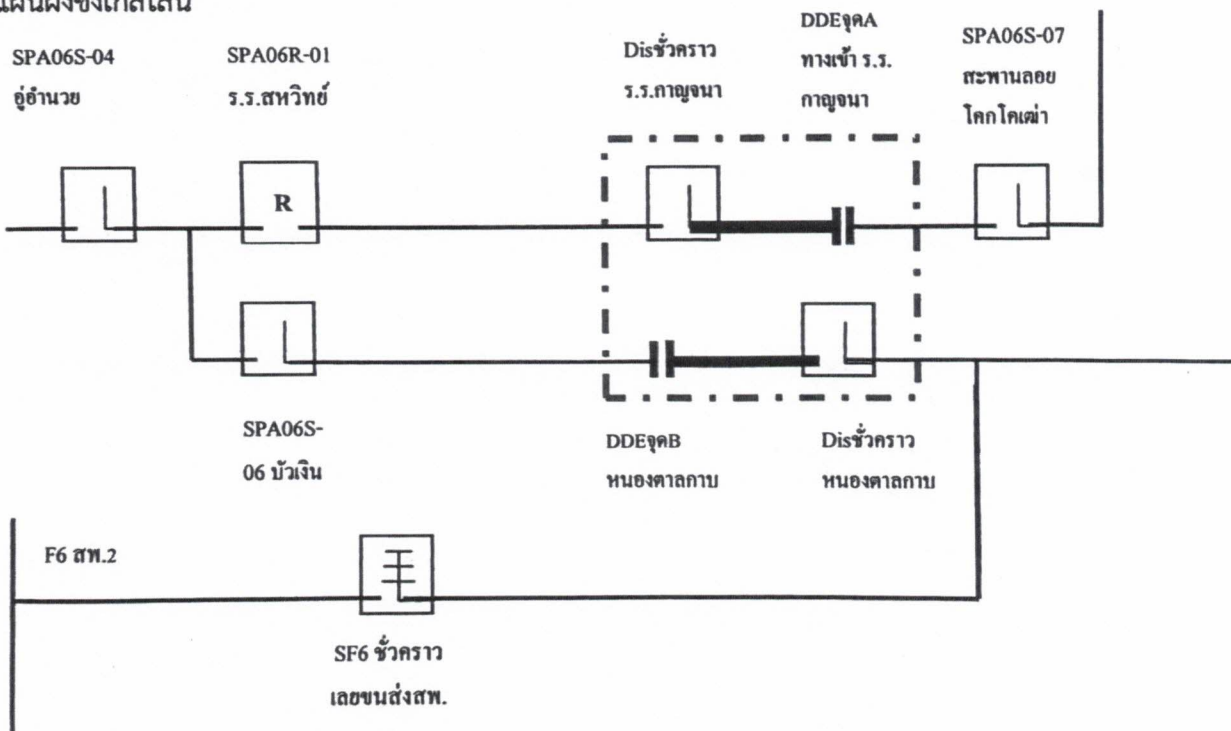

ดับไฟระบบจำหน่าย รือถอนเสาแรงสูง

๑. ย้ายโหลตบริเวณจุดปฏิบัติงาน
๒. ชุดแก้ไฟดับ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐น.
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทิมแก้ไฟ ชัดกราวด์ จุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ



(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.)ผบบ.กฟส.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.สพ.
