



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กฟส.ศด.๒(บป) ๕๖๘/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นางนงลักษณ์ งามชื่น

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ชจก.(ล) รักษาการแทน ผจก.กฟส.ศด.๒(บปว)

ด้วย กฟส.ศด.๒(บปว) ขอตัดไฟ วงจรที่ ๐๔ และ ๐๗ สถานีสมุทรสาคร ๕ เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายให้กรมทางหลวง ก่อสร้างสะพานคลองนาเกลือ ริมถ.พระราม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SME๐๔	๑๐ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวระบบจำหน่ายให้ กรมทางหลวงก่อสร้าง สะพานคลองนาเกลือ ริม ถ.พระราม ๒	Dis ชั่วคราว ปตท.นาโคก	SME๐๔S-๐๕ ชนแดน สมุทรสงคราม	นายเจษฎา คงทุกา ตำแหน่ง พชง.๗ โทรศัพท์ ๐๘๓-๔๒๘๘๓๕๖
๒.	SME๐๗					Dis ชั่วคราว ร้านขายแมคโคร	SME๐๗S-๐๗ ชนแดน สมุทรสงคราม	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สนมแข่งรถเทพนคร, ซอยโกดัง, บิมน้ำมัน ปตท.นาโคก, บิมน้ำมันเอสโซ่, บิมน้ำมันพิที

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรณุนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง หน.บ.บ.โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๔๖๐๒๑๒๓ Long ๑๐๐.๐๙๕๒๔๗๒

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๔๕๐๗๗๒ Long ๑๐๐.๐๘๑๐๒๔๑

เรียน ผจก.กฟภ.สมุทรสาคร

เพื่อโปรดทราบ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ชจก.(ล) รักษาการแทน ผจก.กฟส.ศด.๒(บปว)

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SME๐4 จาก Disชั่วคราว ปตท.นาโคก ถึง SME4S-05

ในวันที่ 10 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 711/2568

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SME๐7 จาก Disชั่วคราว ร้านขายแมคโคร ถึง SME๗S-07

ในวันที่ 10 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชูทอง ฉ่ำอิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรณุนันท์ บัวสงค์

ชูทอง

(นางสาวสุกัญญา วงศ์บุญทด)

วต. 5 แทน ทว.ลป.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟผ. ร๓.๒

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


หน้าที 1 จาก 2
เบสทาสวทง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ สะพานคลองนาเกลือริม ถ.พระราม 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 พ.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศค2.(บพว.)	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่ายให้กรมทางหลวงก่อสร้าง			ตามใบขอปฏิบัติงาน 711/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	5 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 พฤษภาคม 2568	
7. สังทำสวิตชิงโดย	1. นางสาวสุรัชชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐภาณุจน,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SME04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
3	SME07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
4	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
5	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กาหลง		ปตท.นาโคก
6	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กาหลง		ร้านขายรถแม็คโค
7	ตรวจสอบ SF6 รหัส SME04S-05,SME07S-07 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN+LOCK						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.บพว. รับทราบ						
9	แจ้ง กฟส.บพว. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
10	แจ้ง กฟส.บพว. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
11	แจ้ง กฟส.บพว. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
12	แจ้ง กฟส.บพว. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4						
13	เมื่อ กฟส.บพว. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
15	SME04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
16	SME07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
17	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
18	SME04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
19	SME07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
20	แจ้ง กฟส.บพว. ปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้ง กฟส.บพว. ปลด Short Ground จุด G2						
22	แจ้ง กฟส.บพว. ปลด Short Ground จุด G3						
23	แจ้ง กฟส.บพว. ปลด Short Ground จุด G4						
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		กาหลง		ปตท.นาโคก

[illegible]

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ที่ดับไฟพร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

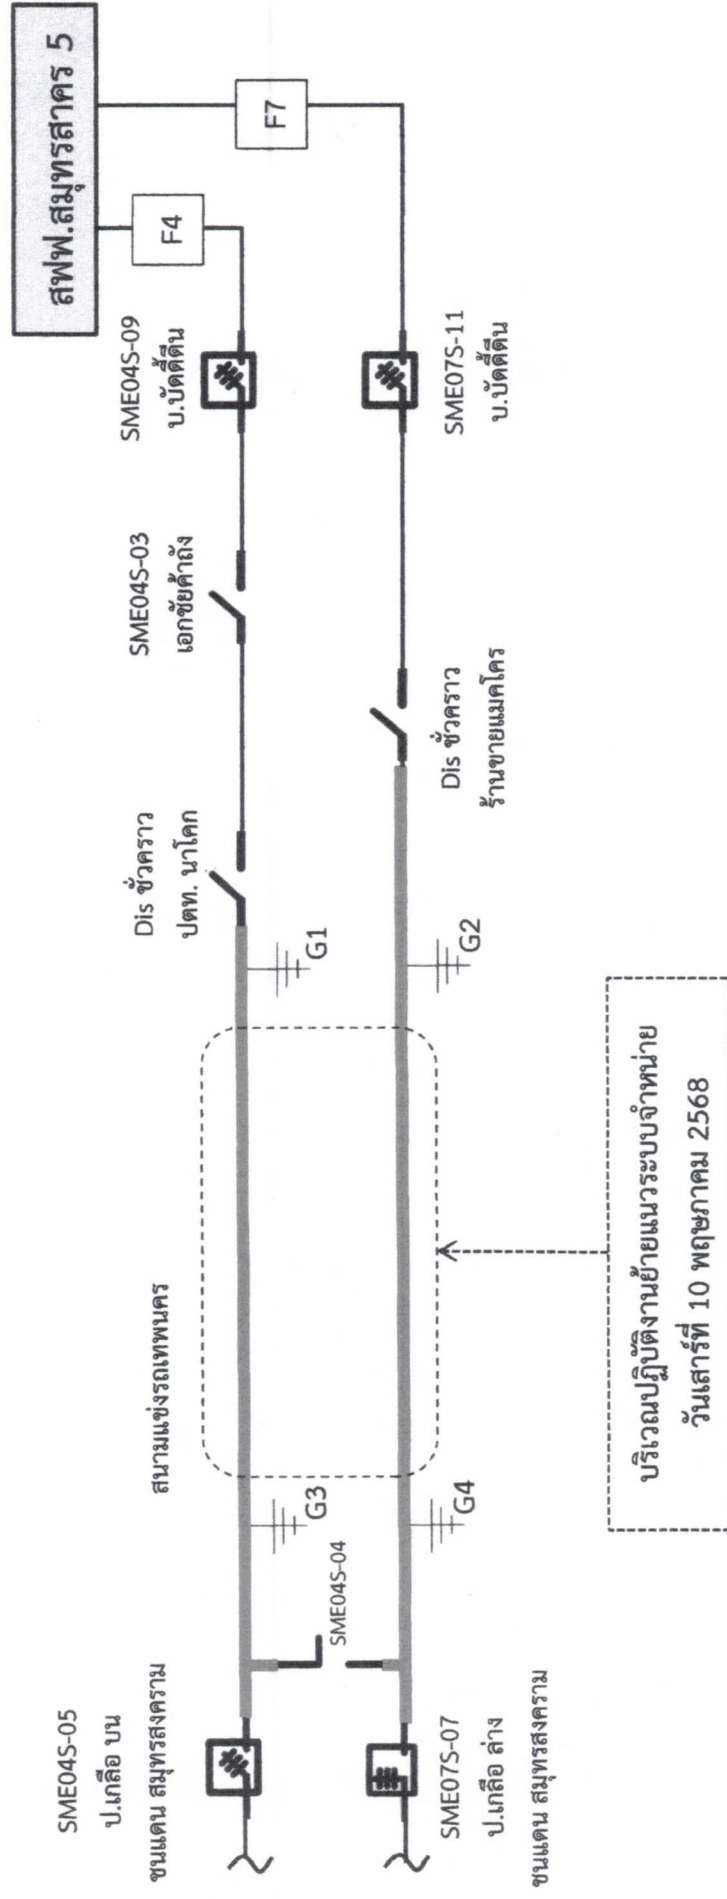

เส้นที่บแสดงพื้นที่ดับไฟ

ตำแหน่งจุด Short Ground
