



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

14 พ.ค. 68

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๖๕๔ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัฒน์ น. พชรสุวรรณ

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า...กฟส.สค...จะขอดับไฟระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ให้ชุดงานเปลี่ยนลูกถ้วย ๑๑๕ เควี บริเวณ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตั้งแต่ ปากทางนิคมฯซอย ๑๘ ถึง สี่แยก บริษัทหลักก๊
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	THU๐๔	๑๘ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอดับไฟระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ให้ชุดงานเปลี่ยนลูก ถ้วย ๑๑๕ เควี บริเวณ นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร ตั้งแต่ ปาก ทางนิคมฯซอย ๑๘ ถึง สี่แยก บริษัทหลักก๊	THU๐๔S-๐๓ ปากซอย ๑๔	THS๐๖S-๐๔ ปากทางซอย ๑๔	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	THU๐๔	๑๘ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THU๐๔S-๐๓ ปากซอย ๑๔	THU๐๓S-๐๔ ปากซอย ๑๔	
๓	THU๐๔	๑๘ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THU๐๔S-๐๓ ปากซอย ๑๔	THS๐๓S-๐๖ ตรงข้ามบ.แม่ค โซเฟ้นซ์	
๔	THU๐๔	๑๘ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THU๐๔S-๐๓ ปากซอย ๑๔	THU๐๔S-๐๕ ท้ายซอย ๑๕	
๕	THU๐๔	๑๘ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THU๐๔S-๐๓ ปากซอย ๑๔	THS๐๕S-๐๙ บ.ลองเทศซ์	
๖	THU๐๔	๑๘ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THS๐๕S-๐๙ บ.ลองเทศซ์	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ปาก ซอย ๑๘	
๗	THU๐๔	๑๘ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THU๐๔S-๐๓ ปากซอย ๑๔	SMZ๐๔S-๐๓ บ.ลองเทศซ์	

๘	FH๒๐๔ ๕๗๒	๑๘ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMZ๐๔S-๐๓ บ.ลองเทศซ์	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ปาก ชอย ๑๘	
๙	THS๑๕	๑๘ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THS๐๖S-๐๒ ปากชอย ๔	THS๐๖S-๐๓ ปากชอย ๔	
๑๐	THS๑๕	๑๘ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THS๐๖S-๐๒ ปากชอย ๔	THS๐๖S-๐๔ ปากทางชอย ๑๔	
๑๑	THS๑๕	๑๘ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า หน้า บ.ลี้คัก	THS๐๓S-๐๖ ตรงข้าม บ.แม่ค โซพันธ์	
๑๒	๑๑๕ kV	๑๘ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๐๑YS-๐๓ บริษัทลี้คัก	จุดปลดสายโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๑๑๕ kV ตรงข้าม บ. อยู่ยง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ภายในนิคมอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ปากชอย ๑๘ ถึง สี่แยก ลี้คัก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวุฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พง.๖ โทร ๐๘๖-๓๘๓๒๐๘๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค...

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

THS 055-09
THV 045-05
THS 035-06
THV 045-04
THS 065-04

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-5 พัดเตอร์ THV4 จาก THV045-03 ถึง
ในวันที่ 16 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 718/2568
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 พัดเตอร์ THV4 จาก THS 055-09 ถึง DDE ภาณุพงษ์ 18
ในวันที่ 16 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7 พัดเตอร์ THV4 จาก THV 045-03 ถึง SMZ 045-03
ในวันที่ 16 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 8 พัดเตอร์ SMZ 04 จาก DDE ภาณุพงษ์ 18 ถึง SMZ 045-03
ในวันที่ 16 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 9-10 พัดเตอร์ THS 15 จาก THS 065-02 ถึง THS 065-03, 04
ในวันที่ 16 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 11 พัดเตอร์ THS 15 จาก DDE ภาณุพงษ์ 18 ถึง THS 035-06
ในวันที่ 16 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 12 พัดเตอร์ 115KV จาก SMZ 01 TS-03 ถึง DDE ดร.วิมล น. อึ้งชู
ในวันที่ 16 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัชร 6813 มิ่ง ประสานงานการขอดับไฟกับ ภาณุพงษ์ บุณย์
11 พ.ค. 68

(ภาณุพงษ์ 6813 มิ่ง)
อสค.5 ภาณุพงษ์ ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น
แผนผังแนบ 4 แผ่น

ผจพ. 1,2 (สถานี THV, SMZ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)


- [illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	THS09S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6	หน้า บ.บางกอกฟอยล์
32	THUBR-03	สับ	ปลด		THU			
33	- ย้ายโหลด THU04 บางส่วนไปรับไฟจาก SMZ05							
34	SMZ05S-03	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6	หน้า บ.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต
35	THS05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SCADA	SF6	หน้า บ.ลองเท็กซ์
36	- ย้ายโหลด THU04 ไปรับไฟจาก THS14 ผ่านไลน์ THU03							
37	THS09S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6	ปากซอย 6
38	THUBR-04	ปลด	สับ		THU			
39	THU01YB-01	สับ	ปลด		THU			เบรกเกอร์ 115 kV
40	THU01YS-01	สับ	ปลด		THU			ใบมีด 115 เควี
41	ย้ายไฟ สถานี THU ไปรับภายนอก							
42	THU04S-01/01	สับ	ปลด		THU			ใบมีดกันย้อน
43	THUBR-04	ปลด	สับ		THU		DIS	sw.bypass
44	- ย้ายโหลด SMZ03 ไปรับไฟจาก KTE02							
45	KTE02S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6	แยกวัดเกาะ
46	SMZ03VB-01	สับ	ปลด		SMZ			
47	- ดับไฟสถานีฯ SMZ ย้ายโหลด SMZ01,02,04,05 ไปรับไฟจาก SMB05							
48	SMB05S-02	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6	ท้ายซอยข้างสฟ. สค.2
49	SMZ01BVB-01	สับ	ปลด		SMZ		CB	IN01
50	SMZ01YB-01	สับ	ปลด		SMZ		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
51	- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ THU และบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต ไปรับไฟจาก จากสถานีฯ SME							
52	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟระบบ 115 เควี Loop สถานีฯ SME03YB-03-SME04YB-03 Close Loop อยู่ปกติ							
53	BAL02YB-01	สับ	ปลด		BAL		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
54	ตรวจสอบ LBS 115 เควี ปากทางสวนส้ม รหัส SME03YS-08 ไม่ LOW GAS							
55	SME03YS-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SCADA	LBS	ปากทางสวนส้ม
56	SMB01YS-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		ABS	หลังนิคมฯ
57	BAL02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAL		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
58	SN2-7012	สับ	ปลด		EGAT		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
59	SN2-7017	สับ	ปลด		EGAT		DIS	ใบมีด 115 เควี
60	SME03YS-08	ปลด	สับ		สค.	SCADA	LBS	ปากทางสวนส้ม
61	- จ่ายไฟสถานีฯ สมุทรสาคร 16 (SMZ) ย้ายโหลด SMZ01,02,04,05 กลับจาก SMB05							
62	SMZ01YB-01	ปลด	สับ		SMZ		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
63	ควบคุมปรับแรงดันหม้อแปลง SMZ-TP1 ไว้ 22.7 kV							
64	SMZ01BVB-01	ปลด	สับ		SMZ		CB	INC.01
65	SMB05S-03	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	ท้ายซอยข้างสฟ. สค.2
66	- ย้ายโหลด SMZ03 ไปรับไฟจาก KTE02							
67	SMZ03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMZ			
68	KTE02S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	แยกวัดเกาะ
69	- เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 kV และระบบจำหน่าย 22 เควี ปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.							
70	ตรวจสอบ LBS 115 เควี พูลทรัพย์แคน รหัส SME01YS-01 สถานะ <u>ปลด, ล็อคคาน</u>							
71	ตรวจสอบ SF6 ข้าง บ.ลักกี รหัส THS06S-03 อยู่ตำแหน่ง "OPEN+LOCK"							
72	ตรวจสอบ SF6 ตรงข้าม บ.แมกโซ่พันธ์ รหัส THS03S-06 รหัส THS03S-06 อยู่ตำแหน่ง "OPEN+LOCK"							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
73	ตรวจสอบ SF6 ปากซอย 14 รหัส THU03S-04 อยู่ตำแหน่ง "OPEN+LOCK"							
74	SMB01YS-03	ลับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		สค.		ABS	บ.ล็คกี้
75	THU06S-02	ลับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6	ปากซอย 4
76	THU04S-03	ลับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สค.		DIS	ปากซอย 14
77	แจ้ง HOTLINE 115 kV ทำการตัด DDE บริเวณ ตรงข้าม บ.อู่ยง ออกทั้ง 3 เฟส							
78	เมื่อ HOTLINE 115 kV ทำการตัด DDE บริเวณ ตรงข้าม บ.อู่ยง ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
79	แจ้ง กฟส.สค. ทำการไลน์โหด DDE หน้า บริษัทล็คกี้ ถึง THS03S-06 SF6 ตรงข้าม บ.แมกโซ่เพนท์ ออก							
80	เมื่อ กฟส.สค. ทำการไลน์โหด DDE หน้า บริษัทล็คกี้ ถึง THS03S-06 SF6 ตรงข้าม บ.แมกโซ่เพนท์ ออก แล้วเสร็จ							
81	แจ้ง HOTLINE 22 kV ทำการตัด DDE บริเวณ หน้าบริษัท ล็คกี้ (THS15) ออกทั้ง 3 เฟส							
82	เมื่อ HOTLINE 22 kVทำการตัด DDE บริเวณ หน้าบริษัท ล็คกี้ (THS15) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
83	เมื่อ กฟส.สค. ทำการไลน์โหด DDE หน้า บริษัทล็คกี้ ถึง THS03S-06 SF6 ตรงข้าม บ.แมกโซ่เพนท์ ออก แล้วเสร็จ							
84	แจ้ง กฟส.สค. ทำการไลน์โหด DDE ปากซอย18 THU04 ถึง THS05S-09 SF6 หน้า บ.ลองเท็กซ์ ออก							
85	เมื่อ กฟส.สค. ทำการไลน์โหด DDE ปากซอย18 THU04 ถึง THS05S-09 SF6 หน้า บ.ลองเท็กซ์ แล้วเสร็จ							
86	แจ้ง กฟส.สค. ทำการไลน์โหด DDE ปากซอย18 SMZ04 ถึง SMZ04S-03 DIS หน้า บ.ลองเท็กซ์ ออก							
87	เมื่อ กฟส.สค. ทำการไลน์โหด DDE ปากซอย18 SMZ04 ถึง SMZ04S-03 DIS หน้า บ.ลองเท็กซ์ แล้วเสร็จ							
88	แจ้ง HOTLINE 22 kV ทำการตัด DDE บริเวณ ปากซอย18 (THU04,SMZ04) ออกทั้ง 3 เฟส							
89	เมื่อ HOTLINE 22 kV ทำการตัด DDE บริเวณ ปากซอย18 (THU04,SMZ04) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
90	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ							
91	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1							
92	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2							
93	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3							
94	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4							
95	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5							
96	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6							
97	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G7							
98	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย							
99	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
100	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	-
101	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		TP3	-
102	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ		TP1	-
103	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		TP1	-
104	SMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB	-
105	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	-
106	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		CB	-
107	THS11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	-
108	THS14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	-
109	THS15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	-
110	SMZ01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ		CB	-
111	SMZ05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ		CB	-


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
112	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		CB	-
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>								
113	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
114	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
115	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
116	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3							
117	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4							
118	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5							
119	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G6							
120	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G7							
121	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		TP3	-
122	SMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB	-
123	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB	-
124	THS11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB	-
125	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB	-
126	THS15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB	-
127	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 kV และระบบจำหน่าย 22 เควี							
128	แจ้ง HOTLINE 22 kV ทำการเชื่อม DDE บริเวณ หน้าบริษัท ลัคกี้ (THS15) เข้าทั้ง 3 เฟส							
129	เมื่อ HOTLINE 22 kV ทำการเชื่อม DDE บริเวณ หน้าบริษัท ลัคกี้ (THS15) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
130	แจ้ง HOTLINE 22 kV ทำการเชื่อม DDE บริเวณ ปากซอย18 (THU04,SMZ04) เข้าทั้ง 3 เฟส							
131	เมื่อ HOTLINE 22 kV ทำการเชื่อม DDE บริเวณ ปากซอย18 (THU04,SMZ04) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
132	แจ้ง HOTLINE 115 kV ทำการเชื่อม DDE บริเวณ ตรงข้าม บ.อยู่ยง เข้าทั้ง 3 เฟส							
133	เมื่อ HOTLINE 115 kV ทำการเชื่อม DDE บริเวณ ตรงข้าม บ.อยู่ยง เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
134	THU06S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.		SF6	ปากซอย 4
135	THU04S-03	ปลด	สับ		สค.		DIS	ปากซอย 14
136	SN2-7017	ปลด	สับ		EGAT		DIS	ใบมีด 115 เควี
137	SN2-7012	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EGAT		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
138	ย้ายไฟ สถานี THU กลับมารับไฟภายในสถานี							
139	THUBR-04	สับ	ปลด		THU		DIS	sw.bypass
140	THU04S-01/01	ปลด	สับ		THU			ใบมีดกันย้อน
141	- ย้ายโหลด THU04 กลับจาก THS14							
142	THU01YS-01	ปลด	สับ		THU			ใบมีด 115 เควี
143	THU01YB-01	ปลด	สับ		THU			เบรกเกอร์ 115 kV
144	THUBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU			
145	THS09S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6	ปากซอย 6
146	- ย้ายโหลด THU03 ไปรับไฟจาก THS14							
147	THUBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU			
148	THS09S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	หน้า บ.บางกอกฟอยล์
149	- ย้ายโหลด THU02 ไปรับไฟจาก THS15							
150	THUBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU			
151	THS15S-03	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	หน้า บ.สยามอินเตอร์ล๊อคเทค

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

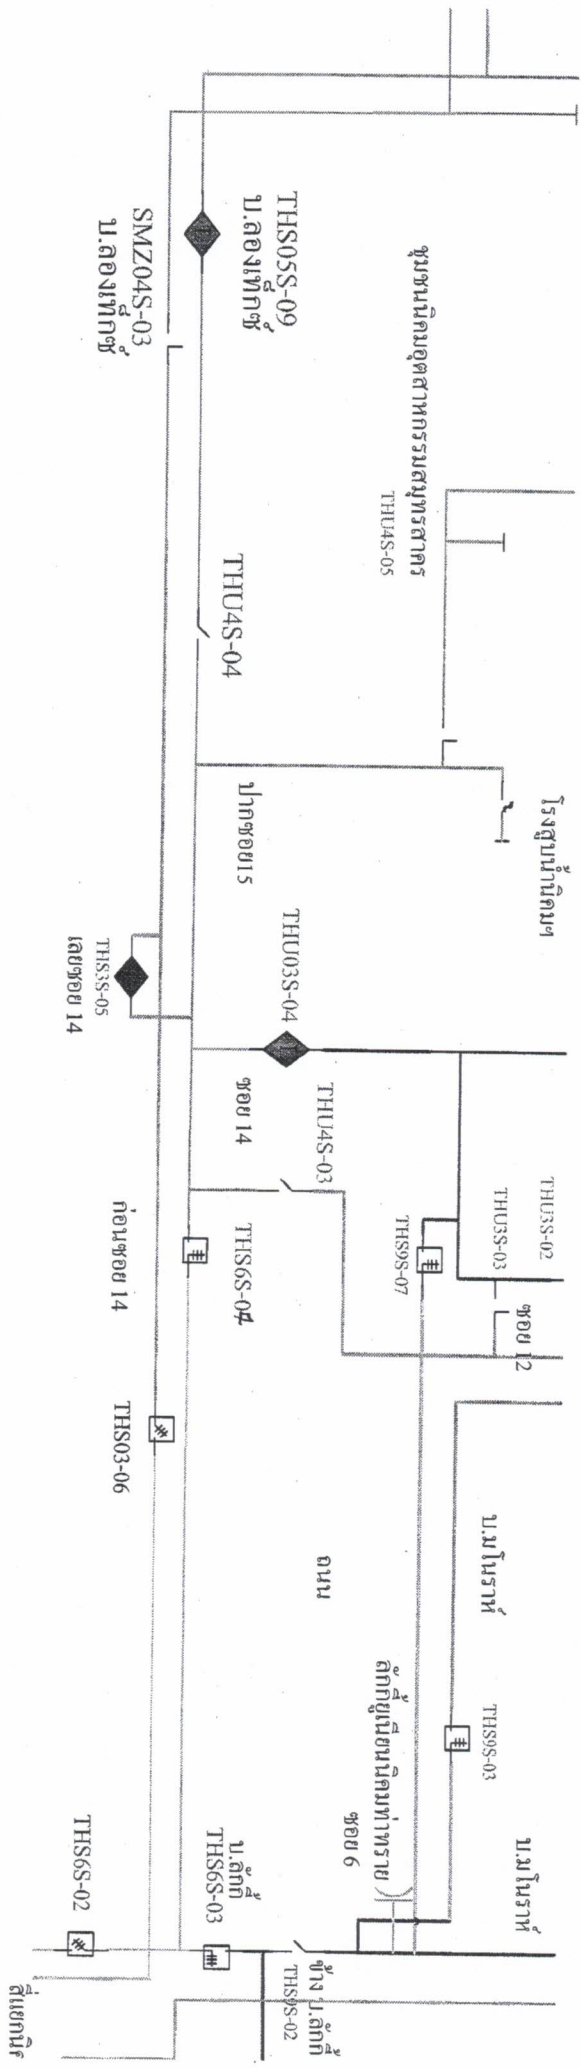


สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

จุดตัดเบรกโดยวิธีฮอทไลน์กระแส
 ปากทางซอย 18

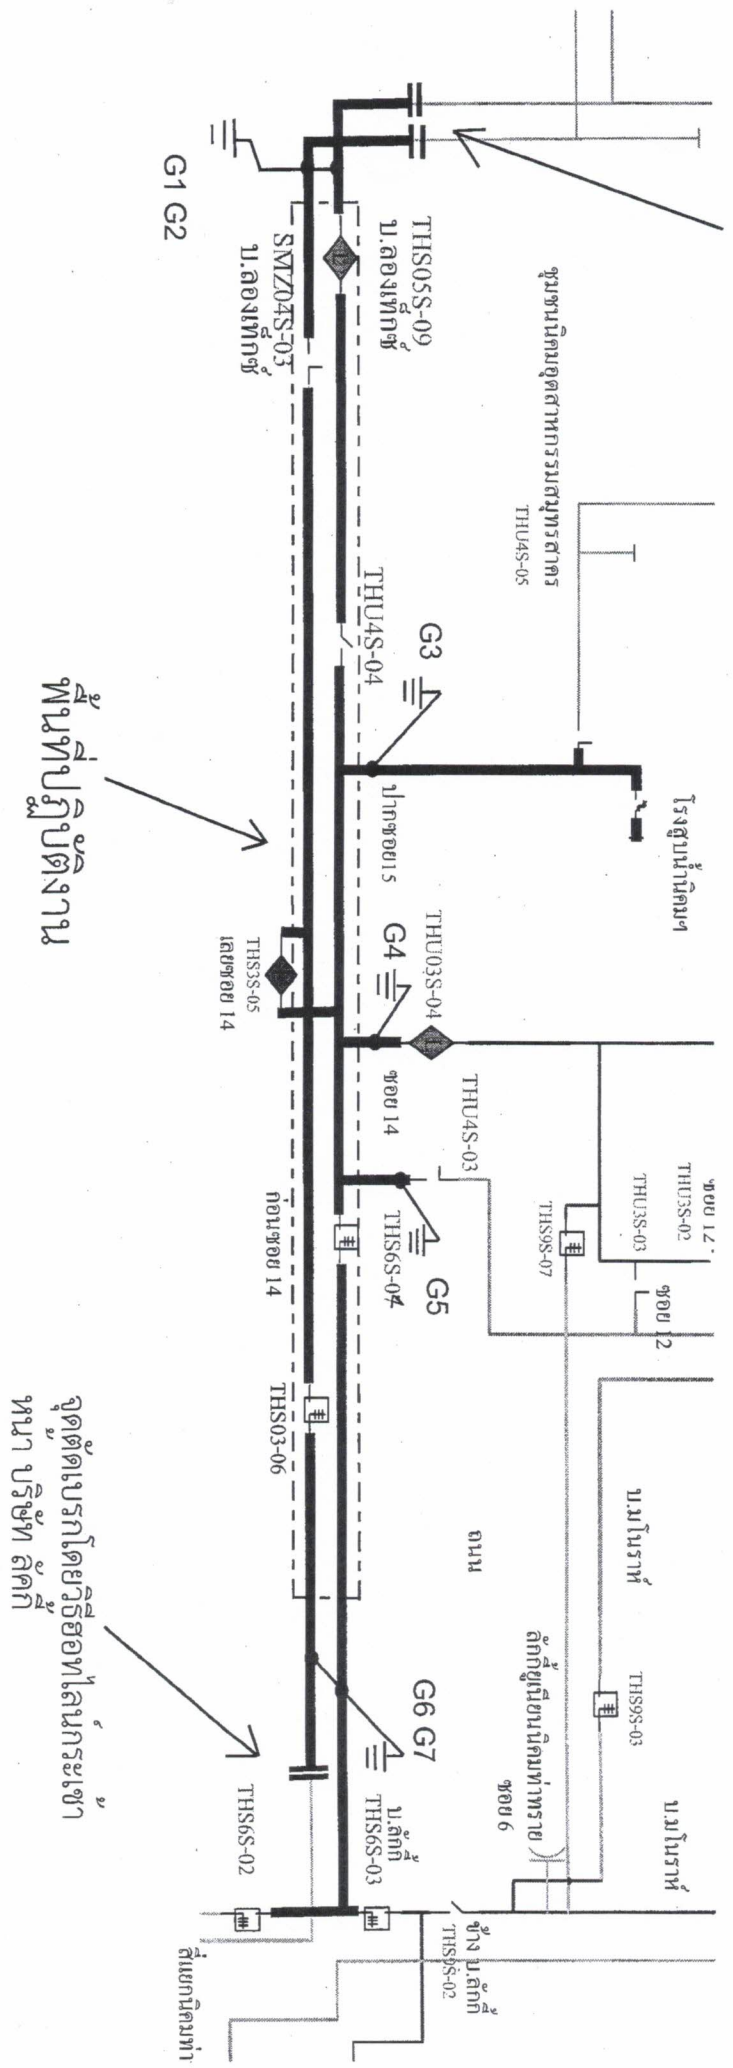

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

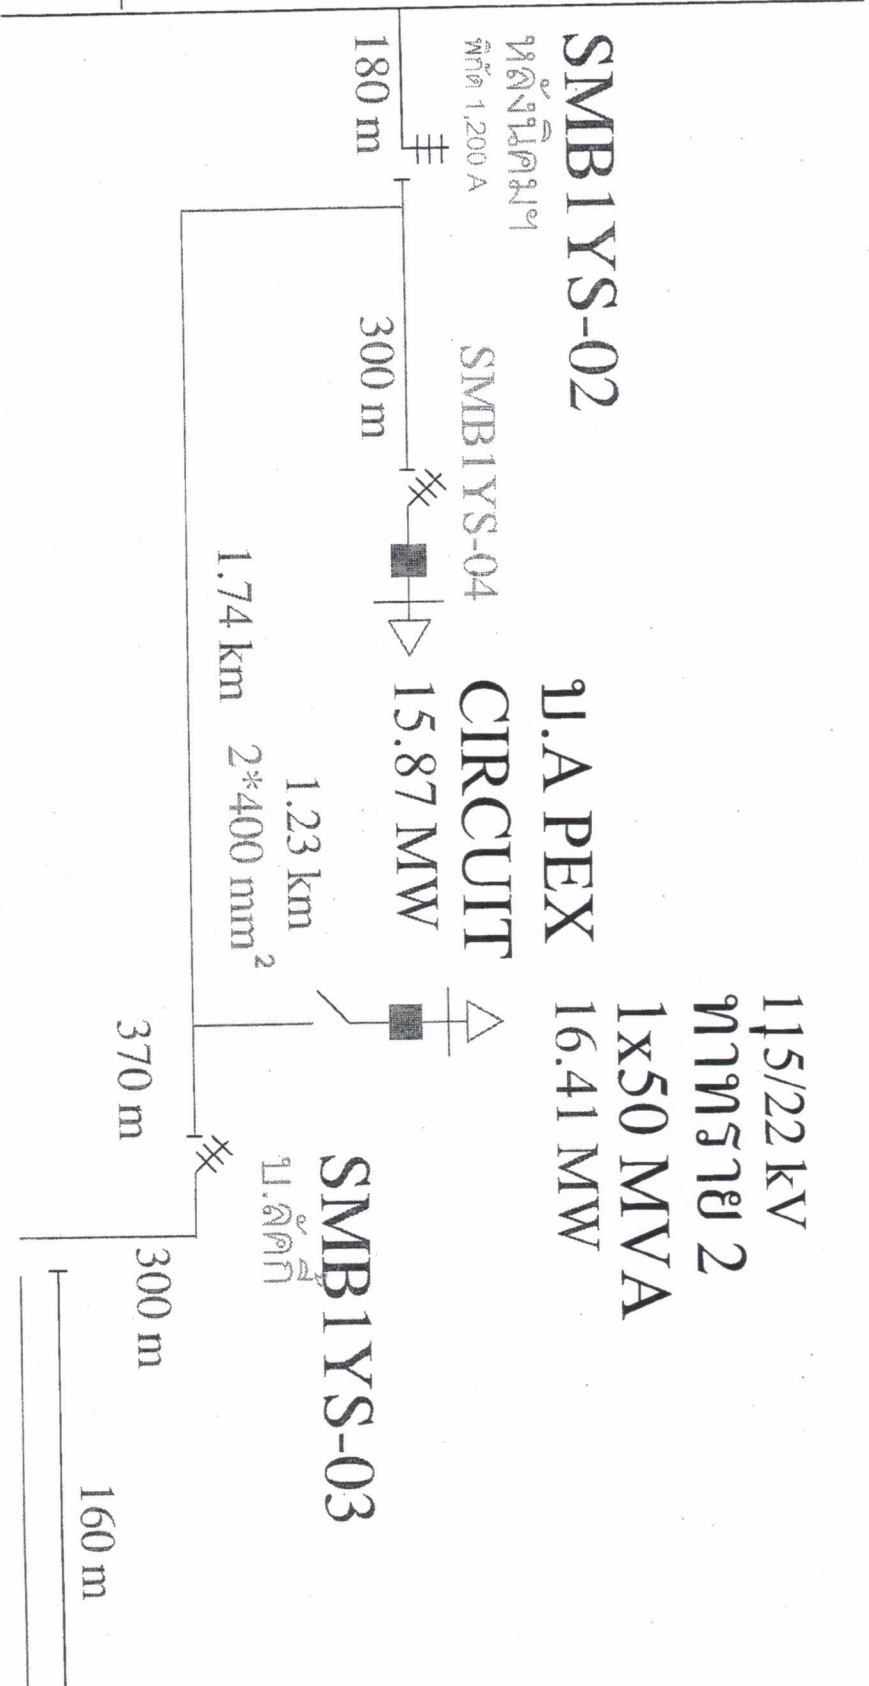

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

