



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

7 พ.ค. 68

เลขที่ ก.ต.กฟส.กทบ.(ปน) - ๐๘๖/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช วาสูกรี

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ.....ให้ชุดปฏิบัติงาน ผปน.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 (ทิศทางไปสี่แยกอ้อมน้อย) ตั้งแต่ ปากซอยวิรุณราษฎร์ จนถึง หน้า สฟฟ.สามพราน 1.....สถานีไฟฟ้า กระทบแนบ 4. สามพราน 1.....ตามแผนผังแนบ จำนวน 5.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง SAA - KTD	11 พ.ค. 2568	8.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนน เศรษฐกิจ 1 (ทิศทาง ไปสี่แยกอ้อมน้อย) ตั้งแต่ ปากซอยวิรุณ ราษฎร์ จนถึง หน้า สฟฟ.สามพราน 1	อุปกรณ์ป้องกันรหัสSAA03YB-01	อุปกรณ์ป้องกันรหัสKTD02YB-01	นายกฤษณะ ชนะภัย พชง.6 ผปน. กฟส.กทบ. โทร. 098 - 8315274
2.	SAA 01					อุปกรณ์ตัดตอนรหัส SAA01S-01	อุปกรณ์ตัดตอนรหัส SAA01S-03	
3.	SAA 05					อุปกรณ์ตัดตอนรหัส SAA05S-01	อุปกรณ์ตัดตอนรหัส SAA05S-03	
4.	SAA 09					อุปกรณ์ตัดตอนรหัส SAA09S-01	อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTD06S-03	
5.	SAA 10					ปลดสายแรงสูง ที่จุดแท็บแยกสาย แรงสูง วงจรบน (จุด A)	อุปกรณ์ตัดตอนรหัส SAA10S-04	
6.	KTD 04					อุปกรณ์ตัดตอนรหัส SAA05S-03	อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTD04S-05	
7.	KTD 06					อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTD06S-03	ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE วงจรบน (จุด B)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ ปากซอยวิรุณราษฎร์ จนถึง หน้า สฟฟ.สามพราน 1. มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ จำนวน 494 ราย.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ผ.ปน. กฟส.กทบ. โทร. 087 - 6715626

1. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.689927, 100.292305

3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.680186, 100.286736

(.....นายมาโนช วาสูกรี.....)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๒๙ เมษายน ๒๕๖๘

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผพ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก SAA03YB-01 ถึง KTD02YB-01
ในวันที่ 11 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 722/2568.
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SAA01 จาก SAA01S-01 ถึง SAA01S-03.
ในวันที่ 11 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SAA05 จาก SAA05S-01 ถึง SAA05S-03
ในวันที่ 11 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ SAA09 จาก SAA09S-01 ถึง KTD06S-03
ในวันที่ 11 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ SAA10 จาก มณฑลราชบุรี ๑๑๑๑๑ SAA10S-04
ในวันที่ 11 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 ฟีดเดอร์ KTD04 จาก SAA05S-03 ถึง KTD04S-05
ในวันที่ 11 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7 ฟีดเดอร์ KTD06 จาก KTD06S-03 ถึง มณฑลราชบุรี DDE (๑๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑)
ในวันที่ 11 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมรรถ ใจธรรมะ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายเทพพร ใจธรรมะ

จรรยา
(นางสาวจรรยา จงดี) จรรยา
อสก 5 แทน ผพ.ภ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3), ผจก. นพส. กนบ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ 5 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผพ. (.....) (.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากซอยวิรมราชภัฏ - หน้าสถานีสามพราน1						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 พ.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 722/68			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่	5 พฤษภาคม 2568		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 พฤษภาคม 2568		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 พฤษภาคม 2568		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย							
		1. นายนครินทร์,นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
		2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑียร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
		3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัช,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟ Close loop SAA01YB-01 ,SAA03YB-01							
1	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
2	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SAA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	LOAD 3.27 MW
4	SAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	-
5	SAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	-
6	SAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	LOAD 8.56 MW
7	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	-
8	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	-
9	KTD03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	LOAD 3.6 MW
10	KTD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	-
11	KTD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	-
12	KTD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	LOAD 2.15 Mw
13	ย้ายโหลด SAA01 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KTD03						
14	KTD03S-09	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 รร.บ้านคลองแค
15	SAA01S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.	SCADA	SF6 ปากซอยคลองแค
16	ย้ายโหลด SAA10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KTD07						
17	KTD07S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ตลาดนัดคลองแค
18	KTD06S-03	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 หน้าสยามพิตติ้ง
19	DIS ขด.ไลน์ SAA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ขอยคลองแค
20	KTD06S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.	SCADA	SF6 หน้าสยามพิตติ้ง
21	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
22	SAA01VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-
23	SAA05VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-
24	SAA09VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-
25	SAA01S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.1
26	SAA05S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
27	SAA09S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.9

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	KTD04S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6	ปาก ช.วิรุฬราชบุรี
29	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการล๊อคคาน SF6 SAA05S-03,SAA06S-04,KTD02S-07							
30	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการไลน์โหลดพื้นที่ดับไฟวงจร SAA10 (วงจรบน DDE จุด A) KTD06 (วงจรบน DDE จุด B)							
31	เมื่อ กฟส.กทบ.ทำการไลน์โหลดพื้นที่ดับไฟวงจร SAA10 (วงจรบน DDE จุด A) KTD06 (วงจรบน DDE จุด B) แล้วเสร็จ							
32	แจ้ง HL ทำการตัด DDE จุด A วงจรบน SAA10 ,จุด B วงจรบน KTD06 (ตามผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟสได้							
33	เมื่อ HL ทำการตัด DDE จุด A วงจรบน SAA10 ,จุด B วงจรบน KTD06 (ตามผังแนบ) ออกทั้ง 3 แล้วเสร็จ							
34	SAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	KTD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SAA03YB-01	สับ	ปลด		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	SAA03YS-02	สับ	ปลด		SAA		-	ใบมีด 115 เควี
38	SAA03YS-03	สับ	ปลด		SAA		-	ใบมีด 115 เควี
39	KTD02YB-01	สับ	ปลด		KTD		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
40	KTD02YS-01	สับ	ปลด		KTD		-	ใบมีด 115 เควี
41	KTD02YS-02	สับ	ปลด		KTD		-	ใบมีด 115 เควี
42	แจ้ง กฟส.กทบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G1							
43	แจ้ง กฟส.กทบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G2							
44	แจ้ง กฟส.กทบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G3							
45	แจ้ง กฟส.กทบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G4							
46	แจ้ง กฟส.กทบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G5							
47	แจ้ง กฟส.กทบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G6							
48	แจ้ง กฟส.กทบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G7							
49	แจ้ง กฟส.กทบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G8							
50	แจ้ง กฟส.กทบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G9							
51	แจ้ง กฟส.กทบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G10							
52	แจ้ง กฟส.กทบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground ระบบ 115 เควี จุด G1							
53	แจ้ง กฟส.กทบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground ระบบ 115 เควี จุด G2							
54	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ							
55	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
56	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
57	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
58	SAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-	-
59	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-	-
60	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-	-
61	KTD03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-	-
62	KTD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-	-
63	KTD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-	-
64	KTD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-	-
65	แจ้ง กฟส.กทบ.ปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	เมื่อ กฟส.กทบ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
67	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
68	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
69	SAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	-
70	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	-
71	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	-
72	KTD03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	-
73	KTD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	-
74	KTD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	-
75	KTD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	-
76	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G1						
77	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G2						
78	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G3						
79	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G4						
80	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G5						
81	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G6						
82	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G7						
83	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G8						
84	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G9						
85	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G10						
86	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลด Short Ground ระบบ 115 เควี จุด G1						
87	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลด Short Ground ระบบ 115 เควี จุด G2						
88	KTD02YS-01	ปลด	สับ		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
89	KTD02YS-02	ปลด	สับ		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
90	SAA03YS-02	ปลด	สับ		SAA	-	ใบมีด 115 เควี
91	SAA03YS-03	ปลด	สับ		SAA	-	ใบมีด 115 เควี
92	SAA03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
93	KTD02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
94	SAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
95	KTD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
96	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE จุด A วงจรบน SAA10 ,จุด B วงจรบน KTD06 (ตามผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
97	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE จุด A วงจรบน SAA10 ,จุด B วงจรบน KTD06 (ตามผังแนบ) เข้าทั้ง 3 แล้วเสร็จ						
98	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลดล๊อคคาน SF6 SAA05S-03,SAA06S-04,KTD02S-07						
99	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
100	KTD04S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กทบ.	SF6	ปาก ซ.วิรุฬราชบุรี
101	SAA09S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.9
102	SAA05S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.5
103	SAA01S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.1

[illegible]


แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนการดับไฟ ตั้งแต่ ปากซอยวิรุณราษฎร์ จนถึง สฟ.สามพราน 1
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟ.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนนครปฐม 1 (ทิศทางไปสี่แยกอ้อมน้อย)
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

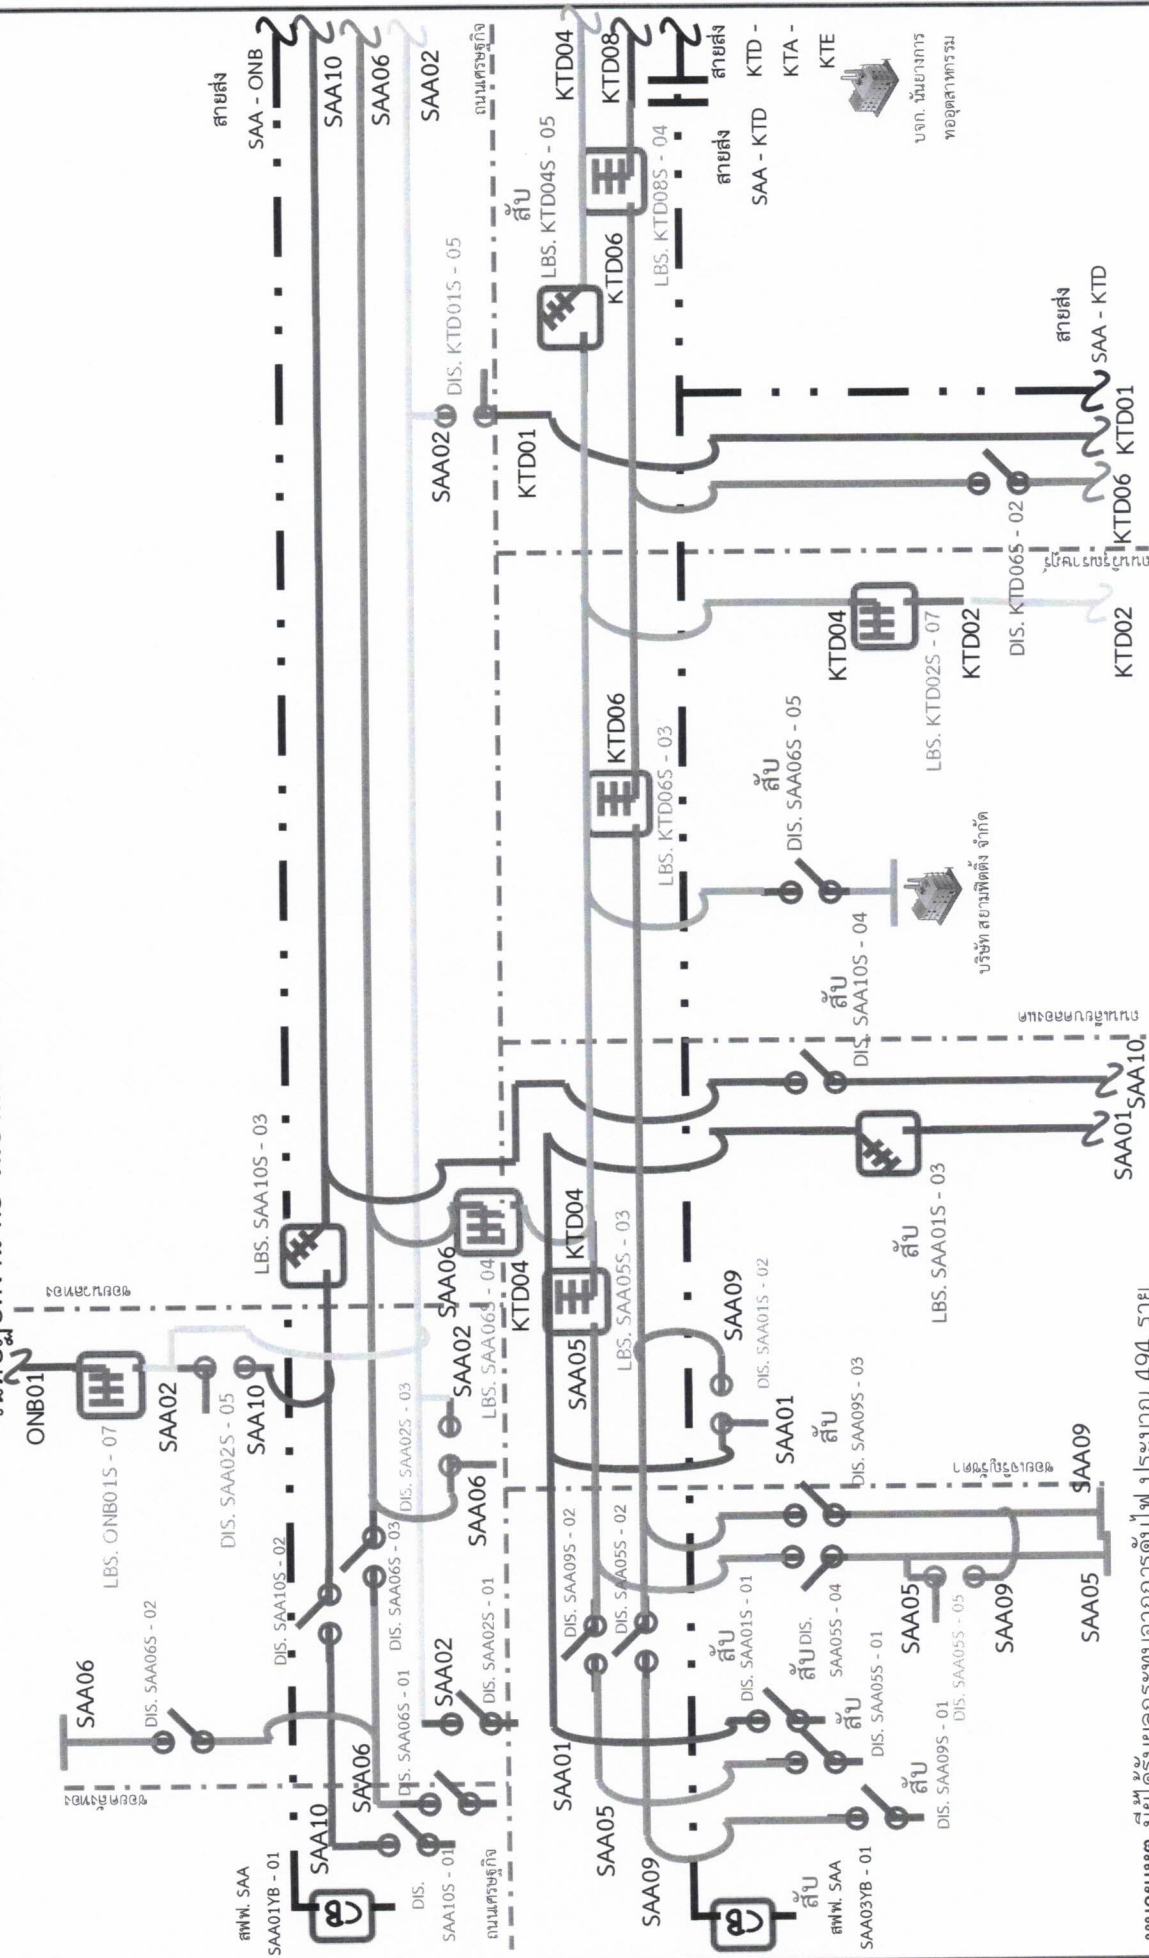

หมายเหตุ: ผู้ได้รับเลือกฯ 494 ราย
 และไม่มีหน่วยฯ การเลือกฯ 494 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังการตัดไฟฟ้า ตั้งแต่ ปากซอยวิรุณราษฎร์ จนถึง สฟ.สามพราน 1 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟ.สท.บ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนนครราชสีมา 1 (ทิศทางไปสี่แยกอ้อมน้อย)

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

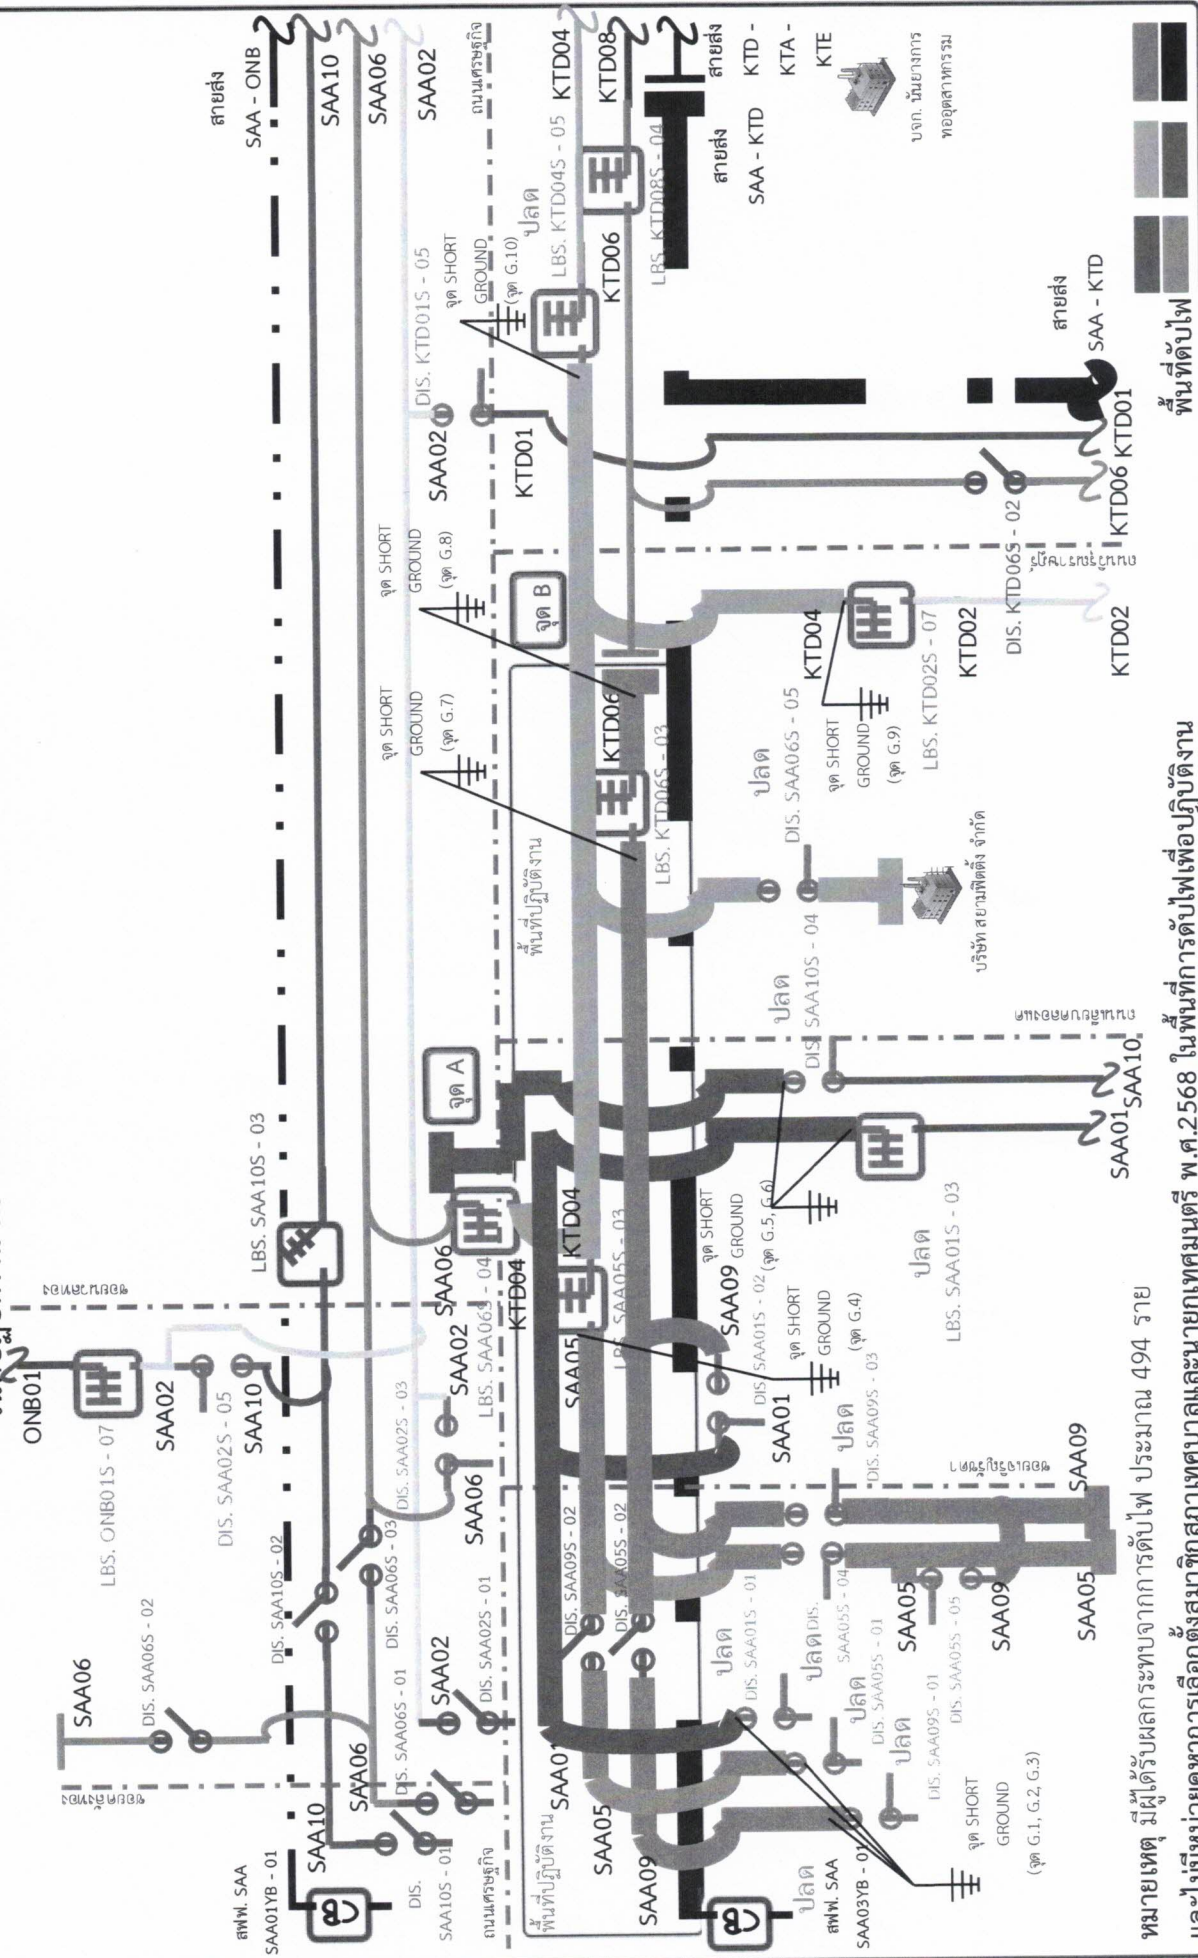


รายละเอียดรูปภาพประกอบคำอธิบายพื้นที่ หลังการดับไฟ ตั้งแต่ ปากซอยวิรุณราษฎร์ จนถึง สฟ.สามพราน 1 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนนครฐกิจ 1 (ทิศทางไปสี่แยกอ้อมน้อย)

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

จุด A

ให้ชุดปฏิบัติงานขอท่ไลน์ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง ที่จุดแท็บ
แยกสายไฟแรงสูง ท วงจรบน คือ วงจร SAA10

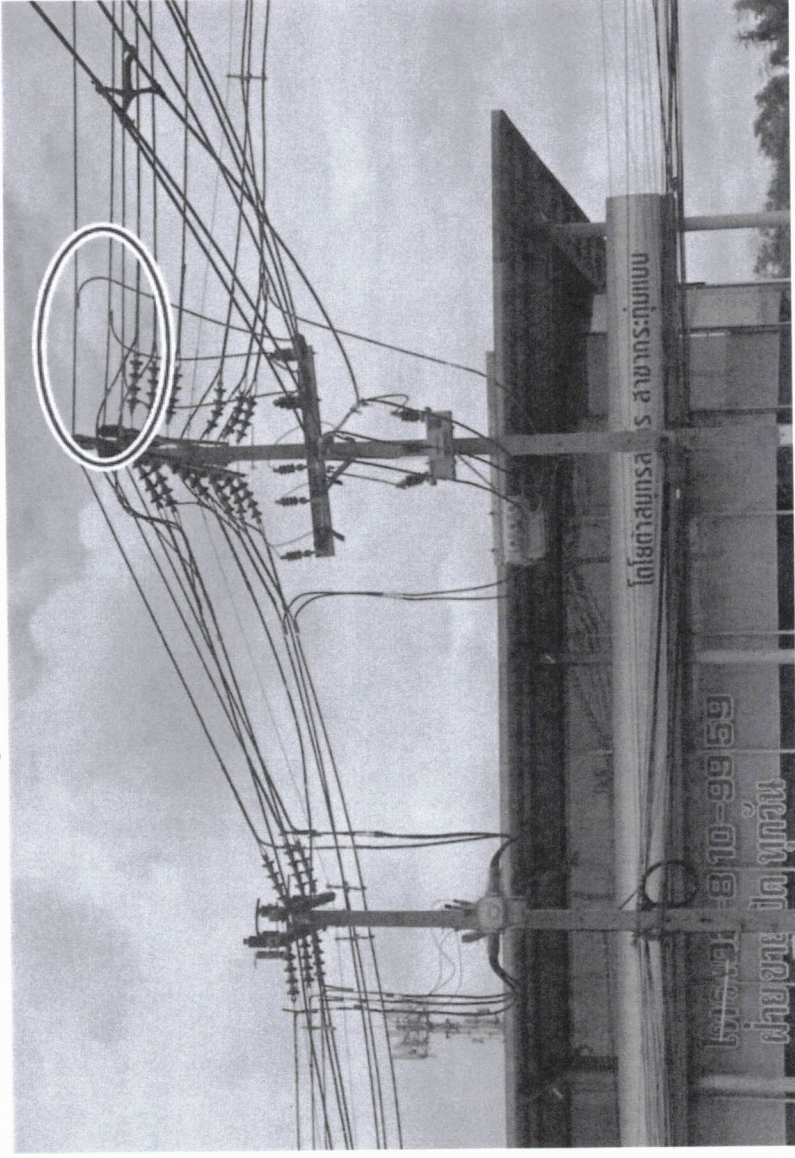

จุด B

ให้ชุดปฏิบัติงานขอท่ไลน์ปลดจุดเชื่อมสายแรง
สูง ที่หัวเสา DDE วงจรบน คือ วงจร KTD06

