



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

2 พ.ค. 68

เลขที่ ก.ต.ภ. (ป.บ.) ๖๐๔๐ / ๒๕๖๘

วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พธิราชวร ไร่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เทืองขจร

ตำแหน่ง ผอ.ก.ท.ส.ภ.จ.

ด้วย กทส.ภ. จะขอตัดไฟเพื่อปักเสา ๒๒ เมตรคู่และตั้งสายระบบ ๑๑๕ KV ข้ามถนน บริเวณสะพานจินดา (ฝั่งขวามือ) ม.๘ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟ.ภ.กาญจนบุรี ๒ - จุดตัดเขตแยกท่วน้ำต้น ระบบ ๑๑๕KV และวงจร F๑๑ สฟ.ภ.กาญจนบุรี ๓ และ F๕ สฟ.ภ.กาญจนบุรี ๑ ในระบบ ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟ.ภ.กาญจนบุรี ๒ ถึง จุดตัดเขตแยกท่วน้ำต้น ระบบ ๑๑๕KV	๓ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อปักเสา ๒๒ เมตรคู่และตั้งสายระบบ ๑๑๕ KV ข้ามถนน	สฟ.ภ.กาญจนบุรี ๒	จุดตัดเขตแยกท่วน้ำต้น	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๒	วงจร F๑๑ สฟ.ภ.กาญจนบุรี ๓	๓ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อปักเสา ๒๒ เมตรคู่และตั้งสายระบบ ๑๑๕ KV ข้ามถนน	DISS KCA๐๓S-๐๔ ตรงข้ามร้านกาแฟ คุณหญิง	Diss KCA๐๓S-๐๔ อนามัยแก่งเสี้ยน	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๒	วงจร F๕ สฟ.ภ.กาญจนบุรี ๑	๓ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อปักเสา ๒๒ เมตรคู่และตั้งสายระบบ ๑๑๕ KV ข้ามถนน	SF๑ KCA๐๕S-๐๔ ตรงข้ามร้านกาแฟ คุณหญิง	Diss ขั้วสกรว ปากซอยบ้านสวนฝน	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑ ชว.ป.บ. ก.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟ ได้รับความกระทบ(ไฟดับ) ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนทล. เตื่ออยู่ ตำแหน่ง พ.ช.๖ โทร. ๐๘๘-๘๘๘๘๘๘ / ๐๓๔-๕๕๕๕๕๕ / ๐๓๔-๕๕๕๕๕๕ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กทภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ภ.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวัชร มานิช)

ช.บ.ป.รักษาการแทน ผ.บ.กทส.ภ.จ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผอ.) กท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง

(นายธีระศักดิ์ เทืองขจร)

ผอ.ก.ท.ส.ภ.จ.

30 เม.ย. 2568

ผส.ภ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตาม คำขอ ๑ พัดเตอร์ 115kV จาก KCB ถึง จุดตัด DDE ฝั่งขวามือ
ในวันที่ 3 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 256๘ 752/68
☒ อนุมัติให้ดับไฟตาม คำขอ ๒ พัดเตอร์ KCC10 จาก KCA38-09 ถึง KCA38-5C ในวันที่
ตั้งแต่เวลา 8 พ.ค. 68 ถึง 8.00-17.00 ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตาม คำขอ ๓ พัดเตอร์ KCA5 จาก KCA55-08 ถึง DIS ตันสวน 1 ในวันที่
ตั้งแต่เวลา 3 พ.ค. 68 ถึง 8.00-17.00 ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย จณินท์ อัสสหาภิณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัชร มานิช

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผอ. กฟผ. ก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรา ครอบคลุมความปลอดภัย

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

๒๐๑๙
๑๐๐ หน่อไม้ฝรั่ง ส้มตำ ๑๔
๑๐๑.๑ กก. ๗-๗.

ขั้นตอนการสำรวจ ๒ แผ่น

แผนผังแนบ ๔ แผ่น

ผจพ. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๑๑.๑๑.๖๖ เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	สะพานจินดา (ฝั่งขวา)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 พ.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กจ.	งานที่ทำ	ปักเสา 22 เควี และพาดสายส่ง 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน 752/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน			วันที่	2 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายโมฆ 3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบ สายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ สถานีฯ กาญจนบุรี 2 ถึง DDE จุด 3 แยกท่าน้ำดิน ปลดดับไฟเรียบร้อยแล้ว						
3	ตรวจสอบ SF6 รหัส KCA03S-10 บ้านหมอเคชา สถานะ OFF + ล็อคคาน						
4	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
5	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
6	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
7	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
8	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
9	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		- -
10	KCC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
11	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
12	ย้ายโหลด KCC10 บางส่วน ไปรับไฟจาก KCA10						
13	KCA03S-08	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.		SF6 บีม ปดท. แยกแก่งเสี้ยน
14	KCA05S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง (ล่าง)
15	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
16	KCA03S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง (บน)
17	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
18	KCA05S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง (ล่าง)
19	เมื่อพร้อมดับไฟระบบ 22 เควี						
20	KCA03S-50	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS อนามัยแก่งเสี้ยน (บน)
21	DIS ชค. KCA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ปากซอยบ้านสวนฝน
22	SF6 ชค. KCC10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 ไทยออส
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ไฟดับ Short Ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ไฟดับ Short Ground จุด G2						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ไฟดับ Short Ground จุด G3						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ไฟดับ Short Ground จุด G4						
28	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
30	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
31	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
32	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
34	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
35	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		- -
36	KCC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
37	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
38	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
39	ตรวจสอบ สายวงจร KCA05 ดึงข้ามถนนมาเข้า Riser02 จั้ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว						
40	ตรวจสอบ KCA05S-07 DIS บ้านหมอเตชะ เปิดวงจร						
41	ตรวจสอบ DIS Riser01, Riser02, Riser03, Riser04 สับ ปิดวงจรทั้งหมด						
42	**KCA05S-07 DIS บ้านหมอเตชะ ห้าม สับ รอยืนยันเช็คเฟสก่อน***						
43	**KCA03S-10 SF6 บ้านหมอเตชะ ห้าม สับ รอยืนยันเช็คเฟสก่อน***						
44	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
45	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
46	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
47	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
48	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		- -
49	KCC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
50	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
51	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- -
52	หลังจาก ยืนยันพร้อมจ่ายไฟ พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
53	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
54	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
55	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G3						
56	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G4						
57	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 22 เควี (SF6 ไทยออส ดับไฟยาวต่อเนื่อง)						
58	KCA03S-50	ปลด	สับ		กจ.		DIS อนามัยแก่งเลี่ยน (บน)
59	DIS ชค. KCA05	ปลด	สับ		กจ.		DIS ปากซอยบ้านสวนฝน
60	ย้ายโหลด KCC10 บางส่วน กลับจาก KCA10						
61	KCA05S-08	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง (ล่าง)
62	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนानบัส
63	KCA03S-09	ปลด	สับ		กจ.		DIS ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง (บน)
64	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
65	KCA05S-08	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง (ล่าง)
66	KCA03S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 บั้ม ปตท. แยกแก่งเลี่ยน
67	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
68	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
69	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
70	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
71	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		- -
72	KCC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
73	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

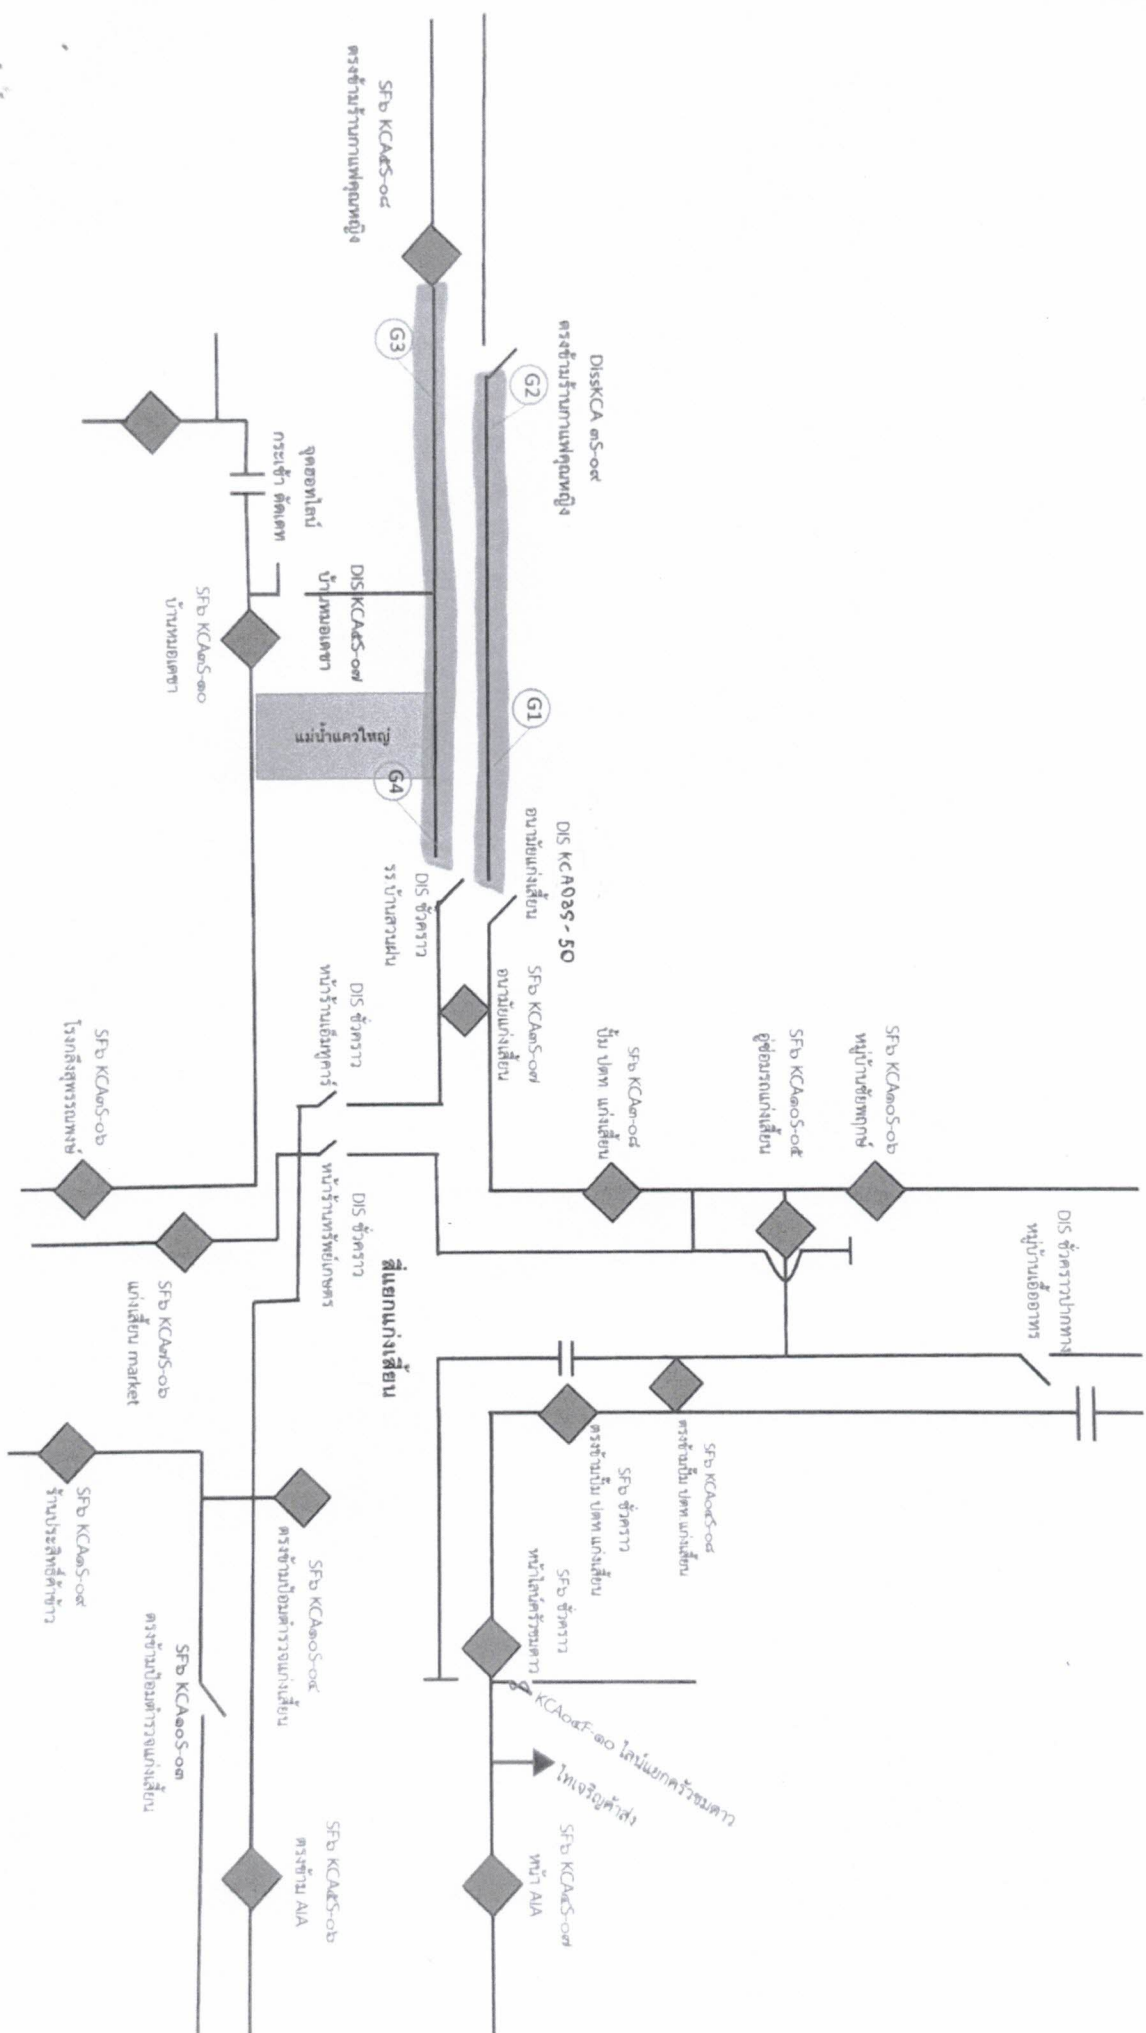

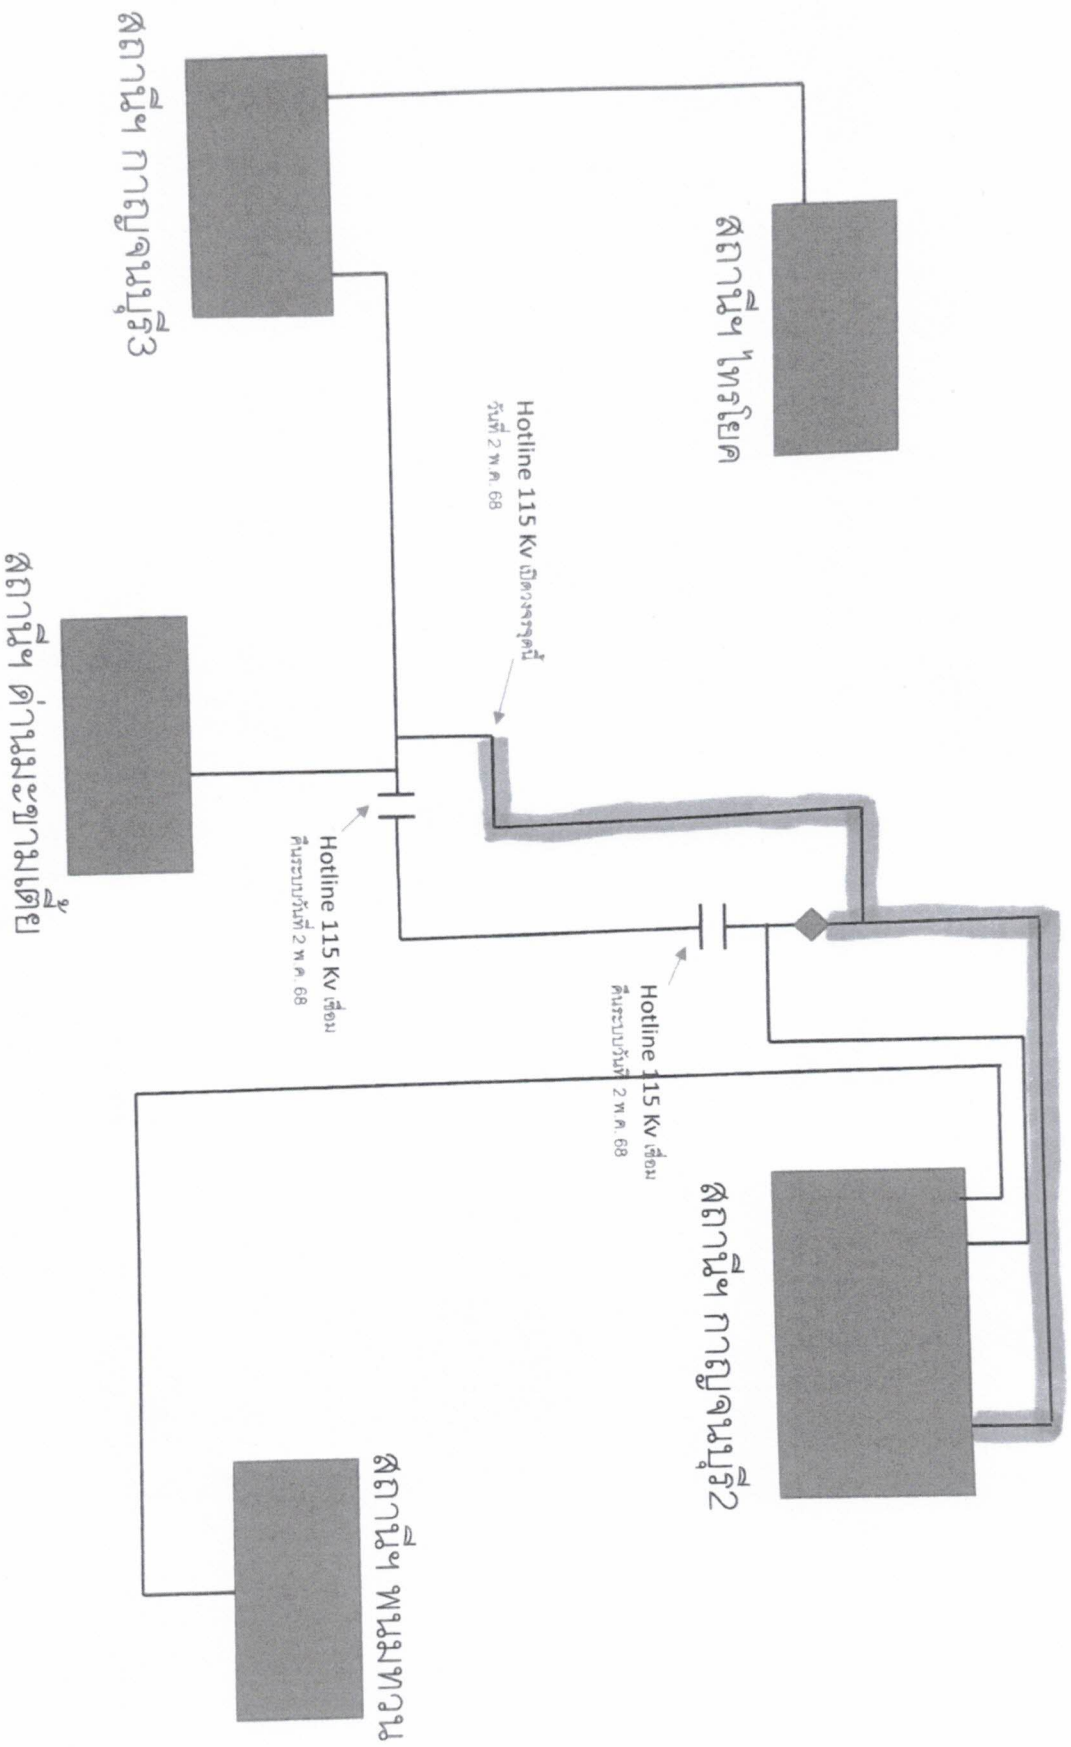

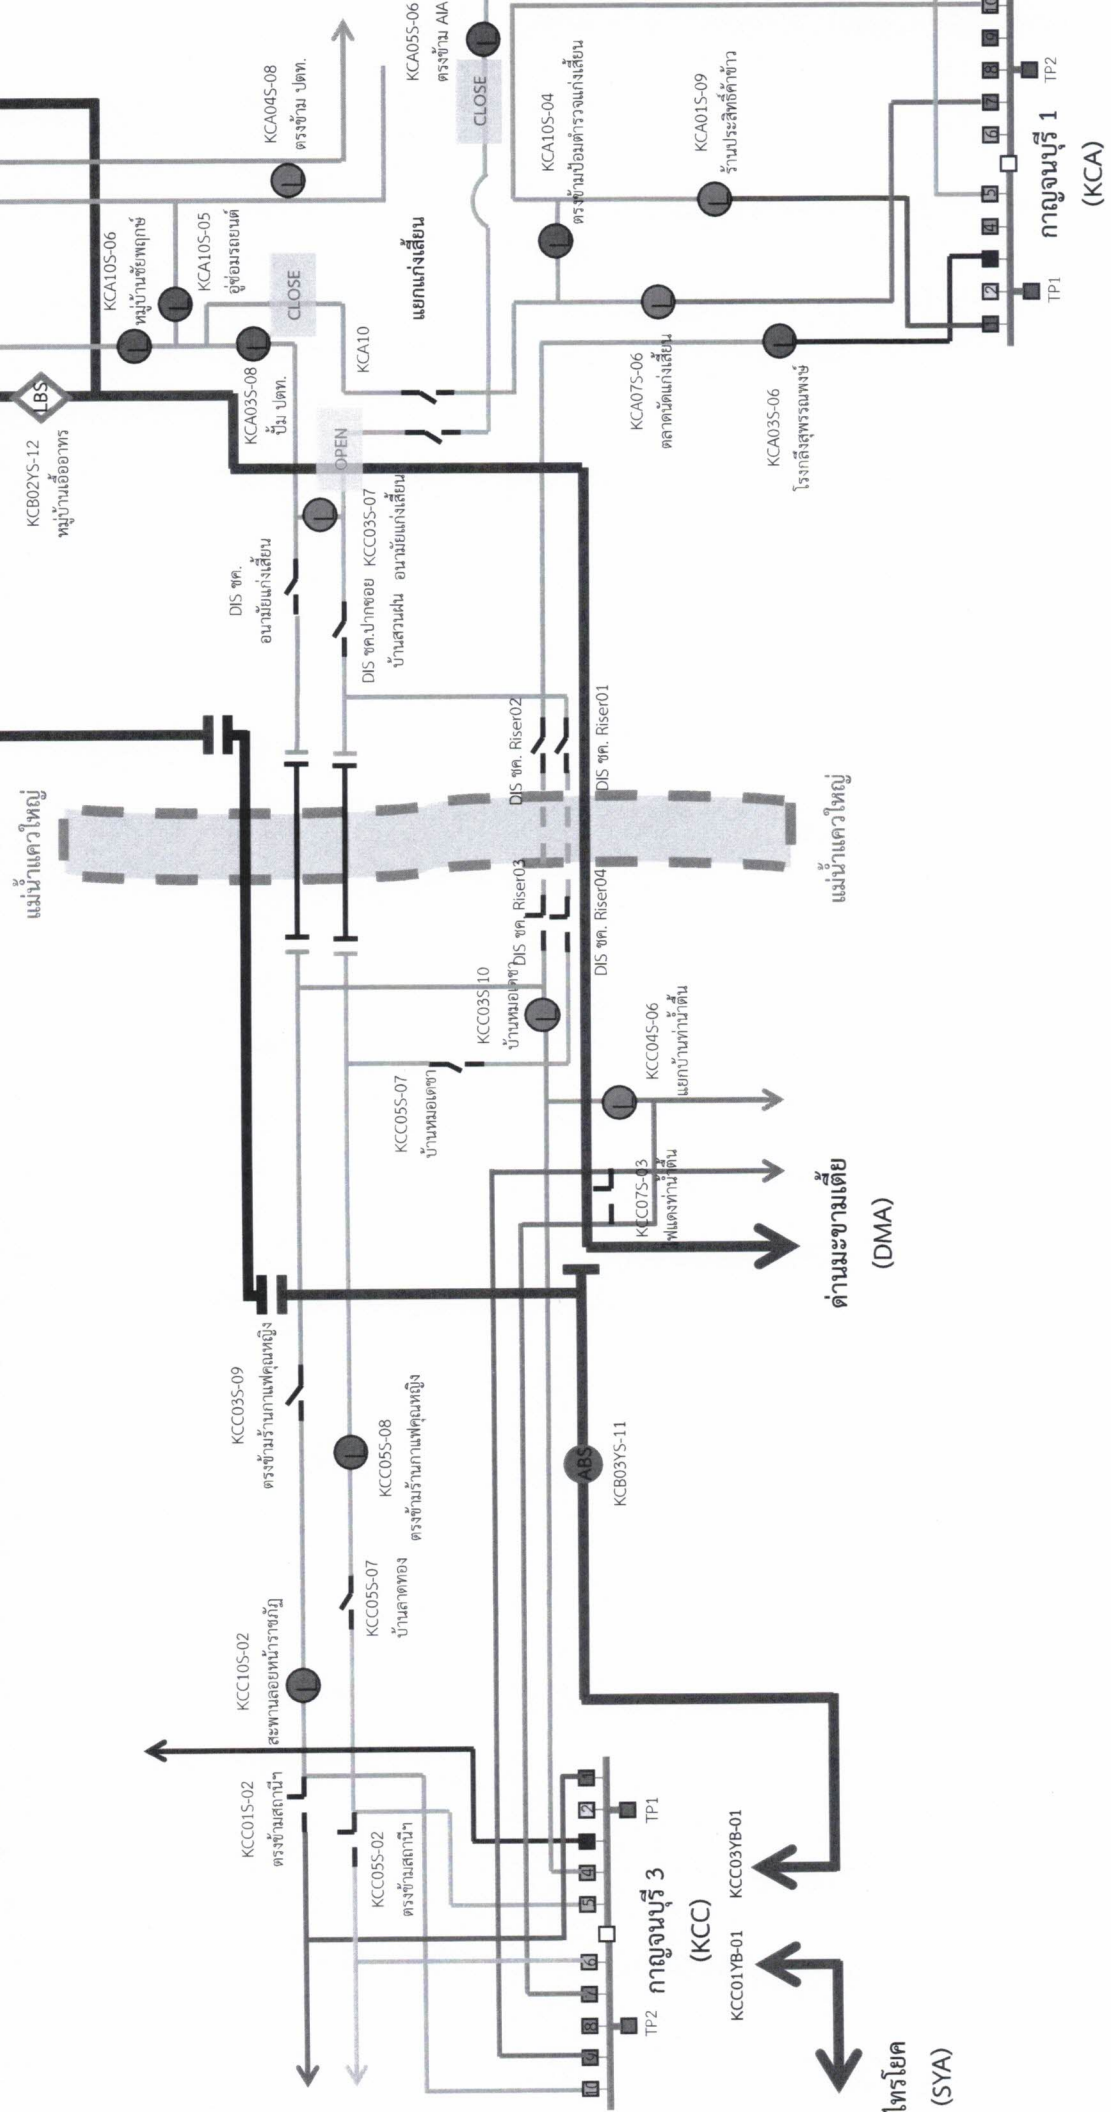

สภาพการจ่ายไฟ 22 เควี ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟแล้วเสร็จ

