



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

14 พ.ค. 68

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปน) - ๐๘๘/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมานะ วาสกร

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.ก.บ.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติงาน ผมต. และ ผปน. กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ติดตั้งมิเตอร์แรงสูง บริเวณ จุดแบ่งแดน กฟส.กทบ. กับ กฟส.สค. รีมถนนเลียบบคลองตาเคย (ฝั่งไปถนนเทพกาญจนา) สถานีไฟฟ้า กระทบแนบ 2 ตามแผนผังแนบ จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	KTB 07	18 พ.ค. 2568	8.30 น.	17.00 น.	ติดตั้งมิเตอร์แรงสูง บริเวณ จุดแบ่งแดน กฟส.กทบ. กับ กฟส.สค. รีมถนนเลียบบคลองตาเคย (ฝั่งไปถนนเทพกาญจนา)	อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTB07S-05	ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE (จุด A)	นายอนุกุล แสงเดชะ พง.7 ผมต. กฟส.กทบ. โทร. 086 - 0117981

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTB07S-05 จนถึง ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ จำนวน ๖ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชมชาติ ฐระกิจจางง ตำแหน่ง ผปน. กฟส.กทบ. โทร 086 - 5960904

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.619492, 100.302525
3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.618916, 100.302428

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

(นายมานะ วาสกร)

ตำแหน่ง ร.ก.บ.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ KTB7 จาก KTB7S-05 ถึง DDE.๐๓A
ในวันที่ 18 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 757/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ นาย อนุสรณ์ อรณประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทช.ป.บ.๓.๓ ฐระกิจจางง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓), ผจก. กฟส.กทบ., กฟส.สค.

(นางสาวศิริ อธิการศิริ)
๑๓.๕ หน้า ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|--------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตซ์ | | | | | | |
| 2 | KTB-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTB | | |
| 3 | KTB06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTB | | |
| 4 | KTB07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTB | | |
| 5 | SN-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ศูนย์กทม. | | |
| 6 | SMA08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMA | | |
| 7 | SMA10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMA | | |
| 8 | - ย้ายโหลด KTB07 ไปจ่ายไฟจาก SMA08 | | | | | | |
| 9 | KTB07S-06 | ปลด | สับ | | สค. | | SF6 ก่อนถึงศูนย์เบญจรงค์ |
| 10 | KTB06S-02 | ปลด | สับ | | กทบ. | SCADA | SF6 กม.12 (ล่าง) |
| 11 | KTB07S-05 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | กทบ. | | DIS กลางช.บ่อดกปลานายเฉย |
| 12 | KTB06S-02 | สับ | ปลด | | กทบ. | SCADA | SF6 กม.12 (ล่าง) |
| 13 | - ดับไฟ KTB07 เวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 14 | กฟส.กระทุ่มแบนแจ้งว่าจุดที่ทำการตัด DDE.ไม่มีโหลด | | | | | | |
| 15 | แจ้ง Hot Line 22 kv.ทำการตัด DDE.ไลน์ KTB07 บริเวณจุด A ออกทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 16 | หลังจาก Hot Line 22 kv.ทำการตัด DDE.ไลน์ KTB07 บริเวณจุด A ออกทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย | | | | | | |
| 17 | KTB-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | KTB | | |
| 18 | KTB06VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTB | | |
| 19 | KTB07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTB | | |
| 20 | SN-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ศูนย์กทม. | | |
| 21 | SMA08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMA | | |
| 22 | SMA10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMA | | |
| 23 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.กระทุ่มแบนรับทราบ | | | | | | |
| 24 | แจ้งกฟส.กระทุ่มแบน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 25 | แจ้งกฟส.กระทุ่มแบน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 26 | แจ้งกฟส.กระทุ่มแบนลง We Safe เสร็จเรียบร้อย | | | | | | |
| 27 | แจ้งกฟส.กระทุ่มแบนปฏิบัติงานได้ทุกชุด | | | | | | |
| | %%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%% | | | | | | |
| 28 | หลังจากกฟส.กระทุ่มแบนปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด | | | | | | |
| 29 | แจ้งกฟส.กระทุ่มแบนทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก | | | | | | |


[illegible]

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังการตัดไฟ บริเวณ ถนนเลียบคลองตาเถย (ฝั่งไปถนนเทพกาญจนา)

ตั้งแต่ อุปกรณ์ตัดออกรหัส KTB02S - 05 จนถึง ปลดจุดเชื่อมต่อสายแรงสูง หัวเสา DDE

เพื่อให้ชุดงาน ผมต. และ ผบ. กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ติดตั้งมิเตอร์แรงสูง บริเวณ จุดแบ่งแดน กฟส.กทบ. กับ กฟส.สค.

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

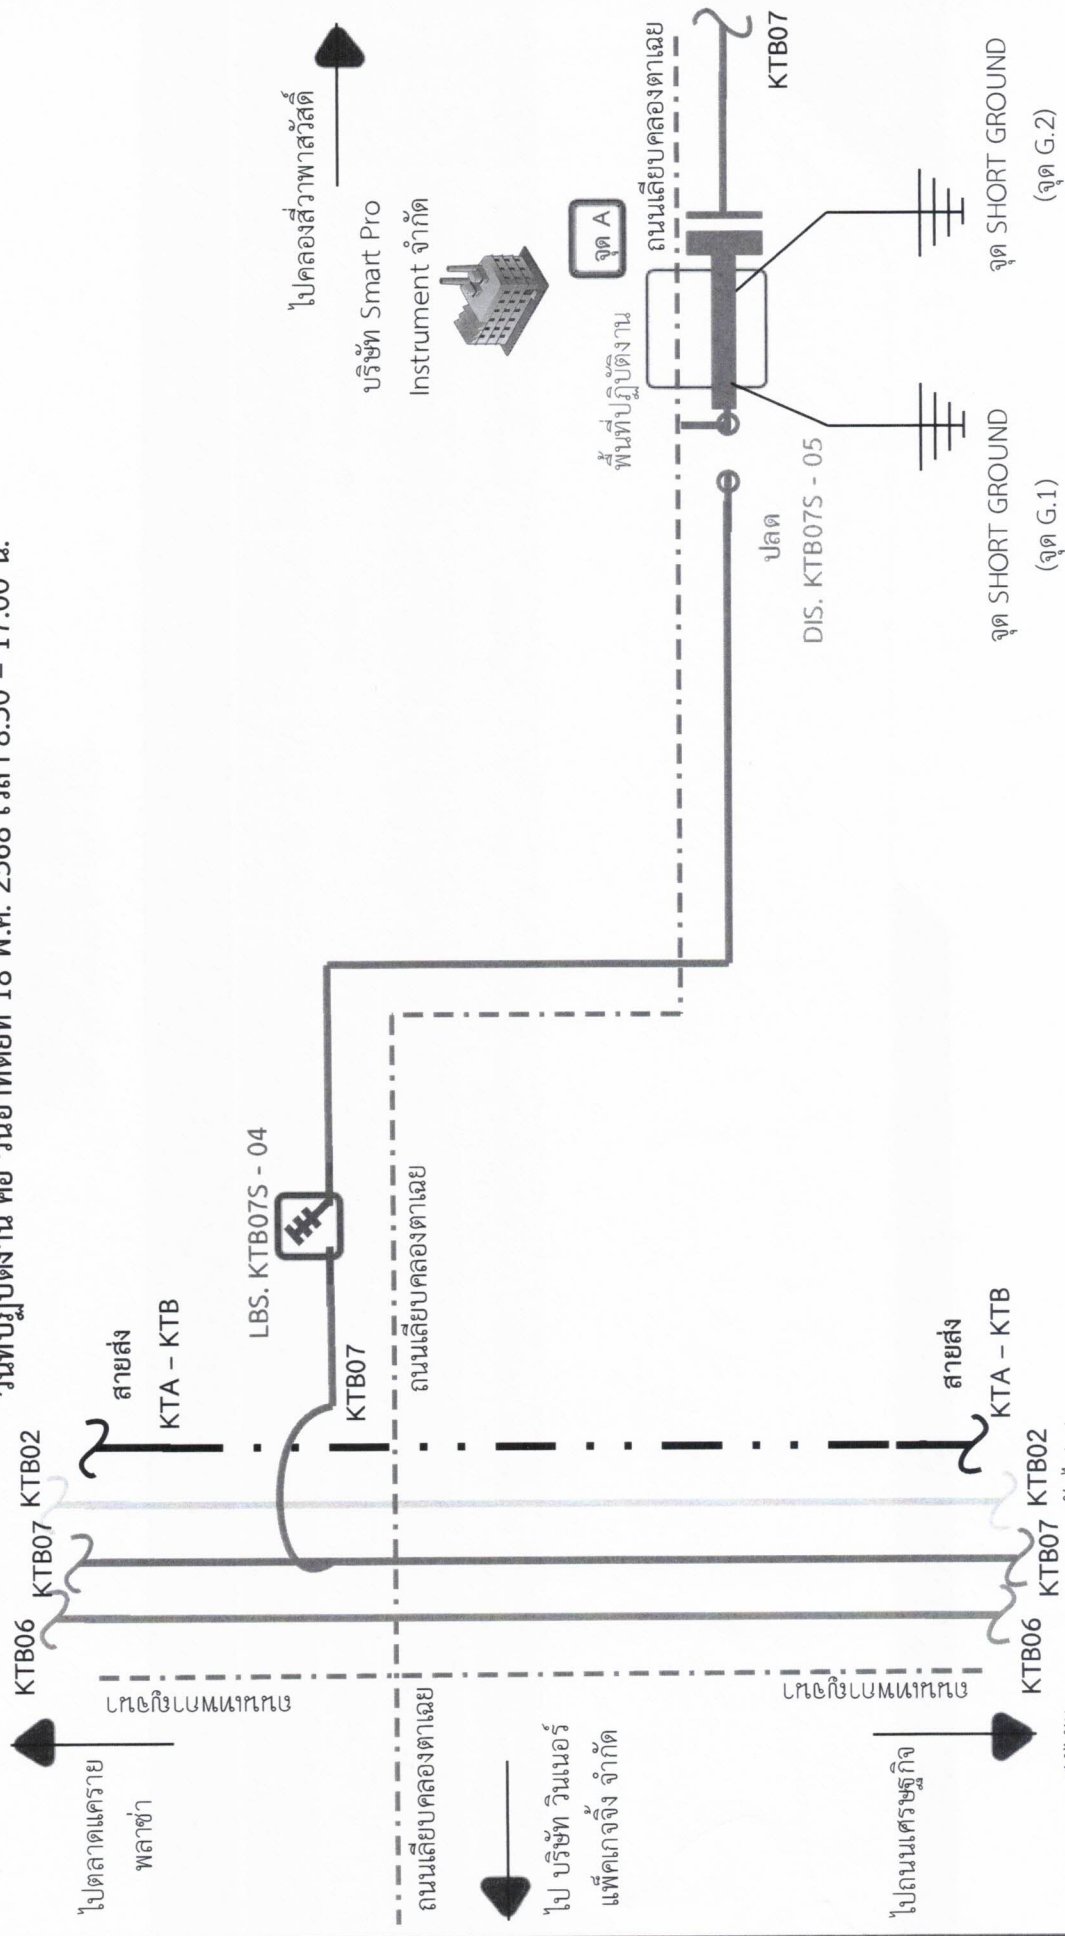


หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ ประมาณ - ราย

พื้นที่ตัดไฟ

รายละเอียดรูปภาพประกอบคำอธิบายพื้นที่ หลักการดับไฟ บริเวณ ถนนเลียบคลองตาเฉย (ฝั่งไปถนนเทพกาญจนา)
ตั้งแต่ อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTB02S - 05 จนถึง ปลดจุดเชื่อมต่อสายแรงสูง หัวเสา DDE
เพื่อให้ชุดงาน ผมต. และ ผบ. กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ติดตั้งมีเตอร์แรงสูง บริเวณ จุดแบ่งแดน กฟส.กทบ. กับ กฟส.สค.
วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.


จุด A

ให้ชุดปฏิบัติงานฮอตไลน์ปลด
จุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ที่หัวเสา DDE
วงจร KTB07

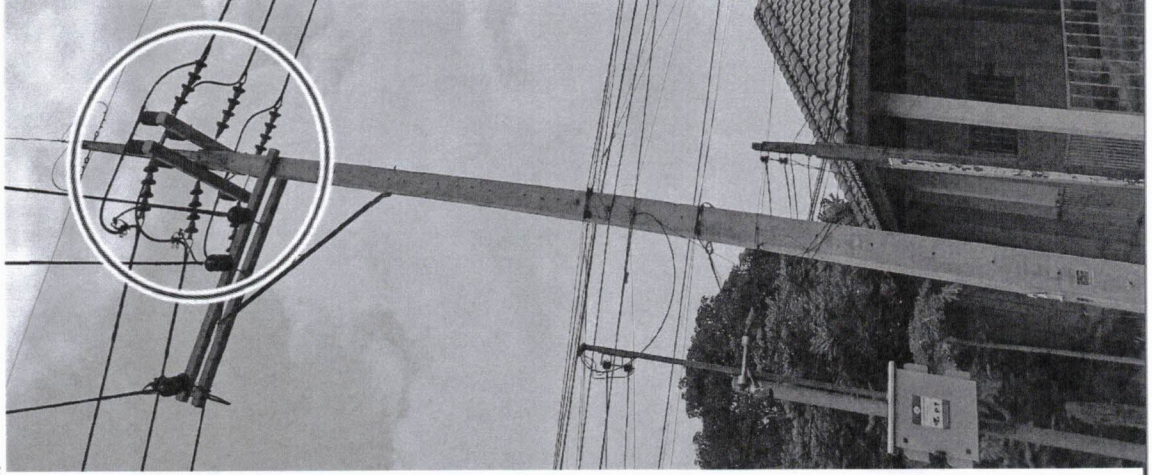

ตั้งแต่ ๐๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

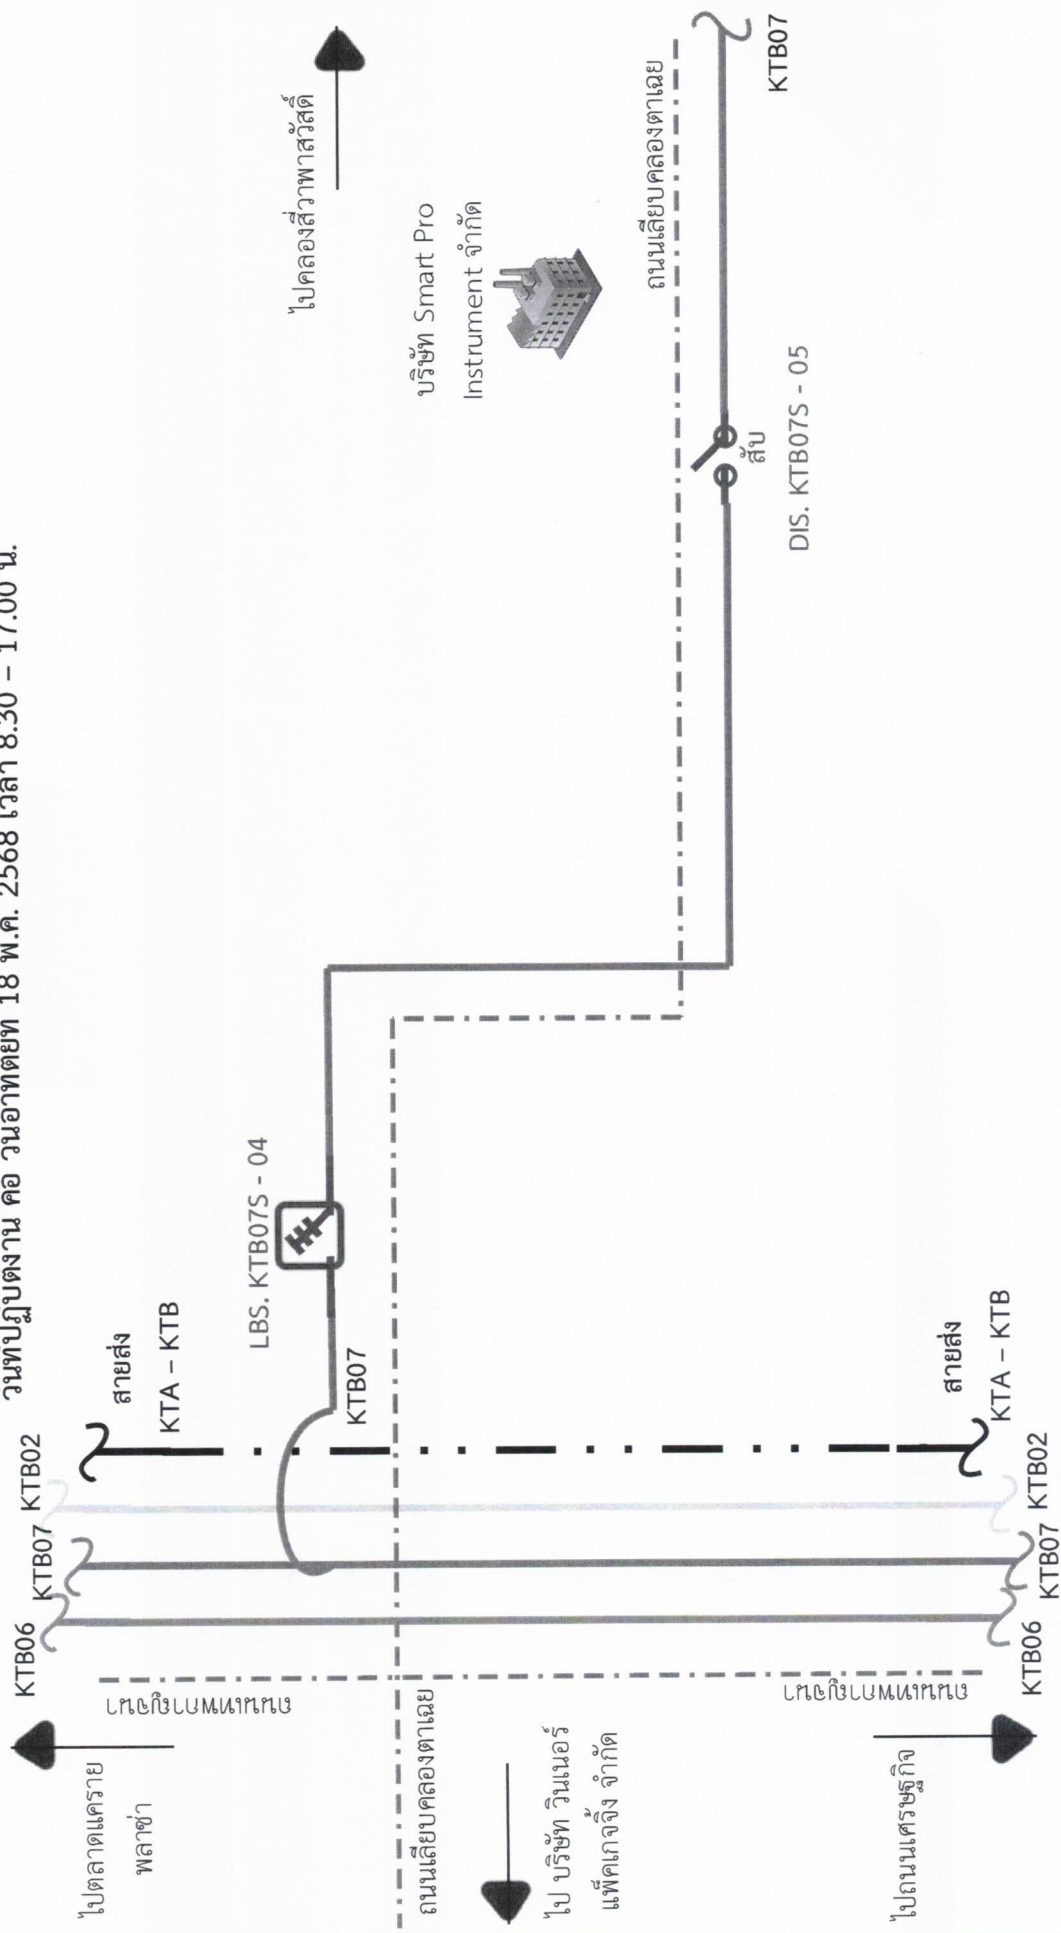

หมายเหตุ ผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ - ราย
