



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปป) ๕๐๐ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิดเส็ง
จำนวนเอกสารแนบ ๓ แผ่น

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า สาขาบ่อพลอย ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนย้ายแนวเสาแรงสูงขนาด ๑๒ เมตร
ในไลน์เมน บ้านห้วยผาก ม.๓ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๒

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒ ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๑ สถานี บ่อพลอย ๒	๒๕ พ.ค. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ตัดสายแรงสูง เพื่อรื้อถอน แนวเสาแรงสูง ๑๒ เมตร ในไลน์เมน	DIS ชั่วคราว ใกล้สะพาน ช่าง อ้อมอ่างเก็บน้ำ ห้วยป่าไร่	SF๖ บ้านปลัก ประดู่ BOU๐๑S-๐๘	นายวิษณุ มีผล พชง.๖(ปป) โทร.๐๘๒- ๒๔๒๔๖๘๙

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเนตร พูลพจน์ ตำแหน่ง พชง.๗ (สข) โทร.๐๘๔-๒๕๖๘๔๒๕

ผู้ประสานงานหน่วยงาน ชื่อ นายวิษณุ มีผล ตำแหน่ง พชง.๖ (ปป) โทร.๐๘๒-๒๔๒๔๖๘๙

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบ
ก่อนปฏิบัติงาน)

☒ ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด (๑.๒)ไม่มีโอกาสชำรุด

☐ ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายพิชา ตันยิดเส็ง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บ่อพลอย

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOU1 จาก Dis.หัวดราว BOU1 ถึง BOU1S-08
ในวันที่ 29 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 809/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ อรรถพรสิทธิ์ ประสานงานขอดับไฟกับ นายวิมล มีผล


(นายอภิสิทธิ์ อรรถพรสิทธิ์)
๐๐๓.๕ นทว. นท.๐๗.

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๐๗๔, กฟภ.๐๗๕.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนทำสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ ..)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไปจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)


หน้าที 1 จาก 1

ใบสั่งทำ Switching


- | | | | | |
|----------------------------|--|----------|--|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ (BOU01) | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 25 พ.ค. 68 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง 12.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.บพล. | งานที่ทำ | ตัดสายแรงสูง เพื่อรื้อถอนเสาตามใบขอปฏิบัติงาน 809/2568 | |
| 4. เตรียมการ Switching โดย | นายศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์ | | | วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบ Switching โดย |  | | | วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 |
| 6. อนุมัติ Switching โดย |  | | | วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 |
| 7. สั่งทำ Switching โดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายโนช
2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต
3. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching							
2	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		CB	BOU01
3	เมื่อพร้อมดับไฟ							
4	Dis.ไลน์ BOU01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หปร.		DIS	ชั่วคราว ใกล้เคียงงานช่วงอ้อมอ่างเก็บน้ำ
5	D/F ไลน์ BOU01	สับ	ปลด		หปร.		D/F	ไลน์แยกหนองตาเดช
6	ตรวจสอบ SF6 รหัส BOU01S-08 (บ้านปลักประตู) อยู่สถานะ OPEN พร้อมให้ LOCK คาน							
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
8	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1							
9	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2							
10	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย							
11	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		CB	BOU01
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้							
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
13	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
14	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1							
15	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2							
16	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย							
17	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		CB	BOU01
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
19	Dis.ไลน์ BOU01	ปลด	สับ		หปร.		DIS	ชั่วคราว ใกล้เคียงงาน ช่วงอ้อมอ่างเก็บน้ำ
20	D/F ไลน์ BOU01	ปลด	สับ		หปร.		D/F	ไลน์แยกหนองตาเดช
21	ปลด LOCK คาน SF6 รหัส BOU01S-08 (บ้านปลักประตู)							
22	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		CB	BOU01
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

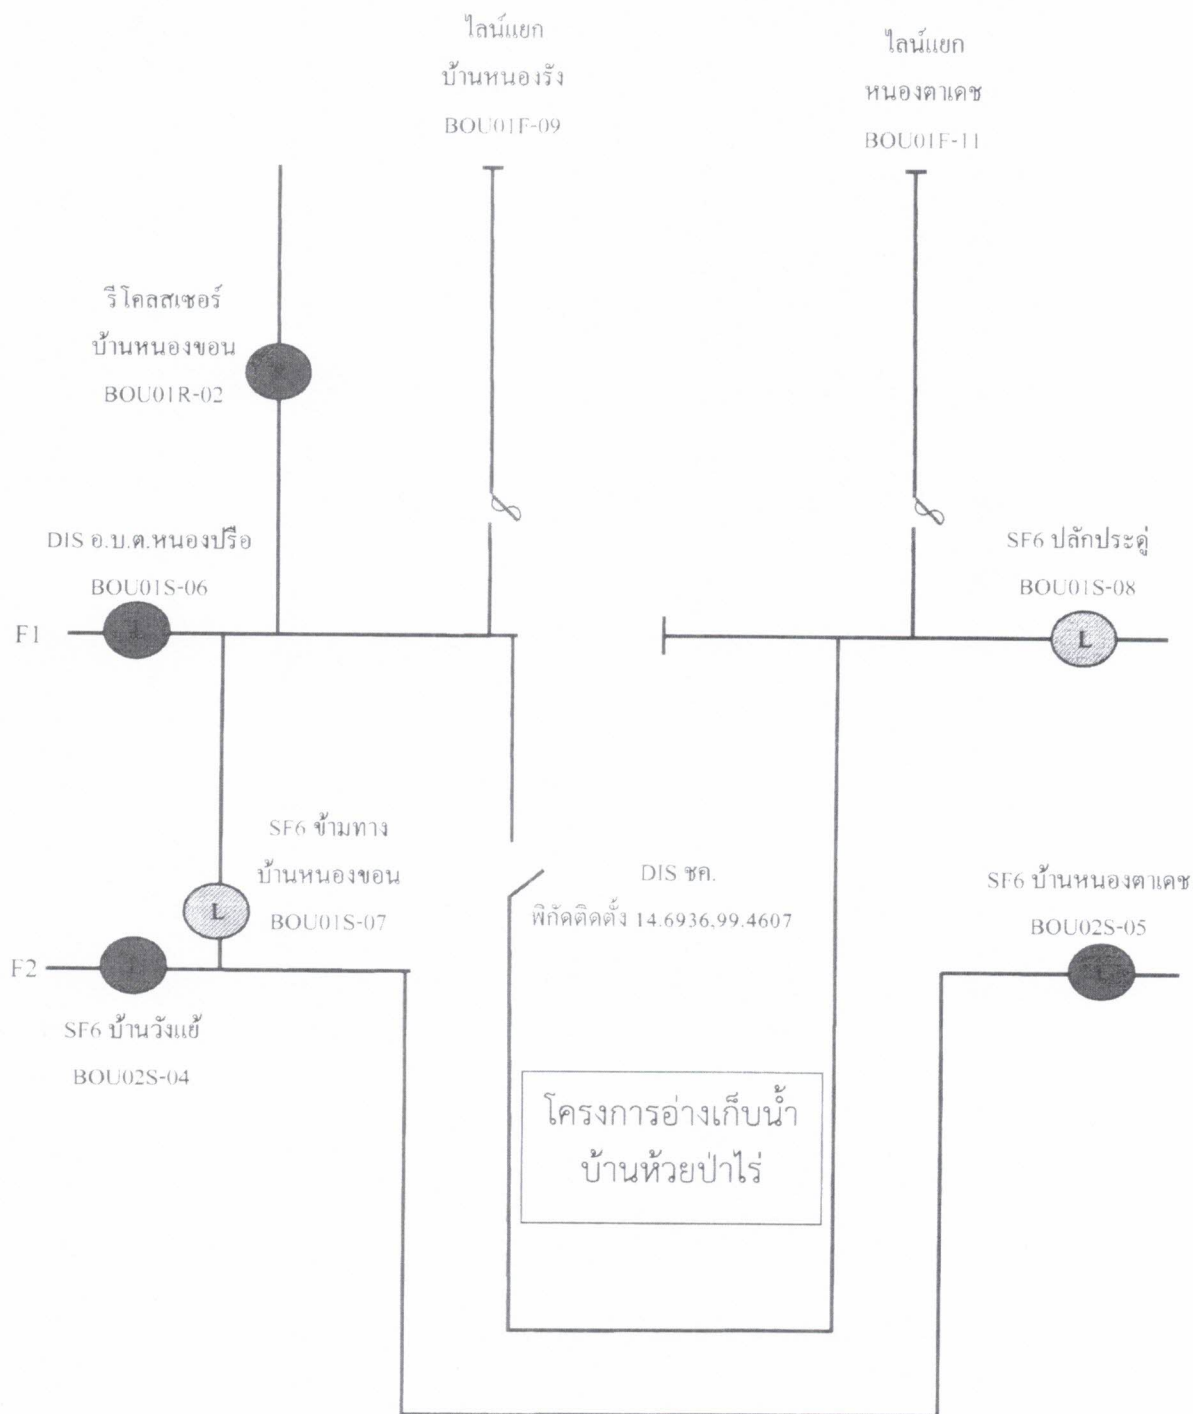

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

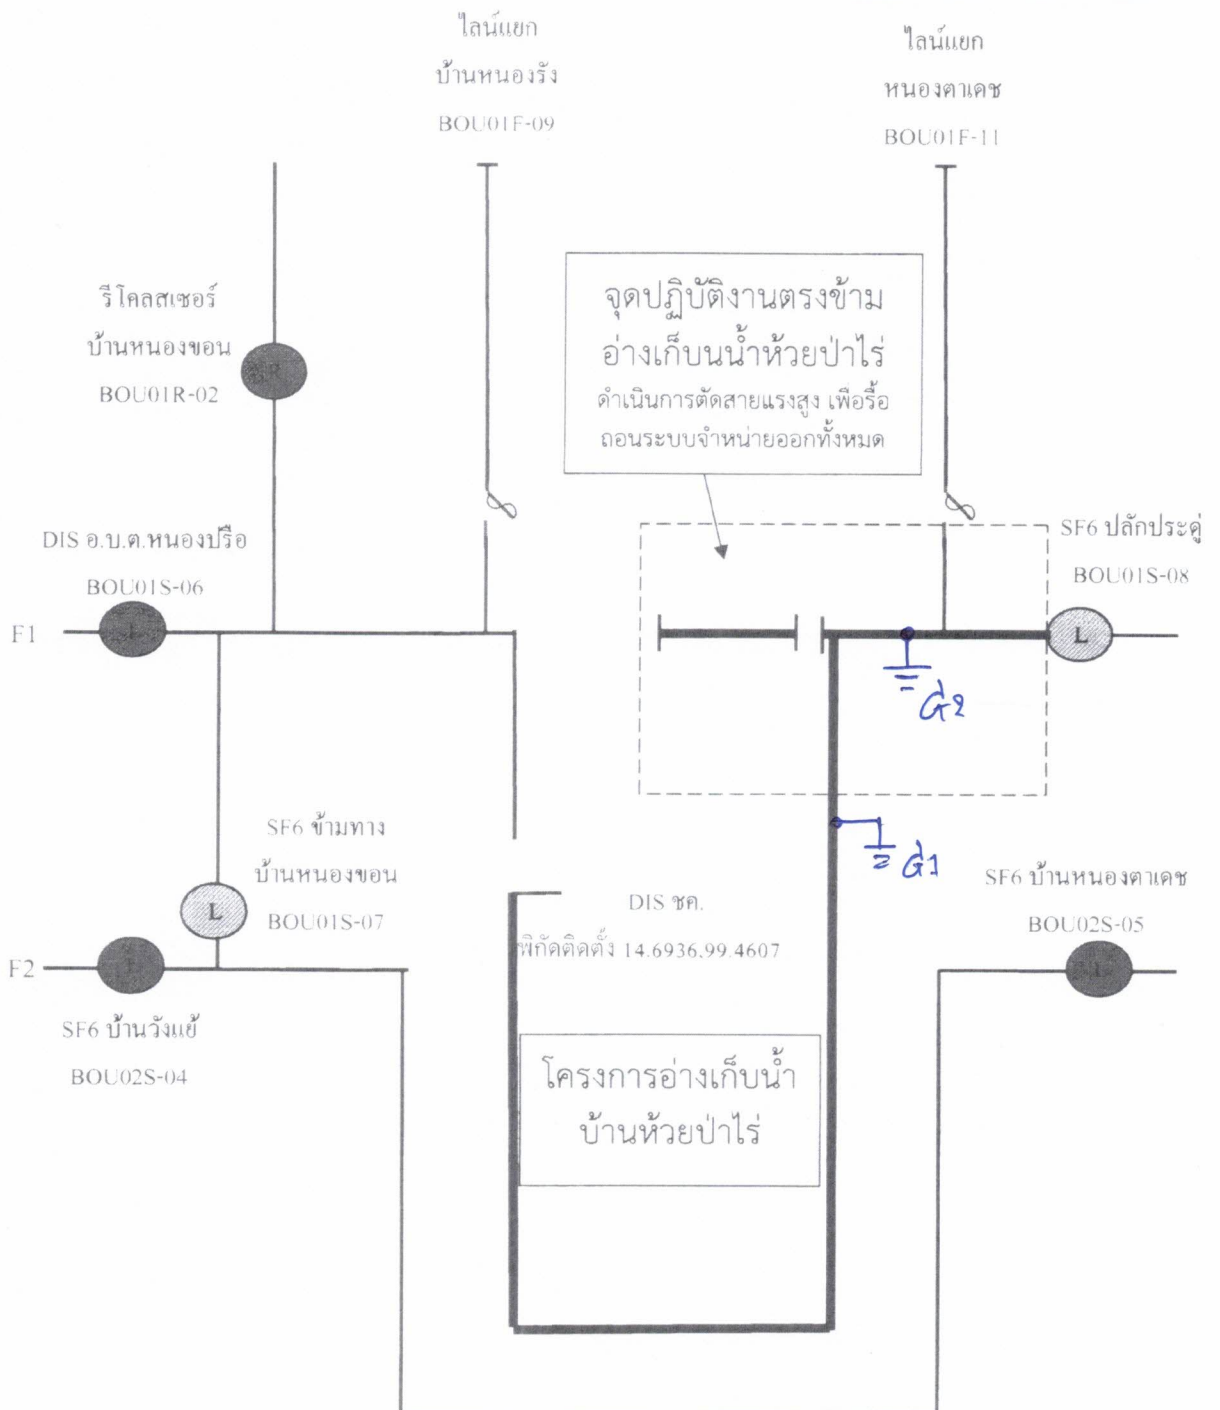

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

