



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 พ.ค. 68

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปน) - ๐๘๘/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมานะ วาสกรี

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติงาน ผบ. และ ผกส. กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 (ทิศทางไปอำเภอเมืองสมุทรสาคร) ตั้งแต่ ปากซอยสวนหลวง ซอย 34 จนถึง สามแยกกระทู้แบน สถานีไฟฟ้า กระทู้แบน 1 ตามแผนผังแนบ จำนวน 8 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง KTE- บริษัท T.T.W. - ONE	25 พ.ค. 2568	8.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนน เศรษฐกิจ 1 (ทิศทาง ไปอำเภอเมือง สมุทรสาคร) ตั้งแต่ ปากซอยสวนหลวง ซอย 34 จนถึง สาม แยกกระทู้แบน	ปลัดสายส่ง ที่จุดแท็บแยกสายส่ง (ฝั่งไป บริษัท T.T.W.) ที่เสาไฟ หัว เสา SD - TL - 3 ต้นที่ 80 (จุด A)	อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTD02YS-05 และ อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTD02YS-06	นายฤชณะ ชนะภัย พงษ.6 ผบ. กฟส.กทบ. โทร. 098 - 8315274
2.	KTA 01					ปลัดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE วงจรบน (จุด B)	อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTA01S-05 - ปลัดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE วงจรบน (จุด C)	
3.	KTA 03					อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTA03S-03	ปลัดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE วงจรล่าง (จุด D)	
4.	KTA 06					อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTA06S-03	อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTA06S-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ ปากซอยสวนหลวง ซอย 34 จนถึง สามแยกกระทู้แบน มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ จำนวน 1,017 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ผบ.ปน. กฟส.กทบ. โทร. 087-6715626

1. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.653274, 100.273508
3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.662181, 100.274599

dm

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปน.(ก๓)

(.....นายมานะ วาสกรี.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

ในวันที่ 25 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 827/68

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

ในวันที่ 25 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา ๙ น. ถึง ๙ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๘๒๗/๖๘

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ วงศ์ ประสานงานการดับไฟกับ

อนุวัตร

(นายอนุวัตร ธาราภรณ์)

๐๙-๕ ๓๖๖ ๙๙.๐๙

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น

แผนผังแนบ 8 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓), ผจก.

กฟส. กทบ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปน.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก๓)

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง | | | | | | |
| 2 | SAA-KT5A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SAA | | โหลด 2.6 MW |
| 3 | SAA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAA | | โหลด 0.0 MW |
| 4 | SAA-KT6A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SAA | | โหลด 14.0 MW |
| 5 | SAA10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAA | | โหลด 1.8 MW |
| 6 | KTA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTA | | โหลด 14.5 MW |
| 7 | KTA01VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTA | | โหลด 2.6 MW |
| 8 | KTA03VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTA | | โหลด 3.5 MW |
| 9 | KTA-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTA | | โหลด 9.9 MW |
| 10 | KTA06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTA | | โหลด 1.5 MW |
| 11 | KTD04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTD | | CB 115kV |
| 12 | KTA03YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTA | | CB 115kV |
| 13 | ONE04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONE | | CB 115kV |
| 14 | - ย้ายโหลด KTA03 บางส่วนไปจ่ายจาก SAA02 และ KTA01 บางส่วนไปจ่ายจาก SAA10 | | | | | | |
| 15 | SAA0BVB-01 | ปลด | ล๊ับ | | SAA | | CB ขนานเมนบัส |
| 16 | KTA01S-08 | ปลด | ล๊ับ | | กทบ. | | SF6 ขอย วปอ.11 |
| 17 | KTA03S-05 | ปลด | ล๊ับ | | กทบ. | SCADA | SF6 ขอยร่วมใจ |
| 18 | KTA03S-03 | ล๊ับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | กทบ. | | DIS หน้าร้านทรงชัย |
| 19 | KTA01S-05 | ล๊ับ | ปลด,ล๊อคคาน | | กทบ. | | SF6 โกบอลเข้าที่ |
| 20 | SAA0BVB-01 | ล๊ับ | ปลด | | SAA | | CB ขนานเมนบัส |
| 21 | ตรวจสอบ KTA06S-04 SF6 ผ้ำขนหนู อยู่สถานะ OPEN และล๊อคคาน | | | | | | |
| 22 | ตรวจสอบ KTA06S-05 SF6 ปากขอยสวนหลวง อยู่สถานะ OPEN และล๊อคคาน | | | | | | |
| 23 | - OPENLOOP (KTA03YB-01) | | | | | | |
| 24 | ตรวจสอบ SAA01YB-01 และ SAA03YB-01 อยู่สถานะ CLOSE LOOP ปกติ | | | | | | |
| 25 | KTA03YB-01 | ล๊ับ | ปลด | | KTA | | CB 115kV |
| 26 | - ดับไฟเวลา 08.30 น. 115kV | | | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ตรวจสอบ KTE04YB-01 อยู่สถานะ OPEN						
28	KTD04YS-06	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		กทบ.		ABS
29	- ตรวจสอบ บ.ประปาไทย ปลดโหลดภายในเรียบร้อย						
30	KTD04YS-05	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		กทบ.		ABS
31	KTD04YS-07	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		กทบ.		ABS
32	แจ้ง HOTLINE 115kV ดำเนินการปลดDDE A(115kV) ผังไป บ.ประปาไทยออกทั้งสามเฟส **แบบไม่มีไฟ**						
33	หลังจาก HOTLINE 115kV ดำเนินการปลดDDE A(115kV) ผังไป บ.ประปาไทยออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
34	ตรวจสอบกฟส.กทบ และบ.ประปาไทย พร้อมรับไฟ ไปชนDDE A(115kV) ที่เปิดไว้						
35	KTD04YS-08	ปลด	สับ		กทบ.		ABS
36	KTD04YS-07	ปลด	สับ		กทบ.		ABS
37	- ดับไฟเวลา 08.30 น. 22kV						
38	KTA06S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS
39	แจ้งกฟส.กทบ.ดำเนินการไลน์โหลดก่อนปลด DDE ทุกจุด						
40	แจ้ง HOTLINEดำเนินการปลดDDE จุด B(KTA01) ออกทั้งสามเฟส						
41	หลังจาก HOTLINEดำเนินการปลดDDE จุด B(KTA01) ออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
42	แจ้ง HOTLINEดำเนินการปลดDDE จุด C(KTA01) ออกทั้งสามเฟส						
43	หลังจาก HOTLINEดำเนินการปลดDDE จุด C(KTA01) ออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
44	แจ้ง HOTLINEดำเนินการปลดDDE จุด D(KTA03) ออกทั้งสามเฟส						
45	หลังจาก HOTLINEดำเนินการปลดDDE จุด D(KTA03) ออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
46	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.กทบ.รับทราบ						
47	แจ้งชุดทำงานเทสไฟ พร้อมช็อตกราวด์จุด G2						
48	แจ้งชุดทำงานเทสไฟ พร้อมช็อตกราวด์จุด G3						
49	แจ้งชุดทำงานเทสไฟ พร้อมช็อตกราวด์จุด G4						
50	แจ้งชุดทำงานเทสไฟ พร้อมช็อตกราวด์จุด G5						
51	แจ้งชุดทำงานเทสไฟ พร้อมช็อตกราวด์จุด G6						
52	แจ้งชุดทำงานเทสไฟ พร้อมช็อตกราวด์จุด G7						
53	แจ้งชุดทำงานเทสไฟ พร้อมช็อตกราวด์จุด G1 (115kV)						
54	แจ้งชุดทำงานเทสไฟ พร้อมช็อตกราวด์จุด G8 (115kV)						
55	แจ้งกฟส.กทบ.ทำการลง WE SAFE ปฏิบัติงานได้						
56	SAA-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAA		
57	SAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
58	SAA-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAA		
59	SAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
60	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
61	KTA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
62	KTA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
63	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
64	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		CB
65	ONE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		CB
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	หลังจากปฏิบัติเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
67	แจ้งชุดทำงานปลดช็อตกราวด์จุด G2						
68	แจ้งชุดทำงานปลดช็อตกราวด์จุด G3						
69	แจ้งชุดทำงานปลดช็อตกราวด์จุด G4						
70	แจ้งชุดทำงานปลดช็อตกราวด์จุด G5						
71	แจ้งชุดทำงานปลดช็อตกราวด์จุด G6						
72	แจ้งชุดทำงานปลดช็อตกราวด์จุด G7						
73	แจ้งชุดทำงานปลดช็อตกราวด์จุด G1 (115kV)						
74	แจ้งชุดทำงานปลดช็อตกราวด์จุด G8 (115kV)						
75	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง						
76	SAA-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAA		
77	SAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
78	SAA-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAA		
79	SAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
80	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
81	KTA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
82	KTA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
83	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
84	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		CB 115kV
85	ONE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		CB 115kV
86	- ดับไฟเวลา 115kV (บ.ประปาไทย)เพื่อทำการเชื่อม DDEจุดA						
87	- ตรวจสอบ บ.ประปาไทย ปลดโหลดภายในเรียบร้อย						
88	KTD04YS-08	สับ	ปลด ล็อคคกุญแจ		กทบ.		ABS ร้านอาหารครัวต้นกล้วย
89	KTD04YS-07	สับ	ปลด ล็อคคกุญแจ		กทบ.		ABS บ.ประปาไทย
90	แจ้ง HOTLINE 115kV ดำเนินการเชื่อมDDEจุด A(115kV) ฝั่งไป บ.ประปาไทยเข้าทั้งสามเฟส **แบบไม่มีไฟ**						
91	หลังจาก HOTLINE 115kV ดำเนินการเชื่อมDDEจุด A(115kV) ฝั่งไป บ.ประปาไทยเข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
92	- จ่ายไฟ 115kV						
93	ตรวจสอบกฟส.กทบ และบ.ประปาไทย พร้อมรับไฟ						
94	KTD04YS-05	ปลด	สับ		กทบ.		ABS ร่มสีทอง
95	KTD04YS-07	ปลด	สับ		กทบ.		ABS บ.ประปาไทย
96	KTD04YS-06	ปลด	สับ		กทบ.		ABS เน้อย่างเอเชีย
97	- CLOSE LOOP (KTA03YB-01)						
98	KTA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		CB 115kV
99	- จ่ายไฟ 22kV						
100	แจ้ง HOTLINEดำเนินการเชื่อมDDE จุด B(KTA01) เข้าทั้งสามเฟส						
101	หลังจาก HOTLINEดำเนินการเชื่อมDDE จุด B(KTA01) เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
102	แจ้ง HOTLINEดำเนินการเชื่อมDDE จุด C(KTA01) เข้าทั้งสามเฟส						
103	หลังจาก HOTLINEดำเนินการเชื่อมDDE จุด C(KTA01) เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
104	แจ้ง HOTLINEดำเนินการเชื่อมDDE จุด D(KTA03) เข้าทั้งสามเฟส						
105	หลังจาก HOTLINEดำเนินการเชื่อมDDE จุด D(KTA03) เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						

[illegible]


เพื่อให้ชุดงาน ผปบ. และ ผกส. กพท. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 (ทิศทางไปอำเภอเมืองสมุทรสาคร) วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 2568 แยกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 08.00 – 09.00 น. และ ช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น.



แผนผังสถานะปัจจุบัน ช่วงระหว่างการดับไฟเพื่อตัดสายส่ง 115 kV. ที่จุดแยกสาย ตั้งแต่ ปากซอยสวนหลวง ซอย 34 จนถึง สามแยกกระทู้แบบ

เพื่อให้ชุดงาน ผบ. และ ผกส. กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนนครราชสีมา 1 (ทิศทางไปอำเภอเมืองสมุทรสาคร)


วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ค. 2568 แยกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 08.00 – 09.00 น. และ ช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น.

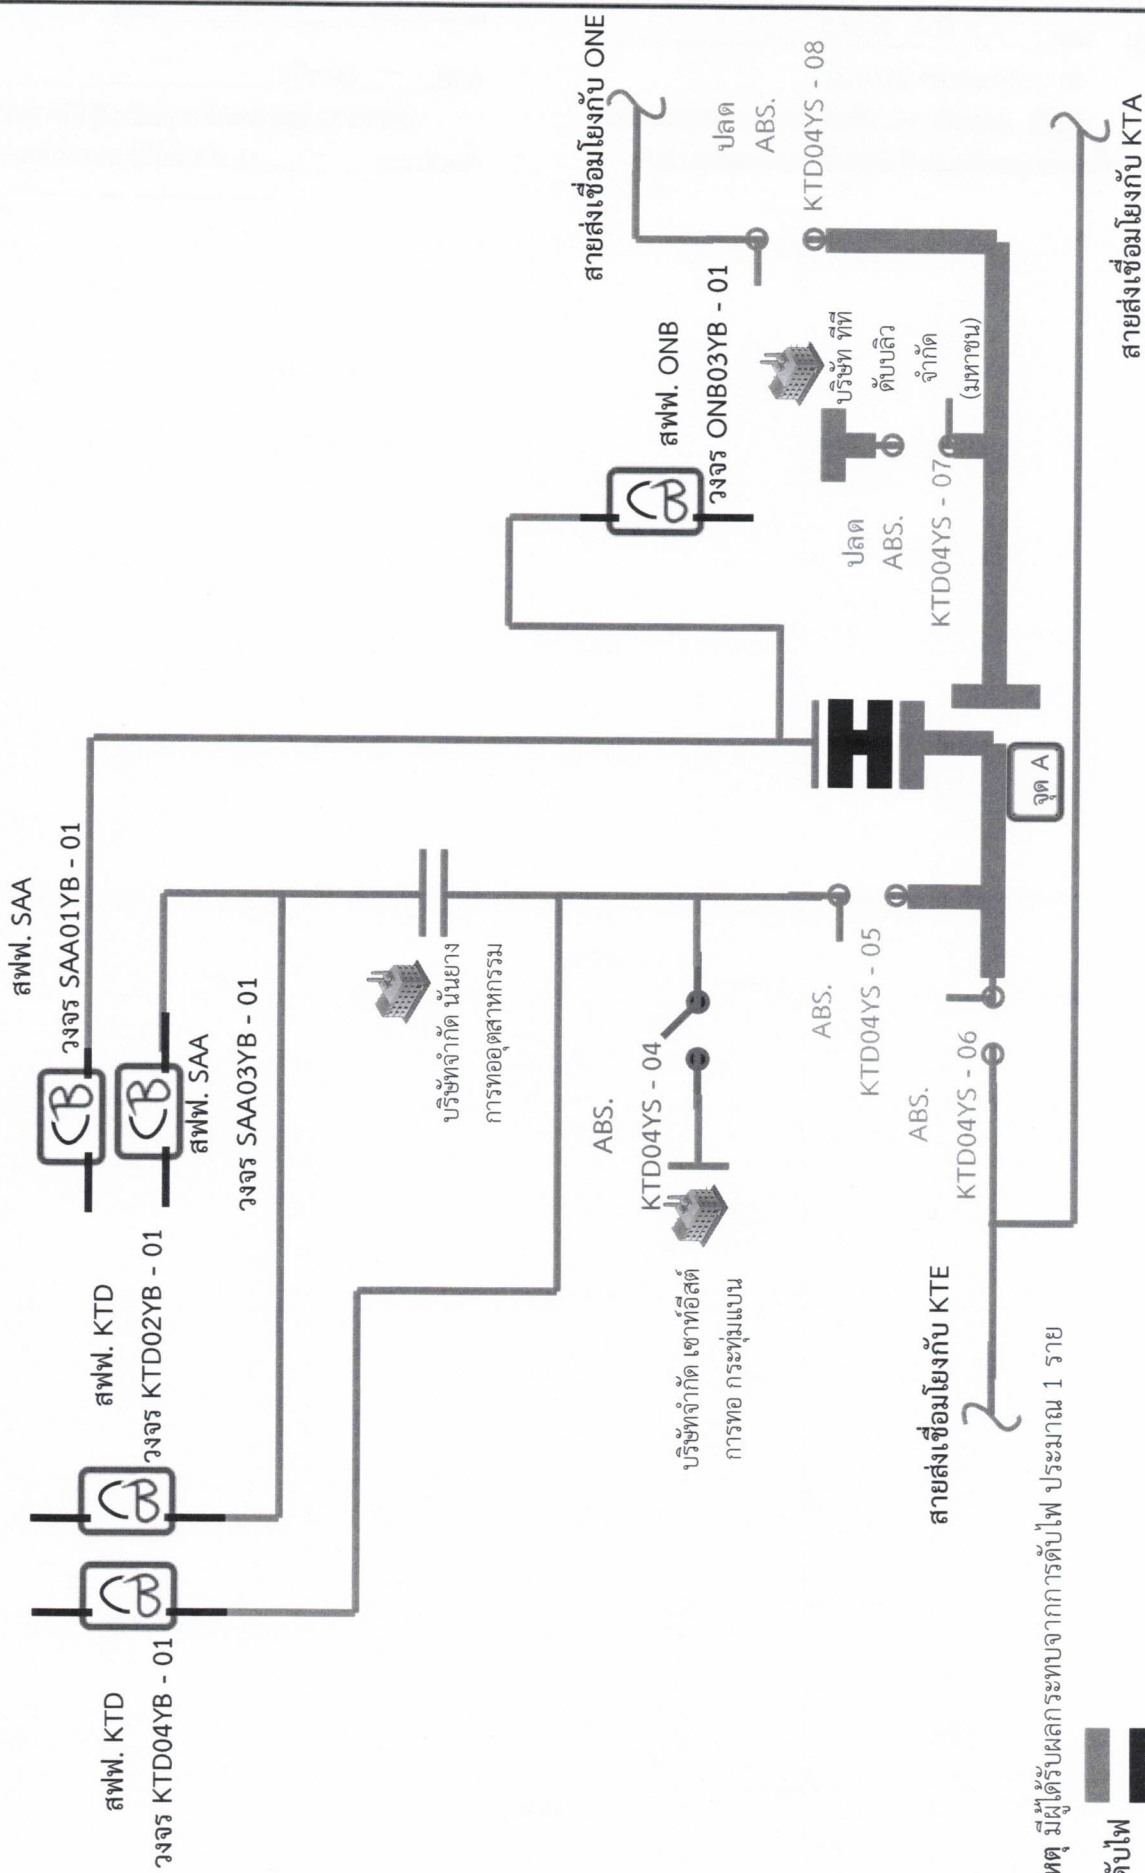

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 1 ราย


พื้นที่ดับไฟ

เพื่อให้ชุดงาน ผบ. และ ผกส. กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนแอมเอมืองสมุทรสาคร) วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 2568 แยกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 08.00 – 09.00 น. และ ช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น.

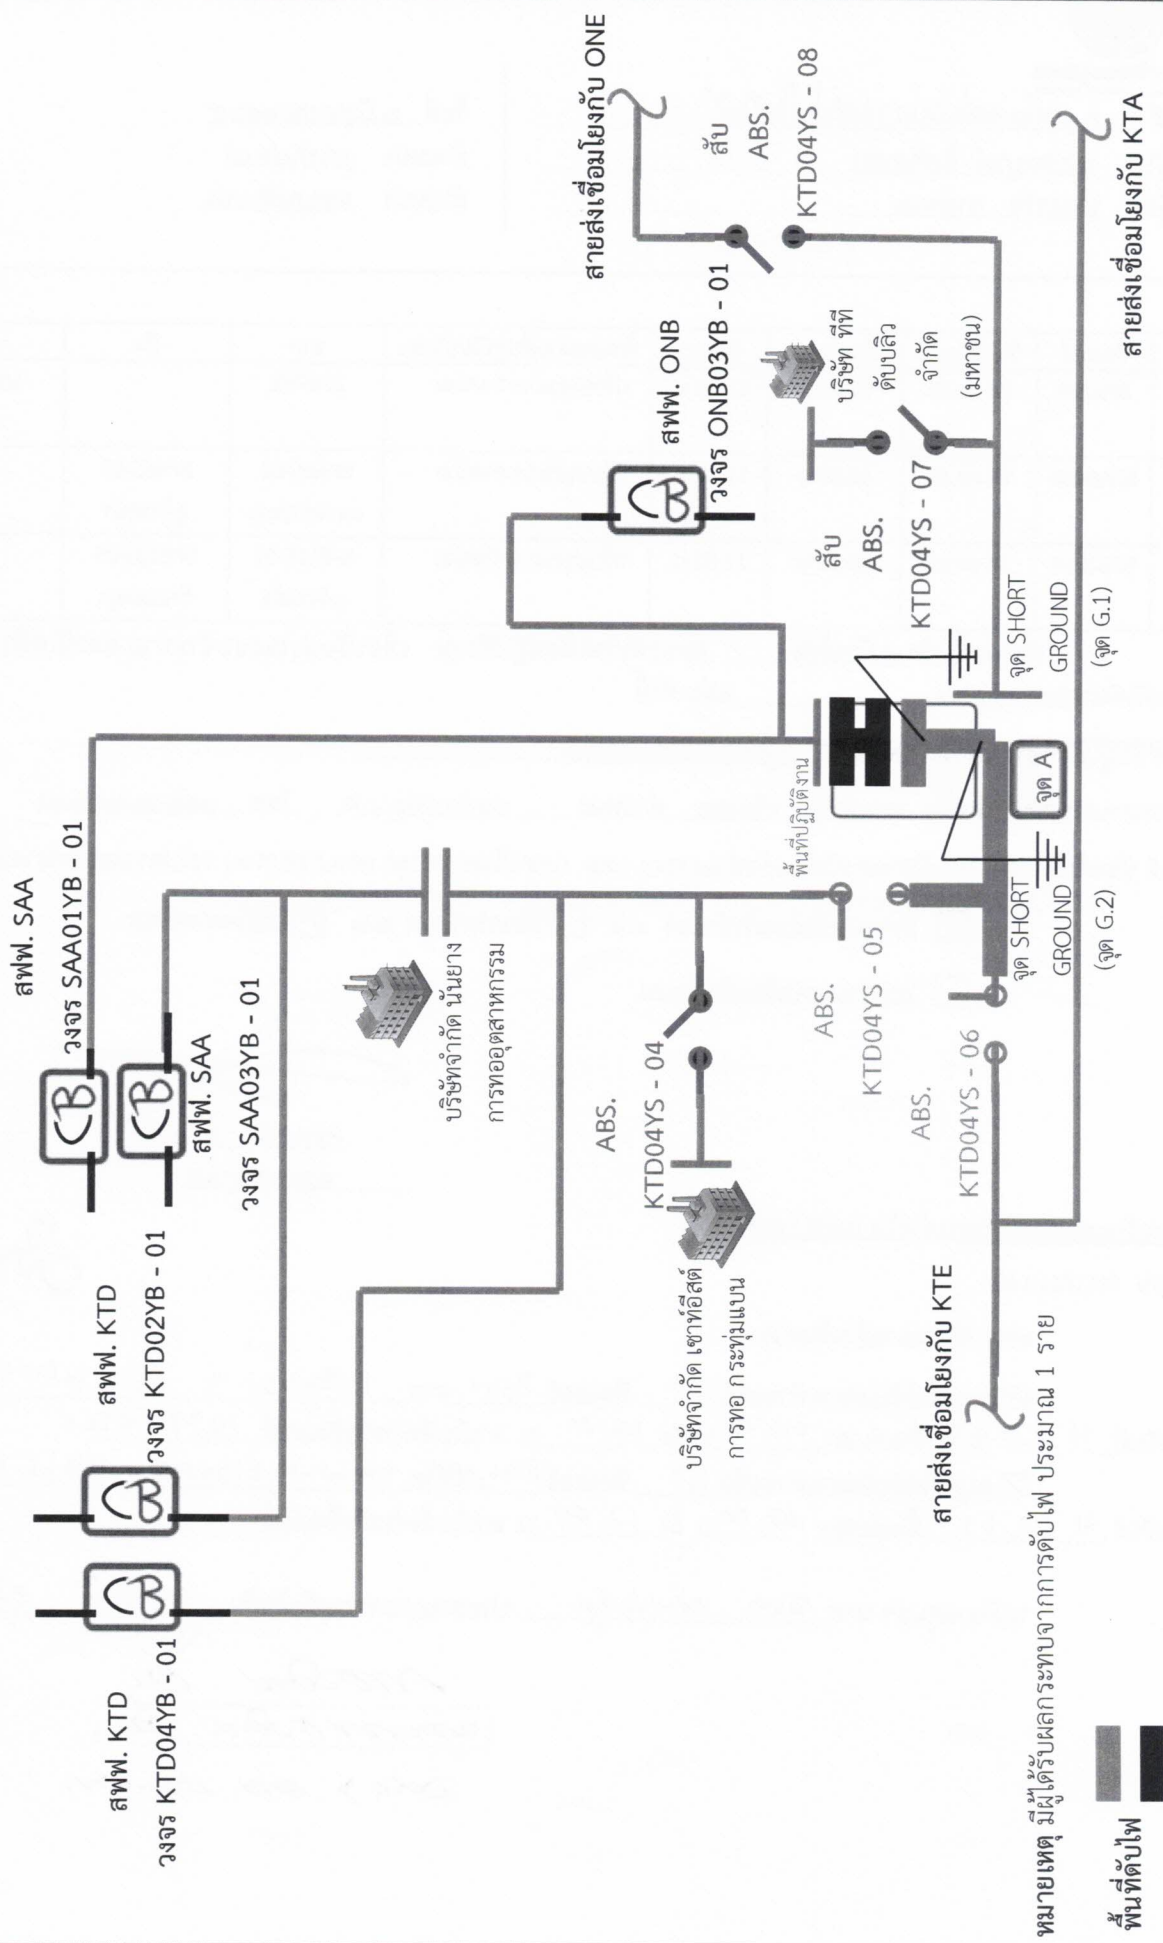

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนการตัดไฟ ตั้งแต่ ปากซอยสวนหลวง ซอย 34 จนถึง สามแยกกระทู้แบบน
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ. และ ผกส. กฟล.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนนครราชสีมา 1 (ทิศทางไปอำเภอเมืองสมุทรสาคร)

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

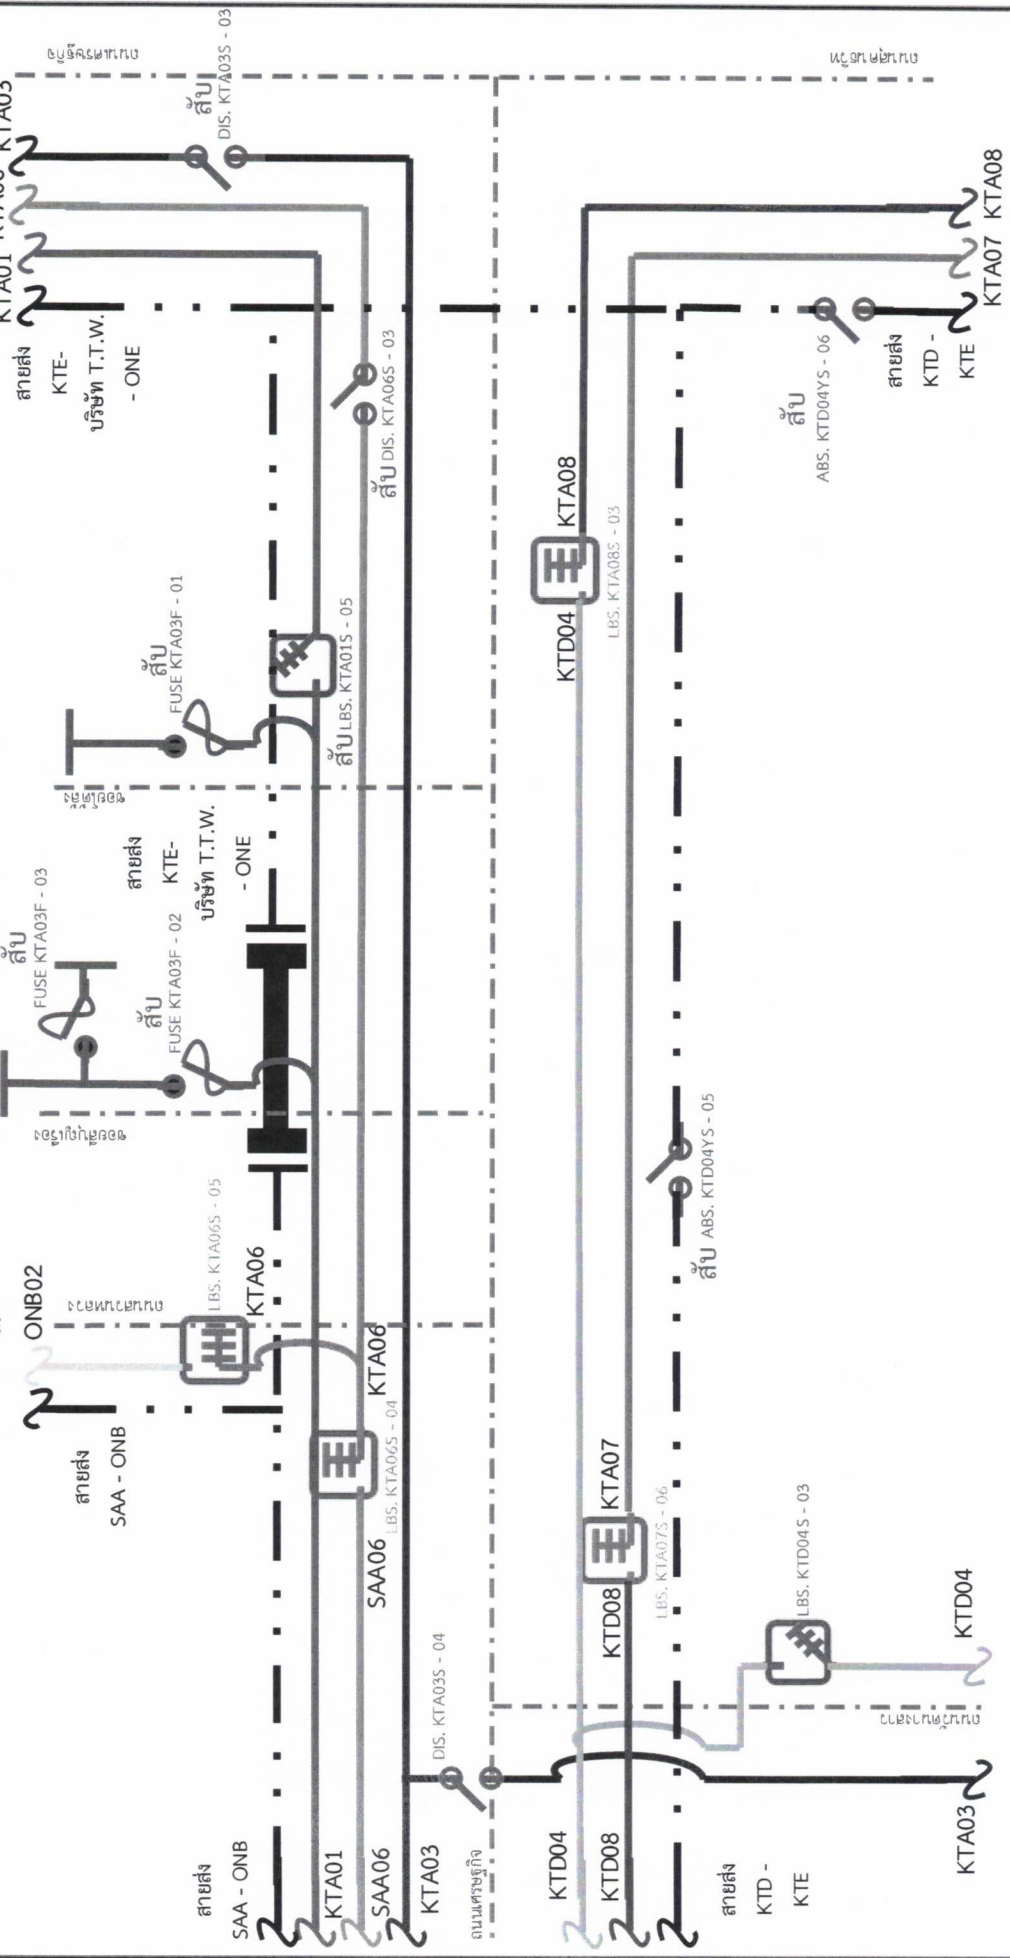


หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ ประมาณ 1,017 ราย

พื้นที่ตัดไฟ

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังการตัดไฟ ตั้งแต่ ปากซอยสวนหลวง ซอย 34 จนถึง สามแยกกระทุ่มแบน เพื่อให้ชุดงาน ผ.บ. และ ผกส. กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนนครราชสีมา 1 (ทิศทางไปอำเภอเมืองสมุทรสาคร)

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

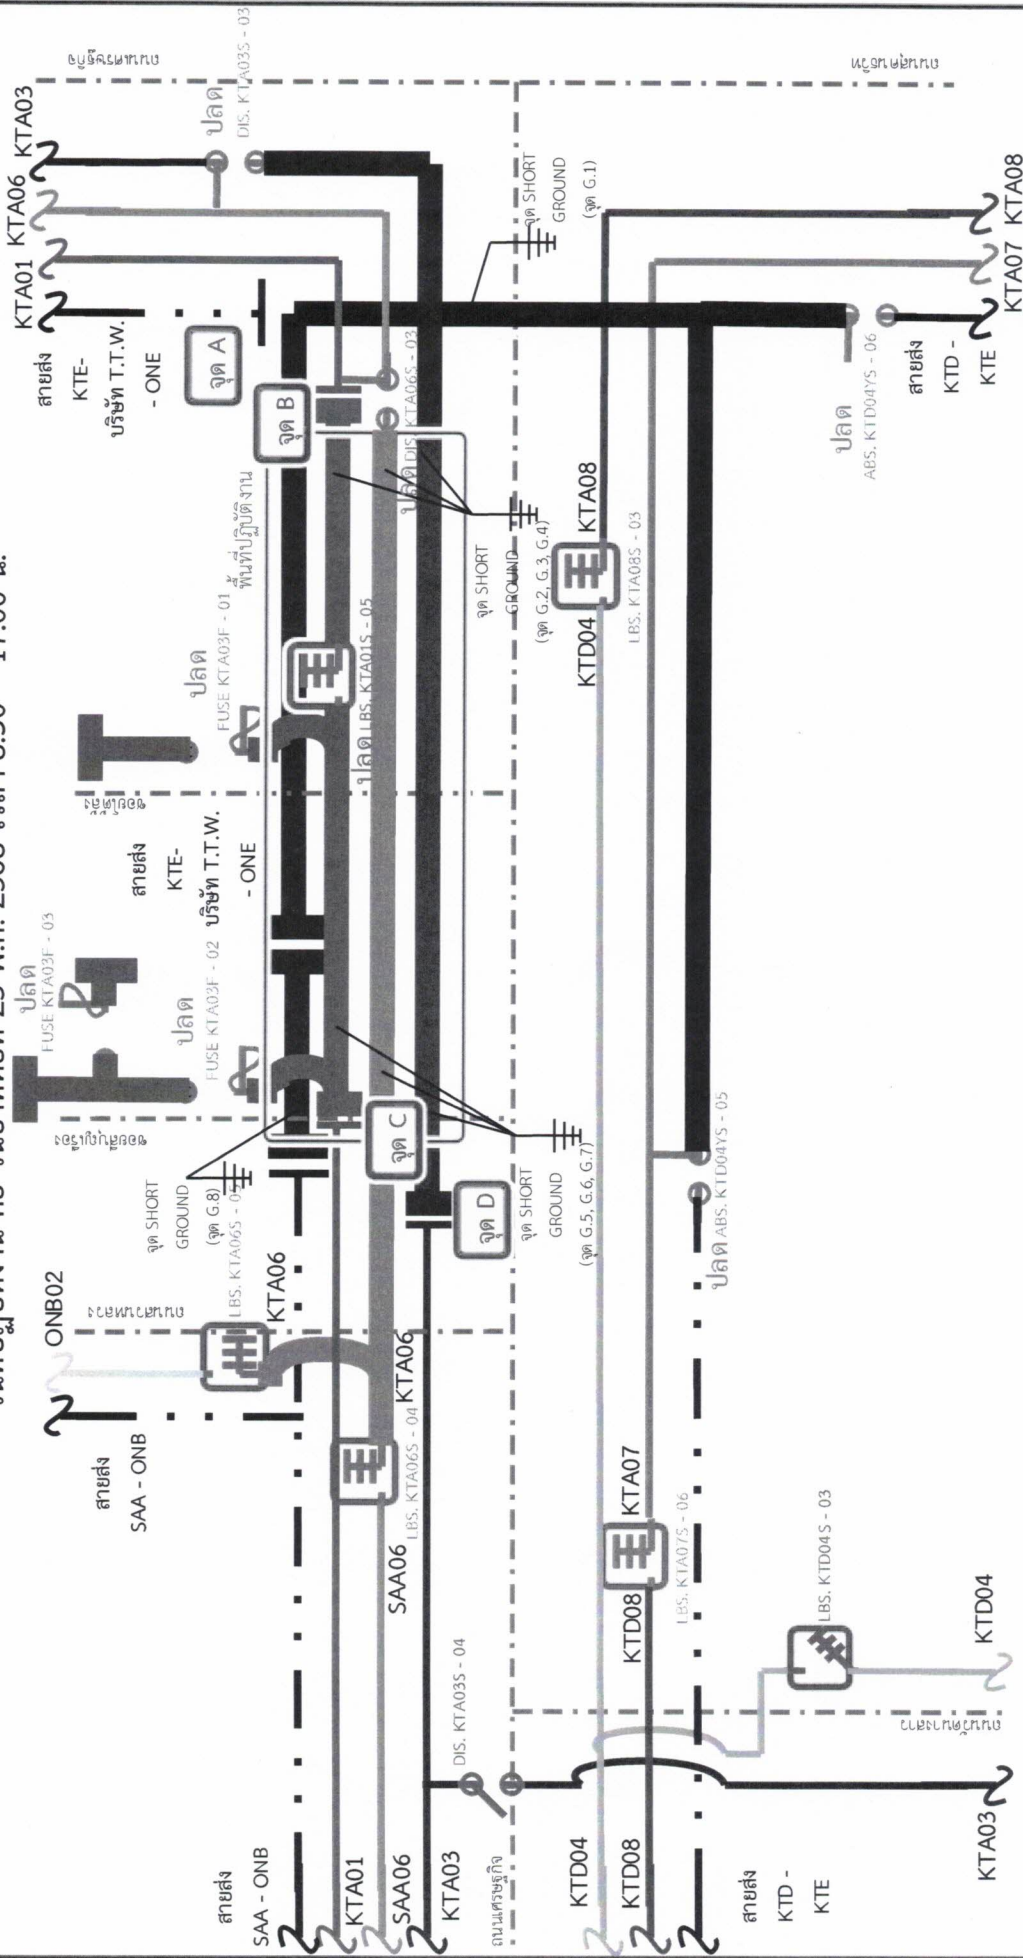

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ ประมาณ 1,017 ราย

พื้นที่ตัดไฟ

รายละเอียดรูปภาพประกอบคำอธิบายพื้นที่ หลังการตัดไฟฟ้า ตั้งแต่ ปากซอยสวนหลวง ซอย 34 จนถึง สามแยกกระทู้มแบน เพื่อให้ชุดงาน ผปบ. และ ผกส. กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนนครราชสีมา 1 (ทิศทางไปอำเภอเมืองสมุทรสาคร) วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ค. 2568 แยกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 08.00 – 09.00 น. และ ช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น.

จุด A

ให้ชุดปฏิบัติงานสาย 115 kV. ปลดจุดเชื่อมต่อสายส่ง ที่จุดแท็บแยกสายส่ง (ฝั่งไป บริษัท T.T.W.) ที่เสาไฟ หัวเสา SD – TL – 3 หมายเลขเสาไฟต้นที่ 80



รายละเอียดรูปภาพประกอบคำอธิบายพื้นที่ หลังการดับไฟ ตั้งแต่ ปากซอยสวนหลวง ซอย 34 จนถึง สามแยกกระทุ่มแบน เพื่อให้ชุดงาน ผ.บ. และ ผ.กส. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนนครราชสีมา 1 (ทิศทางไปอำเภอเมืองสมุทรสาคร)



วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

จุด B

ให้ชุดปฏิบัติงานขอท่เลนปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE วงจรบน (วงจร KTA01) จุดเดียวกันกับอุปกรณ์ตัด
ตอนรหัส KTA06S - 03

จุด C

ให้ชุดปฏิบัติงานขอท่เลนปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE วงจรบน (วงจร KTA01)

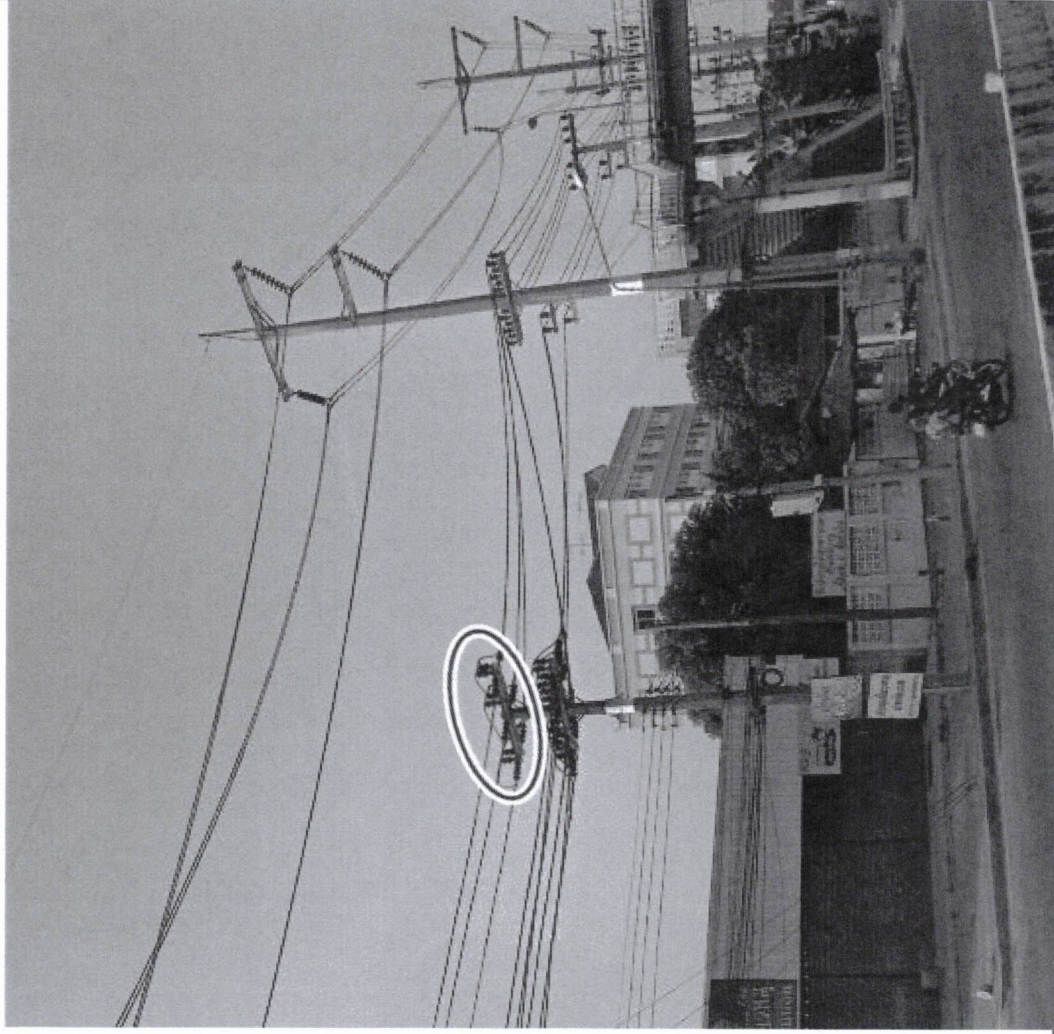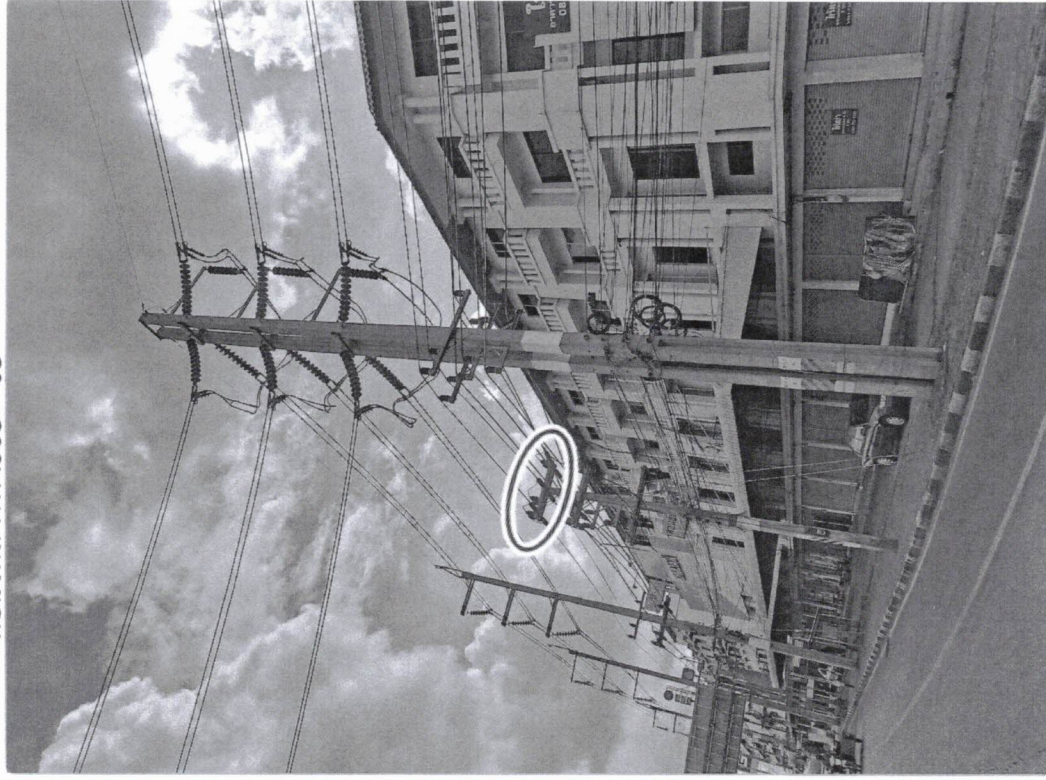

รายละเอียดรูปภาพประกอบคำอธิบายพื้นที่ หลังการตัดไฟฟ้า ตั้งแต่ ปากซอยสวนหลวง ซอย 34 จนถึง สามแยกกระทู้แม่แบน เพื่อให้ชุดงาน ผ.บ. และ ผ.ส. กฟส. กฟป. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนนครราชสีมา 1 (ทิศทางไปอำเภอเมืองสมุทรสาคร)

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

จุด D

ให้ชุดปฏิบัติงานขอทึบลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE วงจรล่าง (วงจร KTA03)

