



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

18 พ.ค. 68

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๓๐๕๓ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง ออ.ปน.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอปลด DIS รหัส SMO๐๕S-๐๑ และ SMO๐๕S-๐๑ พร้อมปลดสายจากเมนไลน์ลงทั้ง ๒
วงจร เพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานต้นท้อตลอดภายใน สถานีฯ สค.๑๕

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๕ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMO๐๕	๑๕ พ.ค. ๖๘ 5 มี.ย. 68	๐๘.๓๐ น.	๑๑.๐๐ น.	ขอปลด DIS รหัส SMO๐๕S-๐๑ และ SMO๐๕S-๐๑ พร้อม ปลดสายจากเมนไลน์ลง ทั้ง ๒ วงจร เพื่อให้ผู้ รับจ้างปฏิบัติงานต้นท้อ ตลอดภายใน สถานีฯ สค. ๑๕	SMO๐๕S-๐๑	จุดปลดสาย หน้าสถานี สค. ๑๕	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	SMO๐๕	๑๕ พ.ค. ๖๘ 5 มี.ย. 68	๐๘.๓๐ น.	๑๑.๐๐ น.		SMO๐๕S-๐๑	จุดปลดสาย หน้าสถานี สค. ๑๕	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMO 4 จาก SMO 4S-01 ถึง จุดส่งต่อน้ำดิบ
ในวันที่ 19 พ.ค.-5 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 833/68
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMO 9 จาก SMO 9S-01 ถึง จุดส่งต่อน้ำดิบ
ในวันที่ 19 พ.ค.-5 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศาล วัฒนประเสริฐ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย จิรวุฒน์ ขุนพรหม

(นาย พิศาล วัฒนประเสริฐ)
วต. 5 กก. น.ผ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นาย เสอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


- | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|--|----|--------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณหน้าสถานีสมุทรสาคร 15 | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 19 พ.ค.- 5 มิ.ย.68 | เวลา | 08.30 | น. | ถึง | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สค. | งานที่ทำ | ดับไฟให้ผู้รับเหมาต้นท่อลอด ภายในสถานี | | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 833/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม | | | | วันที่ | 16 พฤษภาคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | 16 พฤษภาคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | 16 พฤษภาคม 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน
3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร | | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
18	หลังจาก Hotline ทำการปลดจุดเชื่อมต่อสายเข้า DIS Riser Pole SMO 04,09 ออกทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 จุด เสร็จ						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ศค รับทราบ						
20	ไม่มี Short Ground เนื่องจากจะปลดสายออก						
21	แจ้ง หน่วยงาน Test ไฟดับแล้ว ลงข้อมูลใน WeSafe ให้เรียบร้อย และแจ้งปฏิบัติงานได้						
22	SMO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		- -
23	SMO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		- -
24	SMO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		- -
25	SMO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		- -
	**** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ****						
26	เมื่อชุดปฏิบัติงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ทุกชุด พร้อมจ่ายไฟ						
27	SMO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		- -
28	SMO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		- -
29	SMO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		- -
30	SMO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		- -
31	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
32	แจ้ง Hotline ทำการเชื่อมต่อเชื่อมต่อสายเข้า DIS Riser Pole SMO 04,09 เข้าทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 จุดได้ (ตามเอกสารแนบ)						
33	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อมต่อเชื่อมต่อสายเข้า DIS Riser Pole SMO 04,09 เข้าทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 จุด เสร็จ						
34	SMO04S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.4
35	SMO09S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.9
36	ย้ายโหลด SMO 4 กลับจาก SMO 7						
37	SMO04VB-01	สับ	สับ คง"OFF"Auto Reclose		SMO		- -
38	SMO04S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 หน้าสถานีฯ (บน)
39	ย้ายโหลด SMO 9 กลับจาก SMO 2						
40	SMO09VB-01	สับ	สับ คง"OFF"Auto Reclose		SMO		- -
41	SMO02S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 หน้าสถานีฯ (ล่าง)
42	SMO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		- -
43	SMO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		- -


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
44	SMO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		-	-
45	SMO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		-	-
46	SMO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		-	-
47	SMO09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		-	-
	**** สิ้นสุด Switching ****							

สถานะการจ่ายไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงาน

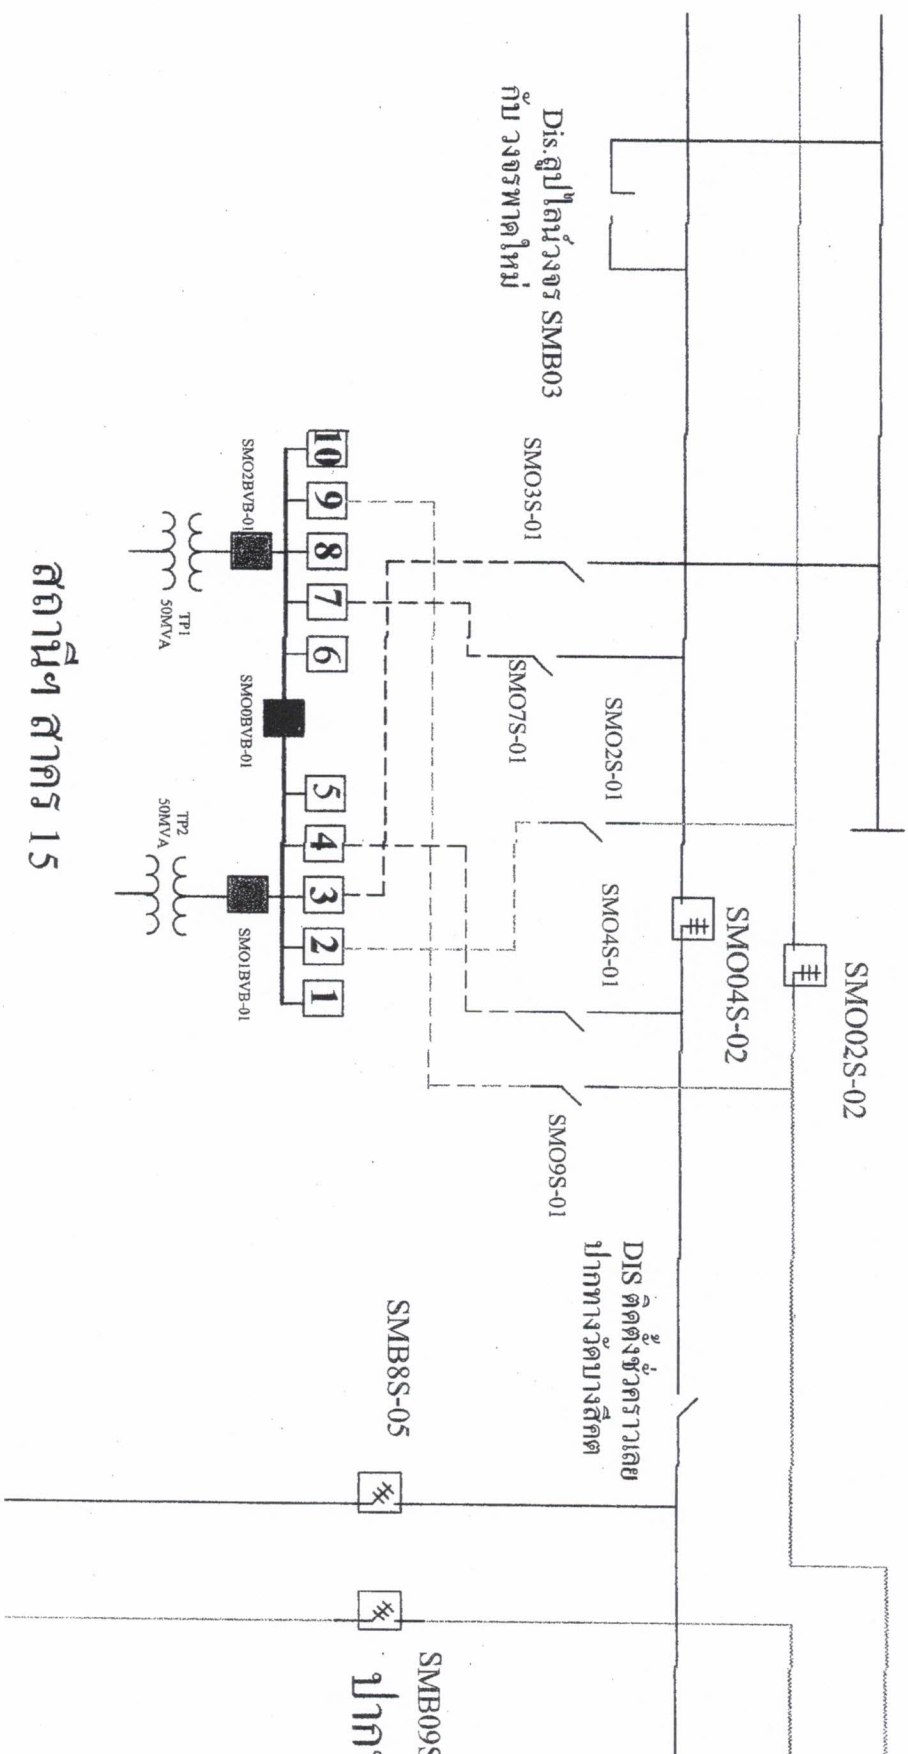

สถานีฯ สากร 15

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

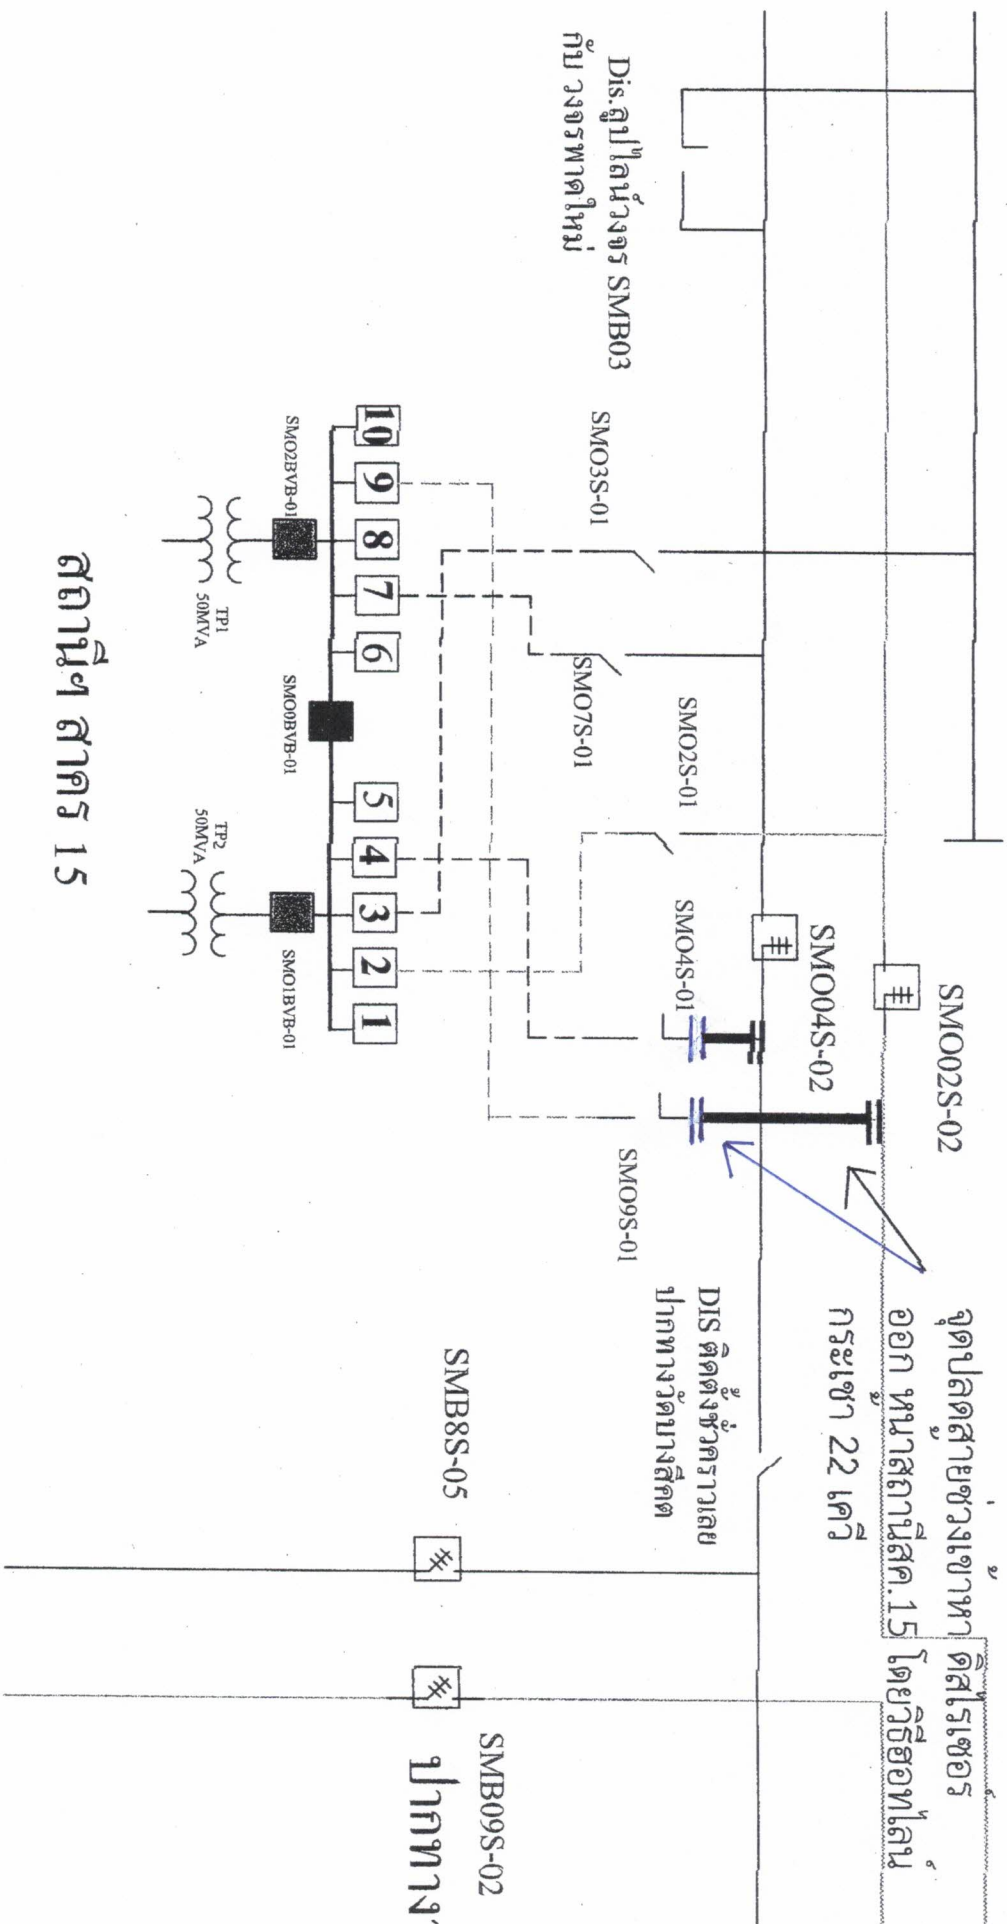

สถานีฯ สาคร 15
