



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

*งานขางเคียง 744

Switching Deadline

22 พ.ค. 68

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๔๖๔ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณแนวถนนเอกชัย ๒ (ขาออก)
ตั้งแต่ ปากทางน้ำเก็ก ถึง หน้าบริษัท ส.ชัยวาริ

ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKB๐๓	๒๕ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณแนวถนนเอกชัย ๒(ขาออก) ตั้งแต่ ปาก ทางน้ำเก็ก ถึง หน้า บริษัท ส.ชัยวาริ	EKB๐๓S-๐๑ ปากทางน้ำเก็ก เอกชัย	EKB๐๓S-๐๒ ปากทางน้ำเก็ก เอกชัย	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	EKB๐๓	๒๕ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKB๐๓S-๐๑ ปากทางน้ำเก็ก เอกชัย	EKA๐๔S-๐๒ บ.ชัยวาริมาริน	
๓	EKB๐๘	๒๕ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKB๐๘S-๐๑ ปากทางน้ำเก็ก เอกชัย	EKB๐๘S-๐๒ ปากทางน้ำเก็ก เอกชัย	
๔	EKB๐๘	๒๕ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKB๐๘S-๐๑ ปากทางน้ำเก็ก เอกชัย	EKA๐๔S-๐๕ บ.ชัยวาริมาริน	
๕	EKA๐๓	๒๕ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี ปัมแก้สหน้า หมู่บ้านจีนเนอริ	ปลายสาย	
๖	๑๑๕ kV	๒๕ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯเอกชัย ๒	EKA๐๔YS-๐๔ สถานีฯเอกชัย ๑	

พื้นที่ที่มีผู้เช่าไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...แนวนอนเอกชัยขาออกตั้งแต่ซอยน่านก๊กถึง หน้าบริษัท ส.ชัยวารินารีน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจิรวัดน์ บุญพร้อม.....ตำแหน่ง.....พชง.๒.....โทร.....๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐.....

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

EkB03S-02
EKA09S-02
EkB08S-02
EKA04S-05
ปตท.ธ.
EKA04YS-04

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 ฟิตเตอร์ EkB03 จาก EkB03S-01 ถึง EKA09S-02
ในวันที่ 25 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 838/68

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3,4 ฟิตเตอร์ EkB08 จาก EkB08S-01 ถึง EKA04S-05
ในวันที่ 25 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟิตเตอร์ EKA03 จาก สอธิต DDE ถึง ปตท.ธ.
ในวันที่ 25 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 ฟิตเตอร์ 115 kv จาก EkB04YB-01 ถึง EKA04YS-04
ในวันที่ 25 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิตเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิตเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิตเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิตเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิตเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวัฒน์ แก้วธำนิ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย จิรวัฒน์ บุญพร้อม
19 พ.ค. 68

(นาย จิรวัฒน์ แก้วธำนิ)
จตภ. 5 เกษน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 4 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)


หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนเอกชัย 2 (ขาออก) ตั้งแต่ปากทางน้ำเก็ก ถึง หน้า บริษัท ส.ชัยวารี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย (แก้ไขสายขาด EKB08)		ตามใบขอปฏิบัติงาน	838/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก	วันที่	20 พฤษภาคม 2568		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	20 พฤษภาคม 2568		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	20 พฤษภาคม 2568		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. นางสาวสุกษา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMC06YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- -
3	EKB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		- -
4	EKA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		-
5	EKA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		-
6	EKB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		-
7	ตรวจสอบ DIS Pot Head EKB08S-01 สถานะ Open						
8	ตรวจสอบ SF6 EKB03S-02 ปากขอยน้ำเก็ก, EKB08S-02 ปากขอยน้ำเก็ก, EKA09S-02 หน้า บ.ชัยวารี สถานะ Open+Lock						
9	เมื่อพร้อมดับไฟ						
10	EKB03VB-01	สับ	ปลด		EKB		- -
11	EKB03S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS Pot Head
12	EKB08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากขอยผู้บริษา
13	EKB08S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 ปากขอยโครงการจัดสรรนายปัญญา
14	EKA04S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SCADA	SF6 ส.ชัยวารี
15	ตรวจสอบ การจ่ายไฟ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 3 SMC06,07YB-01 จ่ายไฟแบบ Close Loop ทั้งหมด						
16	EKB04YB-01	สับ	ปลด		EKB		- -
17	EKB04YS-01	สับ	ปลด		EKB		- ใบมีด 115 เควี
18	EKB04YS-03	สับ	ปลด		EKB		- ใบมีด 115 เควี
19	EKA04YS-04	สับ	ปลด ล็อคคณญแจ		สค.		ABS หน้าสถานี เอกชัย 1
20	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้า 22 เควี ทำการตัด DDE บริเวณบ่้มแก๊สหน้าซินเนอร์ (ไม่มีโหลด) วงจร EKA03 (ตามผังแนบ)						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
27	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6						
28	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
29	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
30	SMC06YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	EKA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-
32	EKA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
33	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe						
34	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
35	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
36	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
37	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
38	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5						
39	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6						
40	SMC06YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- -
41	EKA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		-
42	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
43	แจ้งชุดขอทไลน์กระเข้า 22 เควี ทำการเชื่อม DDE บริเวณปั้มแก๊สหน้าซินเนอร์ี วงจร EKA03 (ตามผังแนบ)						
44	EKA04YS-04	ปลด	ลั้บ		สด.		ABS หน้าสถานีฯ เอกชัย 1
45	EKB04YS-01	ปลด	ลั้บ		EKB		- ใบมีด 115 เควี
46	EKB04YS-03	ปลด	ลั้บ		EKB		- ใบมีด 115 เควี
47	EKB04YB-01	ปลด	ลั้บ คง OFF Auto Reclose		EKB		- -
48	EKB08S-04	ปลด	ลั้บ		สด.		DIS ปากซอยอุบลริชา
49	EKB08S-03	ปลด	ลั้บ		สด.		SF6 ปากซอยโครงการจัดสรรนายปัญญา
50	EKB03S-01	ปลด	ลั้บ		สด.		DIS Pot Head
51	EKB08S-01	ปลด	ลั้บ		สด.		DIS Pot Head
52	EKB03VB-01	ปลด	ลั้บ คง OFF Auto Reclose		EKB		- -
53	EKB08VB-01	ปลด	ลั้บ คง OFF Auto Reclose		EKB		- -
54	SMC06YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- -
55	EKB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		- -
56	EKA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-
57	EKB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		-
58	EKB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						


สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

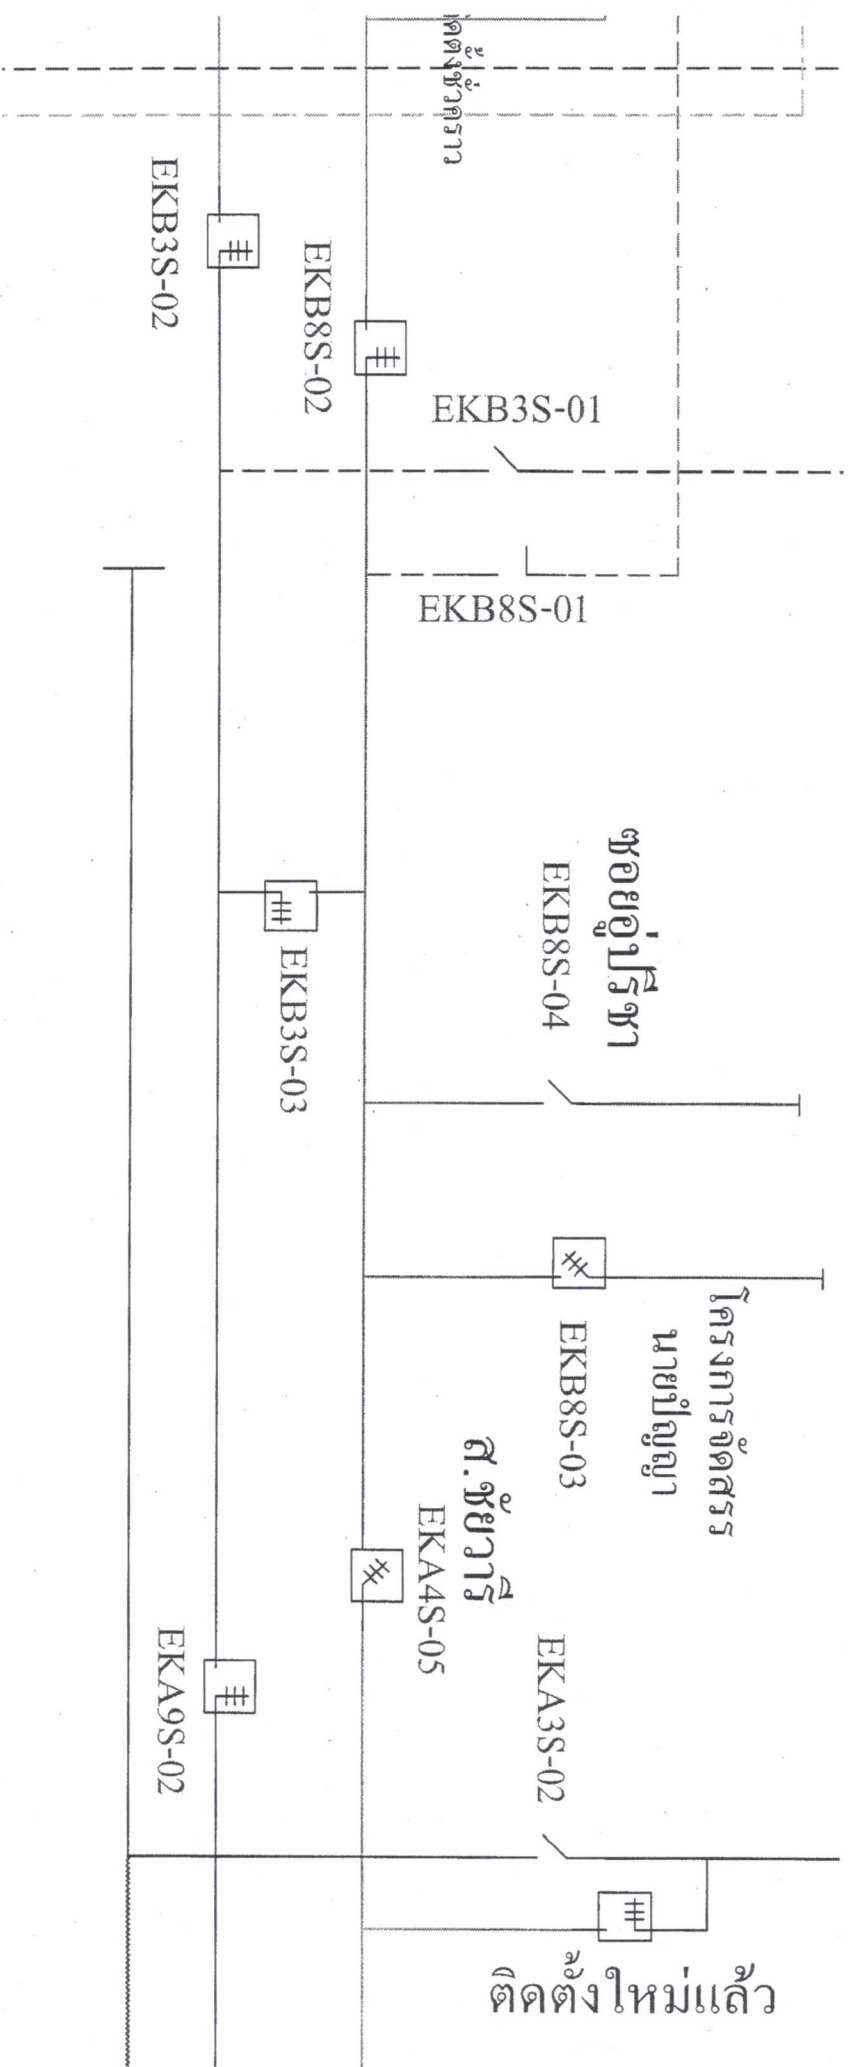

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

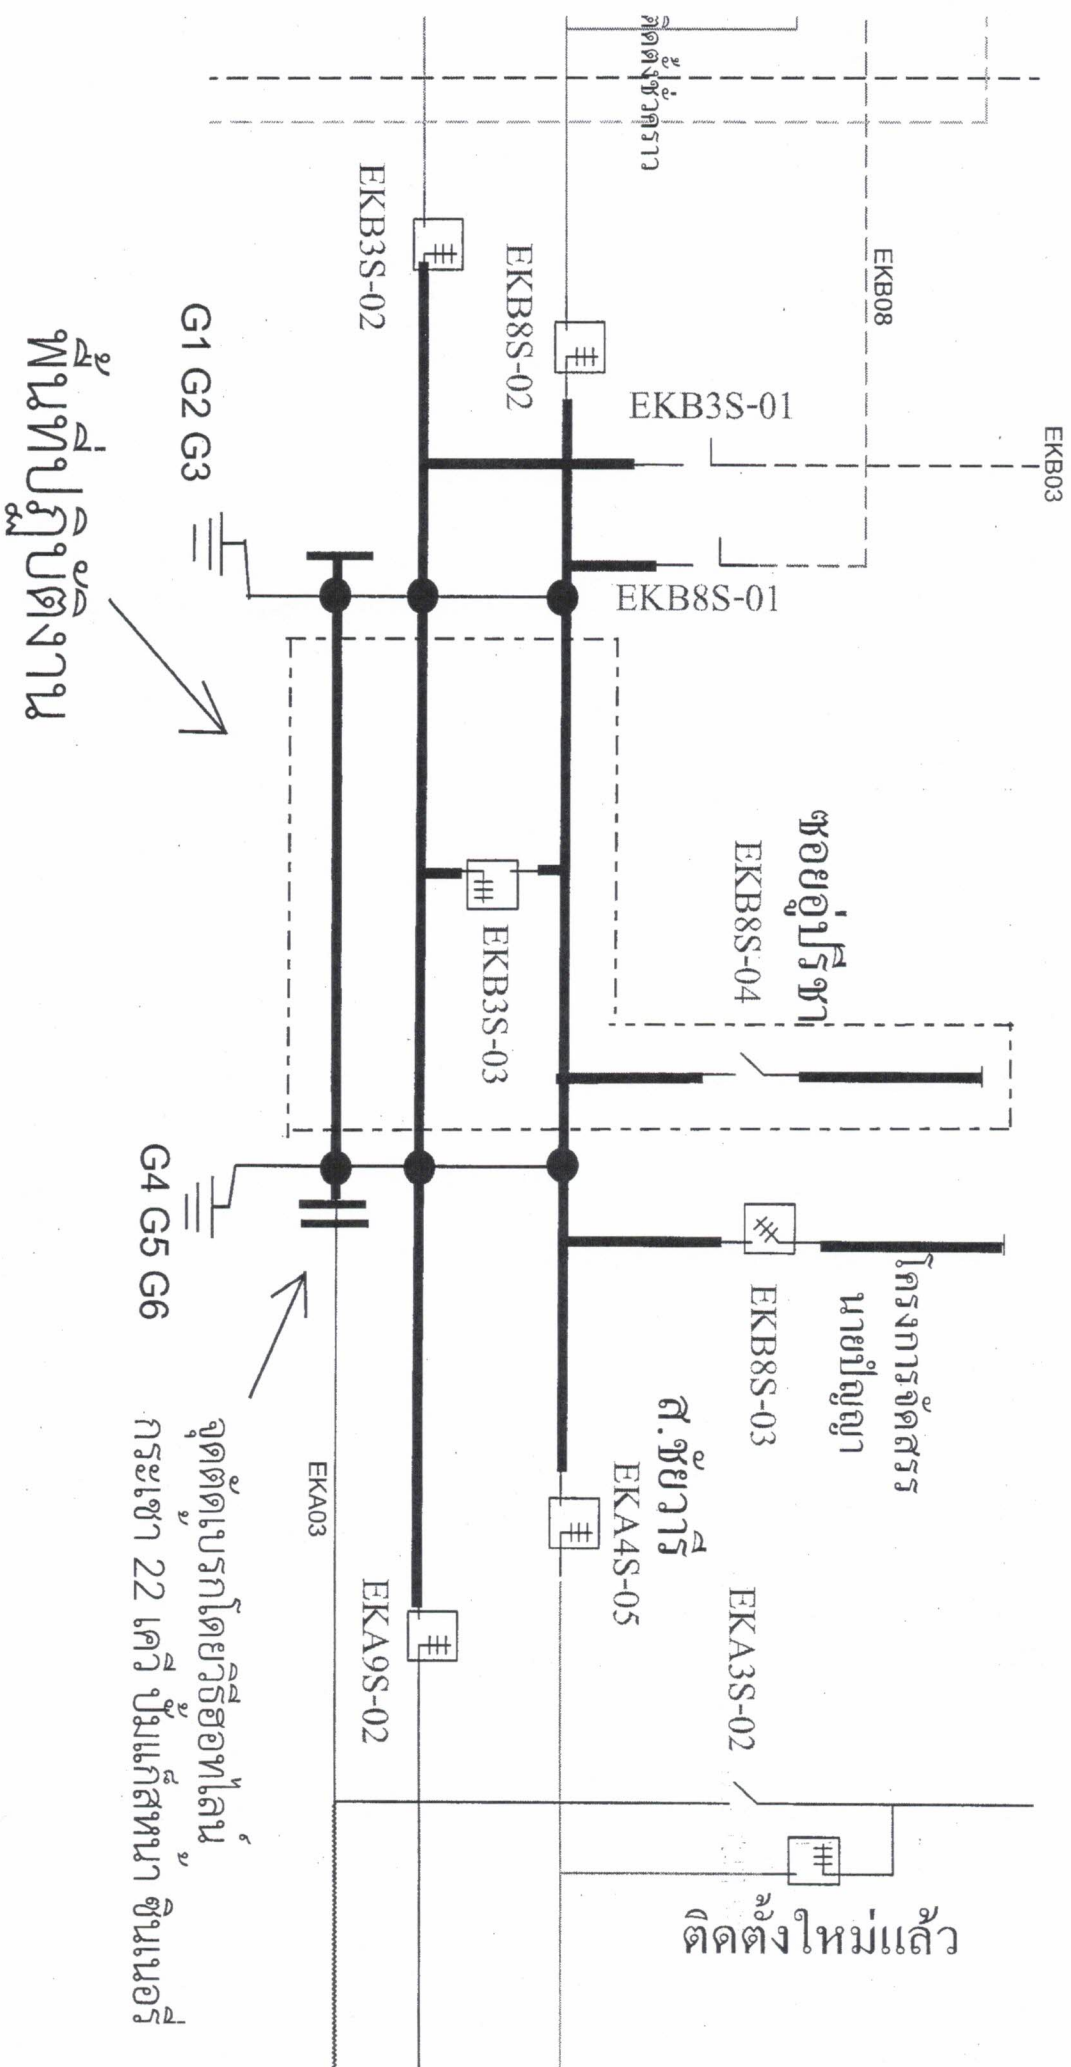

สถานการณ์การจ่ายไฟฟ้า

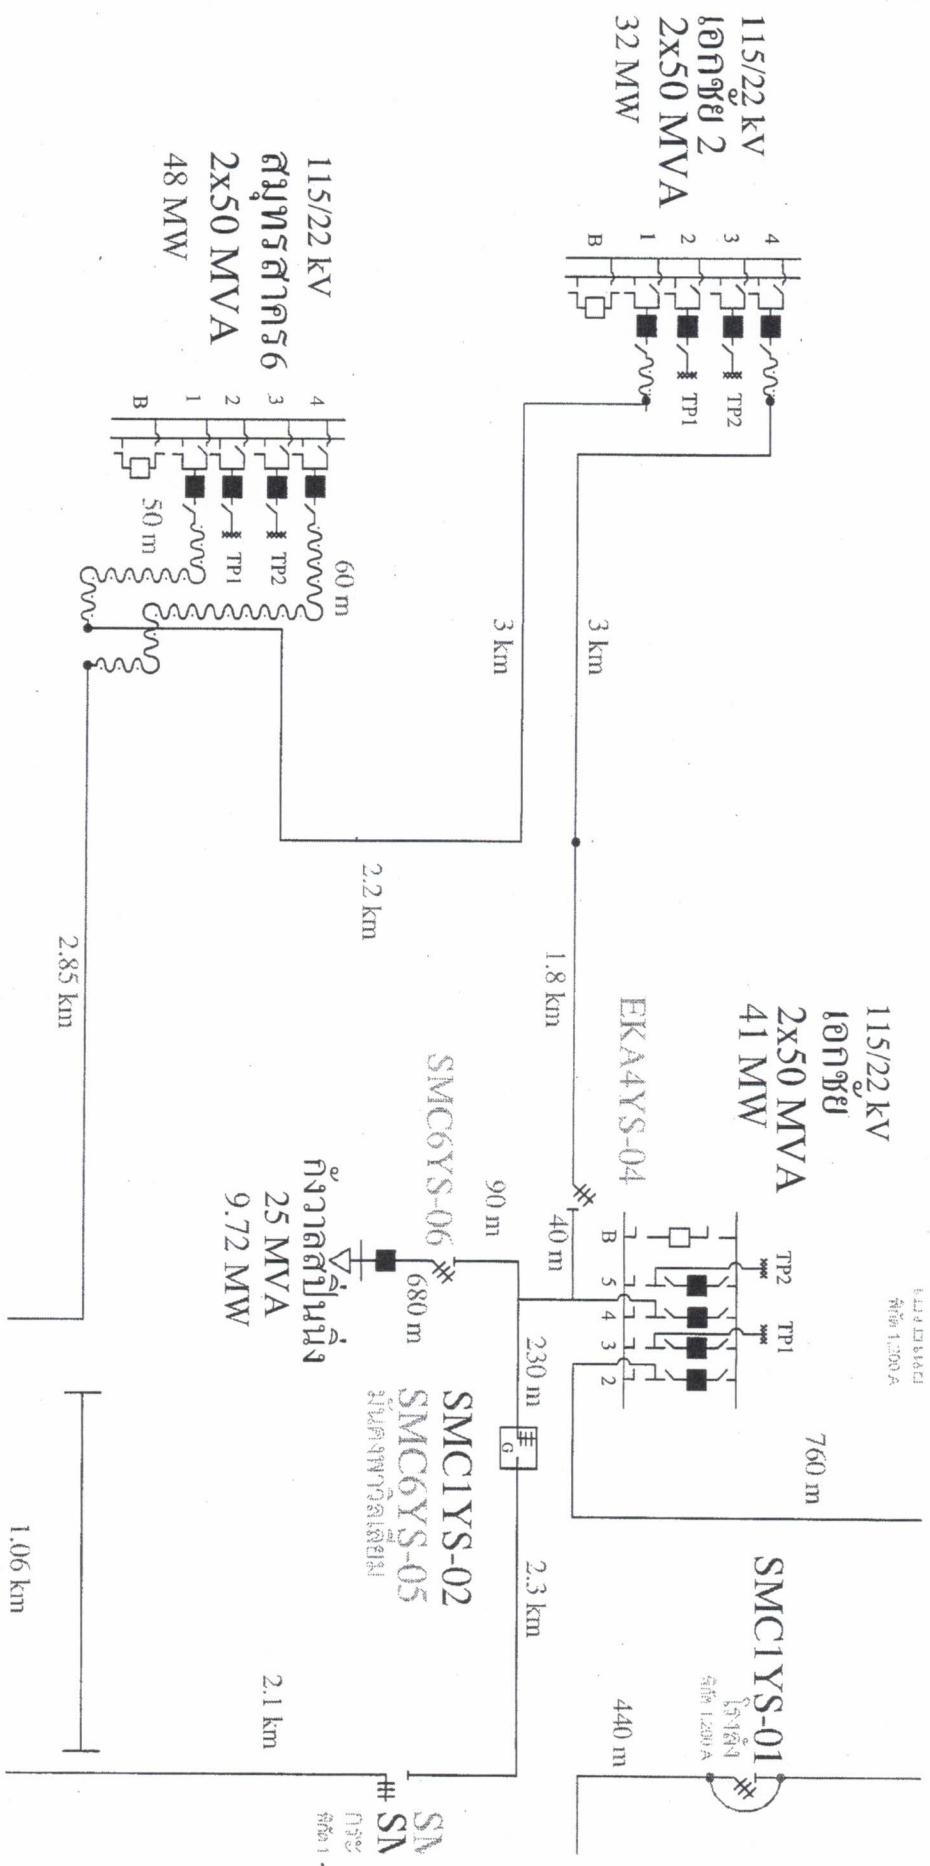

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

