



# Switching Deadline

11/02/68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ศปจ.(กป.) ๑๒๘ ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณโชค

ชื่อผู้ส่ง นายไกรสร พวงหอม

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ศรีประจันต์

ด้วย กฟส.ศรีประจันต์ จะขอตัดไฟตัดเตอร์ ๑๐ สถานีสามชุกบางส่วนเพื่อทำงานติดตั้ง Recloser บริเวณทางเข้าห้วยเจริญ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	XCA๑๐	๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ทำงานติดตั้ง Recloser บริเวณทางเข้าห้วยเจริญ	จุดเชื่อมไลน์จุด A บริเวณทางเข้าห้วยเจริญ	Dis ชั่วคราว ลาดป้อม	นายวีรพันธ์ เรืองเดช อังกร โทร.๐๘๘๗๖๑๑๑๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวสุพิชชา วรรณคาม ตำแหน่ง วศก.๕ ผก.กฟส.ศรีประจันต์ โทร. ๐๘๗-๕๕๑๖๑๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๖๕๕๘๘๖,๑๐๐.๑๓๕๒๗๙

๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๖๖๔๔๒๖,๑๐๐.๑๔๑๘๑๘

(.....นายไกรสร พวงหอม.....)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ศรีประจันต์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ XCAP จาก กฟภ.๓ PG ถึง ๑๒๐๓.๓๓๖๐๓  
ในวันที่ 14 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 270/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จรรณพพงษ์ นกเทศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ น.ศ.สุพิชชา วรรณคาม

4 ก.พ. 68

(นายไกรสร พวงหอม) ๒๐๑๑-๕ กท-๕ นว. ๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นร.ส.ส.บ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 .....แผ่น

แผนผังแนว 1 .....แผ่น



ผจพ. .... (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

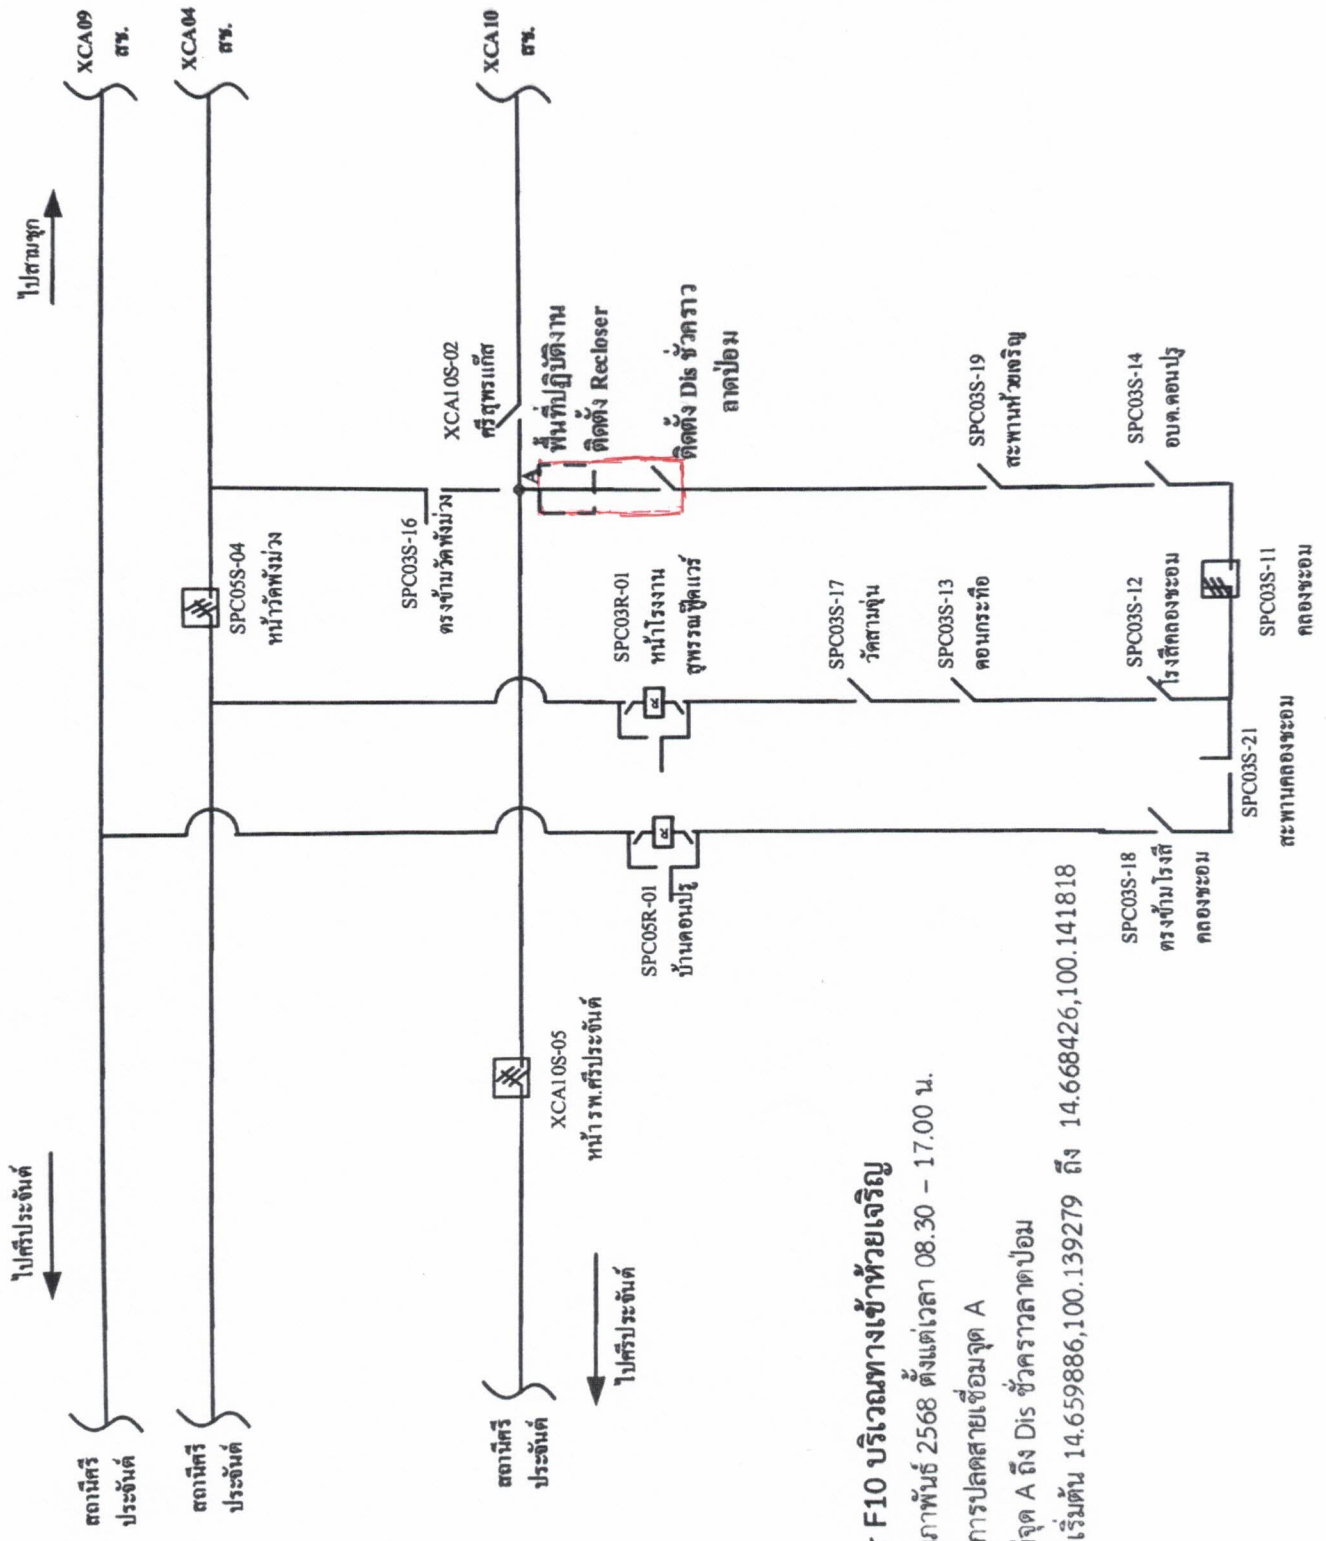
1. สถานที่ทำงาน	ติดตั้ง Recloser บริเวณทางเข้าห้วยเจริญ XCA10R-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.พ. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง Recloser		ตามใบขอปฏิบัติงาน	270/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	5 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายวรรณพงษ์,นายอนุสรณ์,นายอนิต, นายมนเฑาะ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพีรภัทร,นส.สุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ,นส.พิชชา			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	XCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
3	SPC03R-01	Normal	Nonreclosing,GND		SAD		R หน้าโรงงานสุพรรณฟูดส์แอร์
4	- ย้ายโหลด XCA10 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก XCA04						
5	XCA04S-09	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 คลองชะอม
6	DISชค. XCA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS ลาดป้อม
7	แจ้งกฟส.ศปจ.ทำการไลน์โหลดออกก่อนทำการปลด PG บริเวณทางเข้าห้วยเจริญ						
8	แจ้งกฟส.ศปจ.ให้ HOTLINE ทำการปลด PG บริเวณทางเข้าห้วยเจริญออกทั้งสามเฟส						
9	หลังจากกฟส.ศปจ.ให้ HOTLINE ทำการปลด PG บริเวณทางเข้าห้วยเจริญออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งลงข้อมูลใน We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
14	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
15	XCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
16	SPC03R-01	Nonreclosing,GND	Normal		SAD		R หน้าโรงงานสุพรรณฟูดส์แอร์
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
17	เมื่อนำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	XCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
19	SPC03R-01	Normal	Nonreclosing,GND		SAD		R หน้าโรงงานสุพรรณฟูดส์แอร์
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
22	- จ่ายไฟ						
23	ตรวจสอบ Recloser ติดตั้งใหม่อยู่สถานะ OPEN และ ไขมิต Source,Load ปลดออกจากกันทั้งสามเฟส  						
24	DISชค. XCA10	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS ลาดป้อม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งกฟส.ศปจ.ให้ HOTLINE ทำการเชื่อม PG บริเวณทางเข้าห้วยเจริญเข้าทั้งสามเฟส						
26	หลังจากกฟส.ศปจ.ให้ HOTLINE ทำการเชื่อม PG บริเวณทางเข้าห้วยเจริญเข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
27	แจ้งกฟส.ศปจ.ทำการจ่ายโหลดเข้าทั้งหมด						
28	- ย้ายโหลด XCA10 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก XCA04						
29	Sw.source	ปลด	สับ		ศปจ.		R ทางเข้าห้วยเจริญ
30	Sw.load	ปลด	สับ		ศปจ.		R ทางเข้าห้วยเจริญ
31	XCA10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ศปจ.		R ทางเข้าห้วยเจริญ
32	XCA04S-09	สับ	ปลด <i>คง</i>		ศปจ.		SF6 คลองชะอม
33	XCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
34	SPC03R-01	Nonreclosing,GND	Normal		SAD		R หน้าโรงงานสุพรรณฟูดส์แวย์
35	XCA10R-01	Nonreclosing,GND	Normal		XCA		R ทางเข้าห้วยเจริญ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



# แผนงานติดตั้ง Recloser F10 บริเวณทางเข้าห้วยเจริญ



## หมายเหตุ

### ติดตั้ง Recloser F10 บริเวณทางเข้าห้วยเจริญ

1. วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
2. Hotline สห.ทำการปลดสายเชื่อมจุด A
3. พื้นที่ดับไฟตั้งแต่จุด A ถึง Dis ชั่วคราวลาดป้อม
4. พิกัดพื้นที่ดับไฟ เริ่มต้น 14.659886,100.139279 ถึง 14.668426,100.141818
