



Switching Deadline

10/02/68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๐๘๑ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพงษ์
ชื่อผู้ส่ง นายนิศการ แซ่มโซติ

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย หลังรีโครสเซอร์บ้านหนองขาม LWA๐๗R-๑๑ วงจร LWA๐๗ สถานีไฟฟ้าเสาขวัญ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	LWA๐๗	๑๓ ก.พ. ๒๕๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย หลังรีโครสเซอร์ บ้านหนองขาม LWA๐๗R-๑๑	วงจรพิดเตอร์ ๗ สถานี เลขขวัญ LWA๐๗	รีโครสเซอร์ บ้านหนองขาม LWA๐๗R-๑๑ วงจร LWA๐๗ สถานีเลขขวัญ พิกัด ๑๔.๗๘๓๑๓๐, ๙๙.๗๔๔๘๘๒	นาย ศุภลักษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ข.ผ.กป โทร ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศการ แซ่มโซติ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ LWA07 จาก LWA07R-๐1 ถึง 2/7 ๖๕๖๖
ในวันที่ 1๖ ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 0๖.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 273/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัชร ใสมาลี๑ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายศุภฤกษ์ งามสวัสดิ์
4 ก.พ. 68


(นาง จิรวรรณ ใสมาลี๑)
จก. 5 ๖๖๓๓ น.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1. แผ่น
แผนผังแนบ 7. แผ่น
ผจพ. - (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

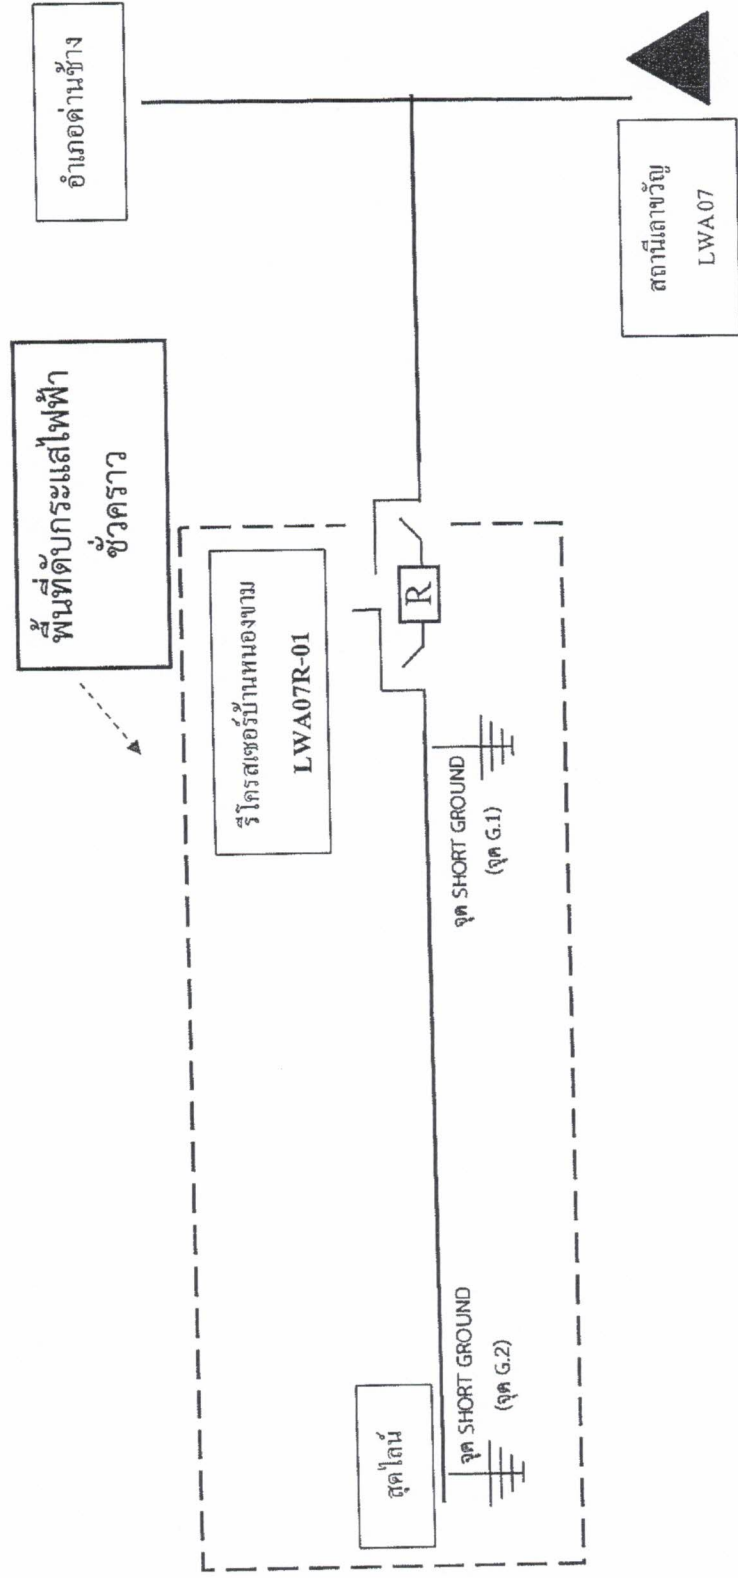
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองขาม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.พ. 68	เวลา 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 273/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐภาณุจณ์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ SF6 DBA07S-05 บ้านคอตัน อยู่สถานะ OPEN+LOCKคาน						
3	LWA07R-01	Normal	Nonreclosing		นญช.		
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
5	LWA07R-01	สับ	ปลด		นญช.	R	บ้านหนองขาม
6	SW.load LWA07R-01	สับ	ปลด		นญช.	DIS	บ้านหนองขาม
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G1						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G2						
10	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อดกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ จุด G1						
14	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ จุด G2						
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	SW.load LWA07R-01	ปลด	สับ		นญช.	DIS	บ้านหนองขาม
17	LWA07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นญช.	R	บ้านหนองขาม
18	LWA07R-01	Nonreclosing	Normal		นญช.		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย หลังรีโตรสเซอร์บ้านหนองขาม LWA๐๗R-๐๑ วงจร LWA๐๗ สถานีไฟฟ้าเสาวชัย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.



ทนายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม
