



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..... ก.๓.พพท. ๑๕๖๓  
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร์

วันที่ ..... ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง ..... ออ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ..... ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ..... ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ..... ๑ ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU06	๒๒ กพ.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา พาดสาย แรงสูง บ้านเบญพาด	ดรีอโปเอท์ ชั่วคราว กม. 31	สูตรระบบจำหน่าย (PTU06S-17)	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	PTU01	๒๒ กพ.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	รื้อถอน/ติดตั้ง คอน BA ตลาด นัต กม.๓๑	PTU1S-08	PTU1S-09	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๓	PTU06	๒๒ กพ.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	รื้อถอน/ติดตั้ง คอน BA ตลาด นัต กม.๓๑	PTU6S-04	PTU6S-13	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..... ๔๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๕

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ .....  
(..... นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร์ .....)  
ตำแหน่ง ..... ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ PTU06 จาก D/O ซ่งการ กม.31 ถึง สูตรระบบจำหน่าย (PTU06S-17)  
ในวันที่ 22 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 277/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ PTU01 จาก PTU01S-08 ถึง PTU01S-09  
ในวันที่ 22 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 277/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ PTU06 จาก PTU06S-04 ถึง PTU06S-13  
ในวันที่ 22 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 277/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวัชชา วัชบุณยา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางคนหา ชำนาญเรือ  
ช่างสี

.....  
(นางสาวสุวัชชา วัชบุณยา)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟส.พทท.  
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง ..... 5 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... 1 ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. .... (สถานี ..... )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ระบบจำหน่าย บริเวณตลาดนัด กม.31 และบ้านเบญพาด					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.พ. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	12.00 <del>17.00</del> น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปักเสา พาดสาย / รื้อถอน ติดตั้งคอน BA		ตามใบขอปฏิบัติงาน	277/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก	วันที่	16 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			<i>gss s</i> <i>อดิศักดิ์</i>	วันที่	16 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายทศพรสวัสดิ, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		
3	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		Load = 1.35 MW
4	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		Load = 4.57 MW
5	PTU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		Load = 2.42 MW
6	PTU06R-02	Normal	Nonreclosing		พทน.		R แยกเบญพาด
7	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
8	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		Load = 2.22 MW
9	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		Load = 2.70 MW
10	<b>ย้ายโหลดวงจร PTU01 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG01</b>						
11	PTU01S-07	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
12	PTU02S-14	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
13	PTU01S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS หน้าปั้มน้ำมันเบญพาด
14	PTU02S-14	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
15	<b>ย้ายโหลดวงจร PTU01 บางส่วนไปจ่ายจาก PTU02</b>						
16	PTU02S-20	ปลด	สับ		พทน.		DIS สีแยกคอนตาเพชร
17	PTU01S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS ตลาดนัด กม.31 (ข้ามถนน)
18	<b>ย้ายโหลดวงจร PTU06 บางส่วนไปจ่ายจาก PTU02</b>						
19	PTU02S-19	ปลด	สับ		พทน.		DIS ตรงข้ามหน้าวัดดอนเตาอิฐ
20	PTU06S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS หน้าปั้มน้ำมันเบญพาด
21	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.</b>						
22	<b>ดับไฟในไลน์ PTU06</b>						
23	PTU06R-02	สับ	ปลด		พทน.		R แยกเบญพาด
24	SW.Load	สับ	ปลด		พทน.		R แยกเบญพาด
25	PTU06S-04	สับ	ปลด		พทน.		DIS ตรงข้ามร้านเจริญยิ่งวิศดุภัณฑ์
26	D/O ชั่วคราว ในไลน์ PTU06	สับ	ปลด		พทน.		D/O ชั่วคราว กม.31
27	<b>ดับไฟในไลน์ PTU01</b>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	PTU01S-08	สับ	ปลด		พทน.		DIS ตรงข้ามร้านเจริญยิ่งวัสดุภัณฑ์
29	ระหว่างจุดตัด DDE ในไลน์ PTU01 ถึง DIS PTU01S-12 ไม่มีโหลด						
30	แจ้ง HL ทำการตัด DDE ในไลน์ PTU01 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
31	เมื่อ HL ทำการตัด DDE ในไลน์ PTU01 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
32	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ชุดทำงาน กฟส.พทน. รับทราบ						
33	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
34	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
35	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3						
36	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4						
37	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G5						
38	เมื่อ กฟส.พทน. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
40	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		
41	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
42	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
43	PTU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
44	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
45	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
46	UTG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
47	เมื่อชุดทำงาน กฟจ.นฐ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามอนุมัติดับไฟข้อที่ 2 และ 3						
48	**งานตามอนุมัติดับไฟข้อที่ 1 หลัง D/O ชั่วคราว กม.31 - สดไลน์ PTU06 ขอดับไฟถึง 17.00 น.**						
49	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
50	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		
51	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
52	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
53	PTU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
54	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
55	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
56	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
57	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G1						
58	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G2						
59	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G3						
60	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G4						
61	เมื่อ กฟส.พทน. ปลด Short Ground ครบทั้ง 4 จุด						
62	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
63	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE ในไลน์ PTU01 เข้าสนิทกันทั้ง 3 เฟส						
64	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE ในไลน์ PTU01 เข้าสนิทกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	PTU06S-04	ปลด	สับ		พทน.		DIS ตรงข้ามร้านเจริญยิ่งวัสดุภัณฑ์
66	PTU01S-08	ปลด	สับ		พทน.		DIS ตรงข้ามร้านเจริญยิ่งวัสดุภัณฑ์
67	ย้ายโหลดวงจร PTU01 กลับจาก PTU02						
68	PTU01S-12	ปลด	สับ		พทน.		DIS ตลาดนัด กม.31 (ข้ามถนน)
69	PTU02S-20	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS สี่แยกดอนตาเพชร
70	ย้ายโหลดวงจร PTU01 กลับจาก UTG01						
71	PTU02S-14	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
72	PTU01S-09	ปลด	สับ		พทน.		DIS หน้าปั้มน้ำมันเบญพาด
73	PTU01S-07	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
74	PTU02S-14	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
75	ย้ายโหลดวงจร PTU06 กลับจาก PTU02						
76	PTU06S-13	ปลด	สับ		พทน.		DIS หน้าปั้มน้ำมันเบญพาด
77	PTU02S-19	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS ตรงข้ามหน้าวัดดอนเตาอิฐ
78	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		
79	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
80	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
81	PTU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
82	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
83	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
84	UTG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
85	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ โหลดหลัง D/O ชั่วคราว กม.31						
86	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G5						
87	เมื่อ กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G5 แล้วเสร็จ						
88	PTU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
89	D/O ชั่วคราว โหลด PTU06	ปลด	สับ		พทน.		D/O ชั่วคราว กม.31
90	SW.Load	ปลด	สับ		พทน.		R แยกเบญพาด
91	PTU06R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		พทน.		R แยกเบญพาด
92	PTU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
93	PTU06R-02	Nonreclosing	Normal		พทน.		R แยกเบญพาด
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

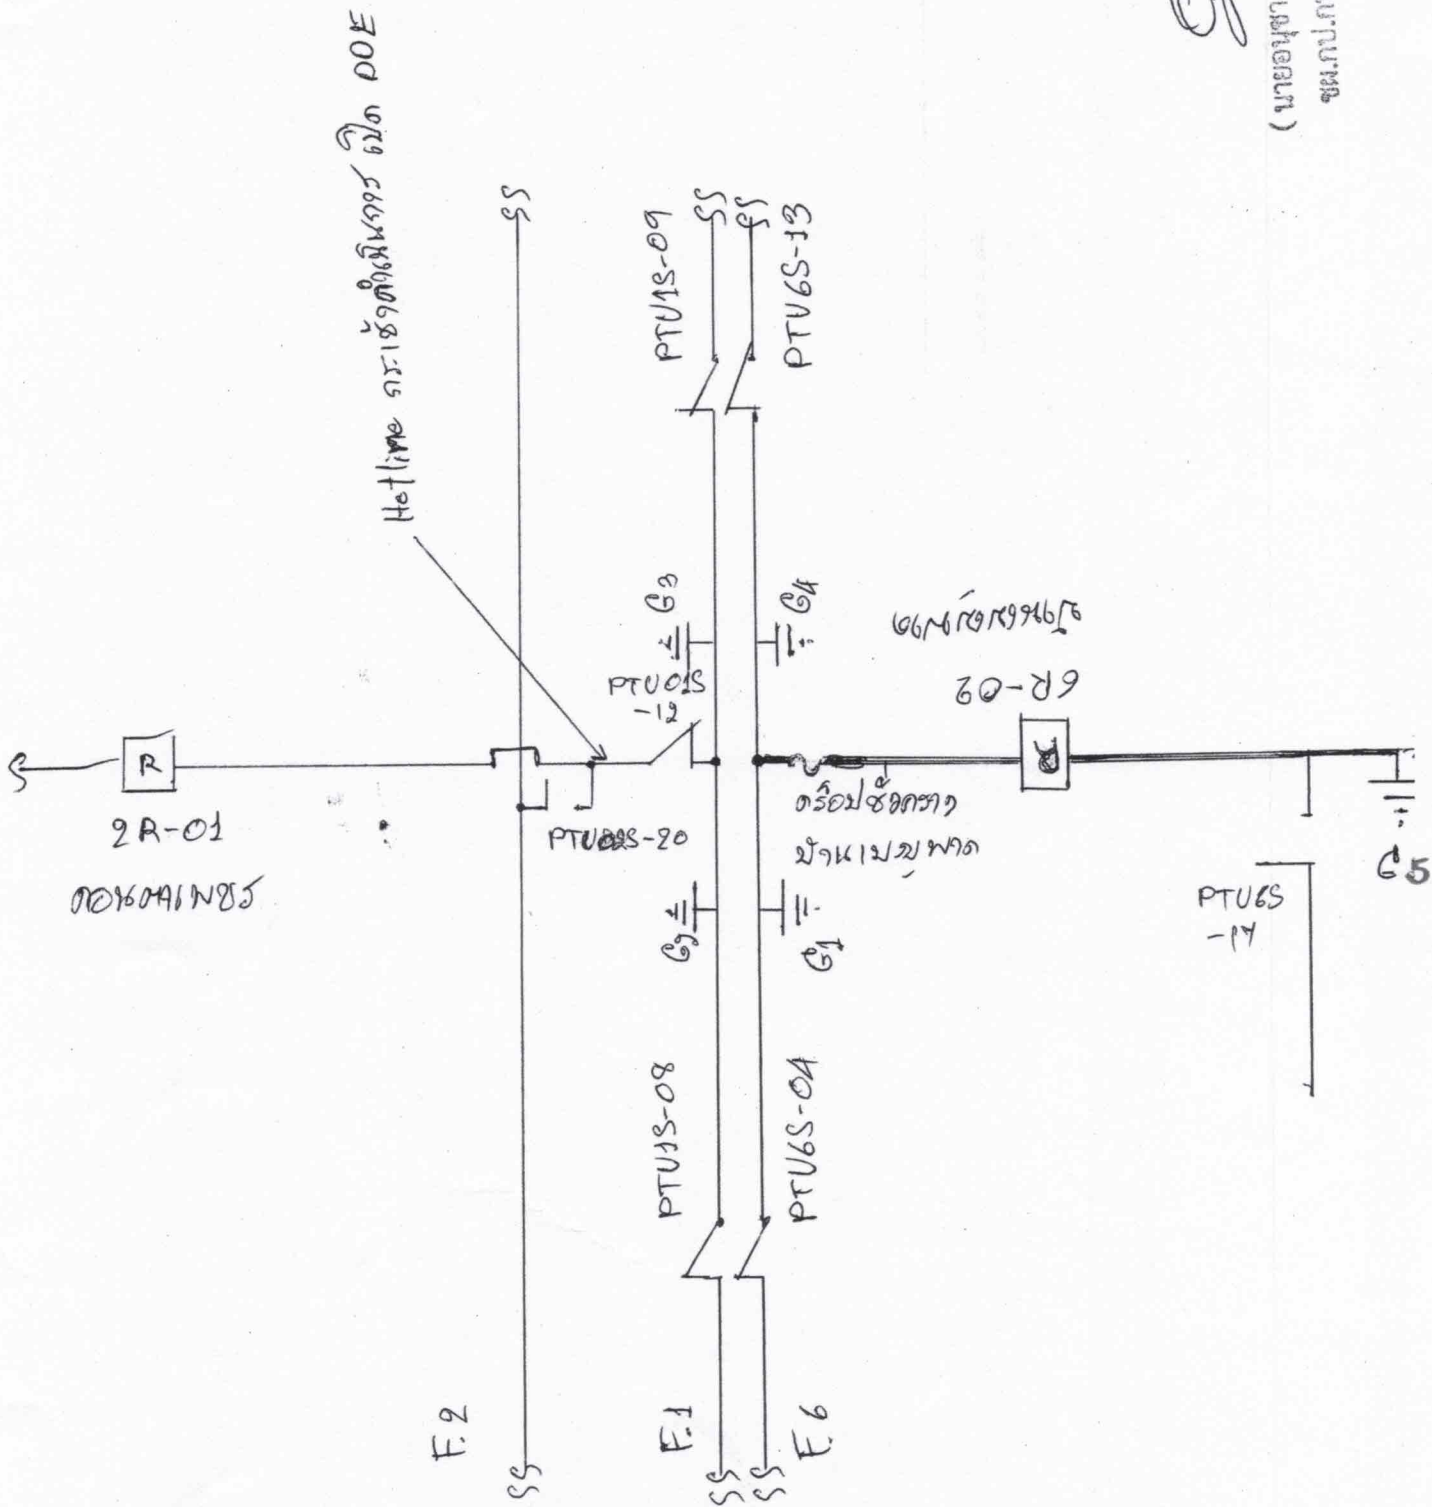

(นายเอก ช่างเครื่อง)  
 อนุ.บ.ทศ.อ.พณ.
