



Switching Deadline

12/02/68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทพันธ์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนและพาดสายแรงสูง หน้าสถานีสพ.๑-สี่แยกแขวงการ
ทาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๘ สพ.๑	๑๕/๐๒/๖๘ 02	๐๗.๓๐	๑๗.๓๐	รื้อถอนและพาดสายแรงสูง SAC๑๘๕ ต.มม. ๒วงจร	SPA๐๘VB-๐๑, SPA๐๘S-๐๒	SPA๐๘S-๐๓, SPA๐๑S-๑๐	นายธนกฤต พวงดอกไม้ โทร.๐๘๑๔๘๑๕๔๑๓
๒.	๑๐ สพ.๑	๑๕/๐๒/๖๘ 02	๐๗.๓๐	๑๗.๓๐	ระยะทางประมาณ ๑.๔ กม.	SPA๑๐VB-๐๑, SPA๑๐S-๐๒	SPA๑๐S-๐๓, SPA๐๙S-๐๔	
๓.	๔ สพ.๑	๑๕/๐๒/๖๘ 02	๐๗.๓๐	๑๗.๓๐		SPA๐๔S-๐๑	SPA๐๔S-๐๒	
๔.	๙ สพ.๑	๑๕/๐๒/๖๘ 02	๐๗.๓๐	๑๗.๓๐		SPA๐๕S-๐๑	DDEจุดA	
๕.	๕ สพ.๑	๑๕/๐๒/๖๘ 02	๐๗.๓๐	๑๗.๓๐		SPA๐๕S-๐๑	SPA๐๕S-๐๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สพ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPA8 จาก SPA8S-01 ถึง SPA8S-02, SPA8S-03, SPA1S-10
ในวันที่ 15 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 283/68
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SPA10 จาก SPA10S-01 ถึง SPA10S-02, SPA10S-03, SPA9S-04
ในวันที่ 15 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 283/68
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SPA4 จาก SPA4S-01 ถึง SPA4S-02
ในวันที่ 15 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 283/68
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ SPA9 จาก SPA9S-01 ถึง DDB๑๑ค
ในวันที่ 15 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 283/68
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ SPAS จาก SPAS-01 ถึง SPAS-02
ในวันที่ 15 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 283/68
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิภาธร วัฒนา ประธานงานการขอดับไฟกับ คุณเอกพร กุศลพงษ์

สุวิงษา
(นางสาวสุวิงษา องค์บุญมาก)
ตล. 5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)
เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3), ผจก. กฟผ. กท.



ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ สุพรรณบุรี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.พ. 68	เวลา	07.30 น.	ถึง เวลา	17.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	283/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.สุกัญชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. น.ส.สุกัญชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-
5	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
6	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	CB	L = 3.2 MW
7	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	CB	L = 2.1 MW
8	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	CB	L = 3.9 MW
9	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	CB	L = 2.6 MW
10	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	CB	L = 5.8 MW
11	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	CB	L = 3.1 MW
12	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	CB	L = 2.3 MW
13	SPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	CB	L = 1.8 MW
14	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	CB	L = 1.1 MW
15	- ย้ายโหลด SPA04 ไปจ่ายจาก SPC04						
16	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.	SF6	สวนหอยมแยกโพธิ์พระยา
17	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	
18	- ย้ายโหลด SPA05 ไปจ่ายจาก SPB07						
19	ตรวจสอบทรักเบรกเกอร์ SPA09VB-01 วาอยู่ในตำแหน่ง inservice						
20	SPA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA	CB	
21	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA	CB	เบรกเกอร์ขนานบัส
22	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.	DIS	loopline อุวัลลภ
23	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	
24	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA	CB	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	- ย้ายโหลด SPA01 (ปัจจุบันรับไฟจาก SPA08) ไปจ่ายจาก SPA03						
26	SPA01S-04	ปลด	สับ		สพ.		DIS ฐาน 59 เฟอรันิเจอร์
27	SPA01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สีแยกแขวงการทาง
28	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		CB เบรกเกอร์ขนานบัส
29	- ย้ายโหลด SPA10 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SPA07						
30	SPA07S-11	ปลด	สับ		สพ.		SF6 บ้านกรวย
31	SPA10S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		SPA		CB ฐานอัมรา
32	- ย้ายโหลด SPA8 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SPB09						
33	SPA08S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 คูเมือง
34	SPA08VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB
35	แจ้งชุดทำงานให้ทำการตรวจสอบ SF6 SPA09S-04 วายอยู่ในตำแหน่ง OPEN และให้ทำการล็อคคาน						
36	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 07.30 น.						
37	SPA10VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB
38	SPA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เชิงสะพานแม่น้ำท่าจีนฝั่งเจ้าทับทิม
39	SPA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อุวัลลภ
40	SPA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หนาสถานีฯ SPA
41	SPA04S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS Pothead F4
42	SPA05S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS Pothead F5
43	SPA08S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS Pothead F8
44	SPA09S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS Pothead F9
45	SPA10S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS Pothead F10
46	แจ้ง Hotline สพ.ทำการตัด DDE ในโลนวงจร SPB07 ได้ (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
47	เมื่อ Hotline สพ.ทำการตัด DDE ในโลนวงจร SPB07 แล้วเสร็จ						
48	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
49	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
50	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
51	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
52	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
53	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
54	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
55	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
56	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-
57	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
58	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB
59	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB
60	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		CB
61	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		CB

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
62	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB	
63	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
64	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>								
65	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
66	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
67	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
68	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3							
69	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4							
70	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			-
71	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			-
72	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB			-
73	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC			-
74	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB	
75	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB	
76	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		CB	
77	SPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		CB	
78	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB	
79	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
80	แจ้ง Hotline สฟ.ทำการจัม DDE ในไลน์วงจร SPB07 ได้ (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)							
81	เมื่อ Hotline สฟ.ทำการจัม DDE ในไลน์วงจร SPB07 แล้วเสร็จ							
82	SPA04S-01	ปลด	สับ		สฟ.		DIS	Pothead F4
83	SPA05S-01	ปลด	สับ		สฟ.		DIS	Pothead F5
84	SPA08S-01	ปลด	สับ		สฟ.		DIS	Pothead F8
85	SPA09S-01	ปลด	สับ		สฟ.		DIS	Pothead F9
86	SPA10S-01	ปลด	สับ		สฟ.		DIS	Pothead F10
87	SPA04S-02	ปลด	สับ		สฟ.		DIS	หนาสถานีฯ SPA
88	SPA05S-02	ปลด	สับ		สฟ.		DIS	อู่วัลลภ
89	SPA08S-03	ปลด	สับ		สฟ.		DIS	เชิงสะพานแม่น้ำท่าจีนฝั่งเจ้าทับทิม
90	- ย้ายโหลด SPA8 (บางส่วน) กลับจาก SPB09							
91	SPA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB	
92	SPA08S-06	สับ	ปลด		สฟ.	SCADA	SF6	คูเมือง
93	- ย้ายโหลด SPA10 (บางส่วน) กลับจาก SPA07							
94	SPA10S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		SPA		CB	ร้านอัมรา
95	SPA07S-11	สับ	ปลด		สฟ.	SCADA	SF6	บ้านกรวย
96	- ย้ายโหลด SPA01 (ปัจจุบันรับไฟจาก SPA08) กลับจาก SPA03							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
97	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		CB	เบรคเกอร์ขนานบัส
98	SPA01S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	สี่แยกแขวงกรทาง
99	SPA01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	ร้าน 59 เฟอร์นิเจอร์
100	- ย้ายโหลด SPA05 กลับจาก SPB07							
101	SPA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB	
102	SPA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB	
103	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	loopline อูวัลลภ
104	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		CB	เบรคเกอร์ขนานบัส
105	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB	
106	- ย้ายโหลด SPA04 กลับจาก SPC04							
107	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB	
108	SPA04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
109	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			-
110	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			-
111	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB			-
112	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			-
113	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB	
114	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB	
115	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB	
116	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB	
117	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB	
118	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB	
119	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		CB	
120	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		CB	
121	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB	
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงาน

เลขที่ ก.๓.คพช.๕พ.(กส) ๒๖๑/๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผัง จำนวน ๒ แผน

ถึง ผจก.กฟส.สพ.

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผจก.กฟส.สพ.

ตามอนุมัติที่ ก.๓สพ.(กส.) ๗๕/๒๕๖๗ ลว ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ให้แผนกก่อสร้างดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปป.สถานี สพ.๑ ถึงแยกแขวง ผัง โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี WBS I-๖๗-I-SPI๖๗.HB.๒๐๐๙ เนื่องจากระบบจำหน่ายไม่สะดวกปลอดภัยในการบำรุงรักษา,เพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟ

ปัจจุบันแผนกก่อสร้าง ได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้

๑. รื้อถอนสาย PIC ขนาด ๑๘๕ มม. ระยะทาง ๘,๐๓๕ เมตร (จำนวน ๒ วงจร) ✓

๒. พาดสาย SAC ขนาด ๑๘๕ มม. ระยะทาง ๘,๐๓๕ เมตร (จำนวน ๒ วงจร) ✓

๓. ปักเสาเข็มไลน์ ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๔. ติดตั้ง DDE จำนวน ๑ จุด ๒ วงจร RM 2 DP.

๕. ปรับแต่งเสาเอนเอียง

๖. ให้ขอทไลน์กระแสเข้า กฟส.สพ ดำเนินการปลดจุดจัม/เชื่อมจุดจัมและช็อตกราวด์

ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. (รายละเอียดตามแผนผังแนบ)

หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ ผบ.กฟส.สพ.ดำเนินการดังนี้

ประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวันเวลาดังกล่าว

ดำเนินการ ดับกระแสไฟฟ้าและช็อตกราวด์ ให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

กชป

(นายกิติน บรรดิษไทย)

พชง.๗ ผกส.กฟส.สพ.

-ผ.ปป.สพ.

ผกส.ขอประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องดับไฟ
เพื่ออนุมัติต่อไป

ส่งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
วันที่.....๑๔..ก.พ..๒๕๖๘.....

(นายธนภุต พวงดอกไม้)

ผ.กส.กฟส.สพ.รักษาการแทน ผ.กส



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.สพ.

ถึง ผจก.กฟส.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.สพ./รจก.กฟส.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๕...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ...๒๕๖๘... ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐-๑๗.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...หน้าสถานีสุพรรณบุรี-สี่แยกแขวงการทาง...เพื่อ...รื้อถอนและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเคอร์ ..๘,๑๐.. สถานีฯ .. สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..หน้าสถานีสุพรรณบุรี-สี่แยกแขวงการทาง

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายธนกฤต พวงดอกไม้ ช.ม.กส.กฟส.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๘๑-๔๘๑๕๔๑๓..เป็นผู้ควบคุมงานและให้ นายพงษ์พัฒน์ ใจตรง ตำแหน่ง พชง.๓.ผจก.กฟส.สพ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๕-๗๑๔๐๗๕๒..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

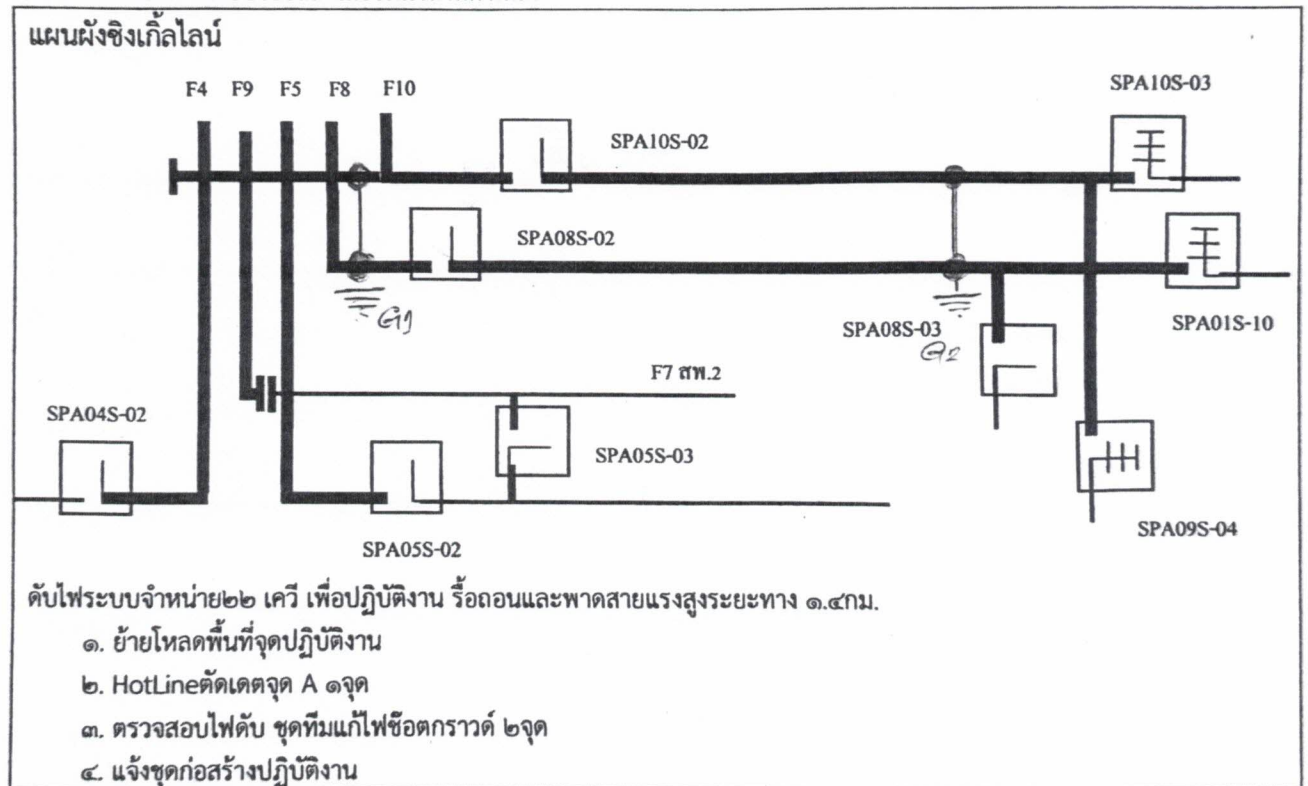

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายพิชิต อุดมรัชการทรัพย์)

ผจก.กฟส.สพ.

(นายสนากร สุวรรณประทีป)

พชง.๖(สช.) ผบ.กฟส.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
