



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

18 ก.พ. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก3.(คฟ) /๒๕๖๗	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง	ตำแหน่ง

ด้วย ก.ปบ.(ก3) มีแผนย้ายโหลดเพื่อลด Loss ในระบบจำหน่าย 22 เควี วงจร KTE02 สถานีฯ กระทุ่มแบน 5 ตามแผนผัง  
สังเขปแนบจำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KTE02	19 ก.พ. 67	08.00 น.	17.00 น.	เช็คเฟสและย้ายโหลดตามแผนผัง การตัดจ่ายใหม่	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย หอระตะ ตำแหน่ง ช.ค.ค. โทร. ๐๘๙-๘๙๒๕๕๖๒

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

เช็คเฟส (17=มีไฟ) 17:00 น. ปิดจ่ายใหม่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KTE02 จาก ถึง

ในวันที่ 19 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 288/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก ถึง

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก ถึง

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก ถึง

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิรุทธิ์ เจริญวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สิทธิชัย หอระตะ

16 ก.พ. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 ก.ปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ นว. กฟภ.๓

(นาย สิทธิชัย หอระตะ)

๐๘๙.๕ แทน ช.ค.ค.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี) -


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สะพานพุทธมณฑลสาคร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.พ. 67	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบป.(ก.3)	งานที่ทำ	ตัดจ่าย KTE02 ใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 288/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<u>พงษ์</u>		วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดก่อนดำเนินการ						
2	ตรวจสอบ DIS KTE03S-11 ,KTE08S-07 เชิงสะพานแม่น้ำท่าจีน อยู่สถานะ OPEN						
3	ตรวจสอบ DIS KTE02S-17 ปากทางวัดอำแพง อยู่สถานะ OPEN						
4	ตรวจสอบ รีโคลสเซอร์ KTE03R-01 สะพานพุทธมณฑลสาคร พร้อม ใบมีด SW.SOURCE,LOAD1,BYPASS อยู่สถานะ OPEN						
5	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
6	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
7	KTE08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
8	KTE03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.		สะพานพุทธมณฑลสาคร
9	- เมื่อพร้อมเช็คเฟส						
10	KTE03S-11	ปลด	สับ		บพว.		DIS เชิงสะพานท่าจีนฝั่ง บพว.
11	KTE08S-07	ปลด	สับ		บพว.		DIS เชิงสะพานท่าจีนฝั่ง บพว.
12	sw.source KTE03R-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS สะพานพุทธมณฑลสาคร
13	KTE03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บพว.		R สะพานพุทธมณฑลสาคร
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน เช็คเฟสที่ sw.load และ sw.bypass Recloser KTE03R-01						
15	เมื่อผู้ควบคุมงาน เช็คเฟสที่ sw.load และ sw.bypass Recloser KTE03R-01 แล้วเสร็จ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน เช็คเฟสที่ DIS KTE02S-17 ปากทางวัดอำแพง						
17	เมื่อผู้ควบคุมงาน เช็คเฟสที่ DIS KTE02S-17 ปากทางวัดอำแพง แล้วเสร็จ						
18	KTE03R-01	สับ	ปลด		บพว.		R สะพานพุทธมณฑลสาคร
19	KTE08S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS เชิงสะพานท่าจีนฝั่ง บพว.
20	- ย้ายโหลดตัดจ่ายใหม่						
21	sw.load KTE03R-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS สะพานพุทธมณฑลสาคร
22	KTE03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บพว.		R สะพานพุทธมณฑลสาคร
23	KTE02S-17	ปลด	สับ		บพว.		DIS ปากทางวัดอำแพง
24	KTE02S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 โรงแรมแสนรักรีสอร์ท
25	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
26	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
27	KTE08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
28	KTE03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.		R สะพานพุทธมณฑลสาคร
สิ้นสุด Switching							

แผนผังติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และตัดตอน พื้นที่ กฟส. สมุทรสาคร, กฟส.สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)

(ก่อนวันที่ 19 ก.พ. 67)

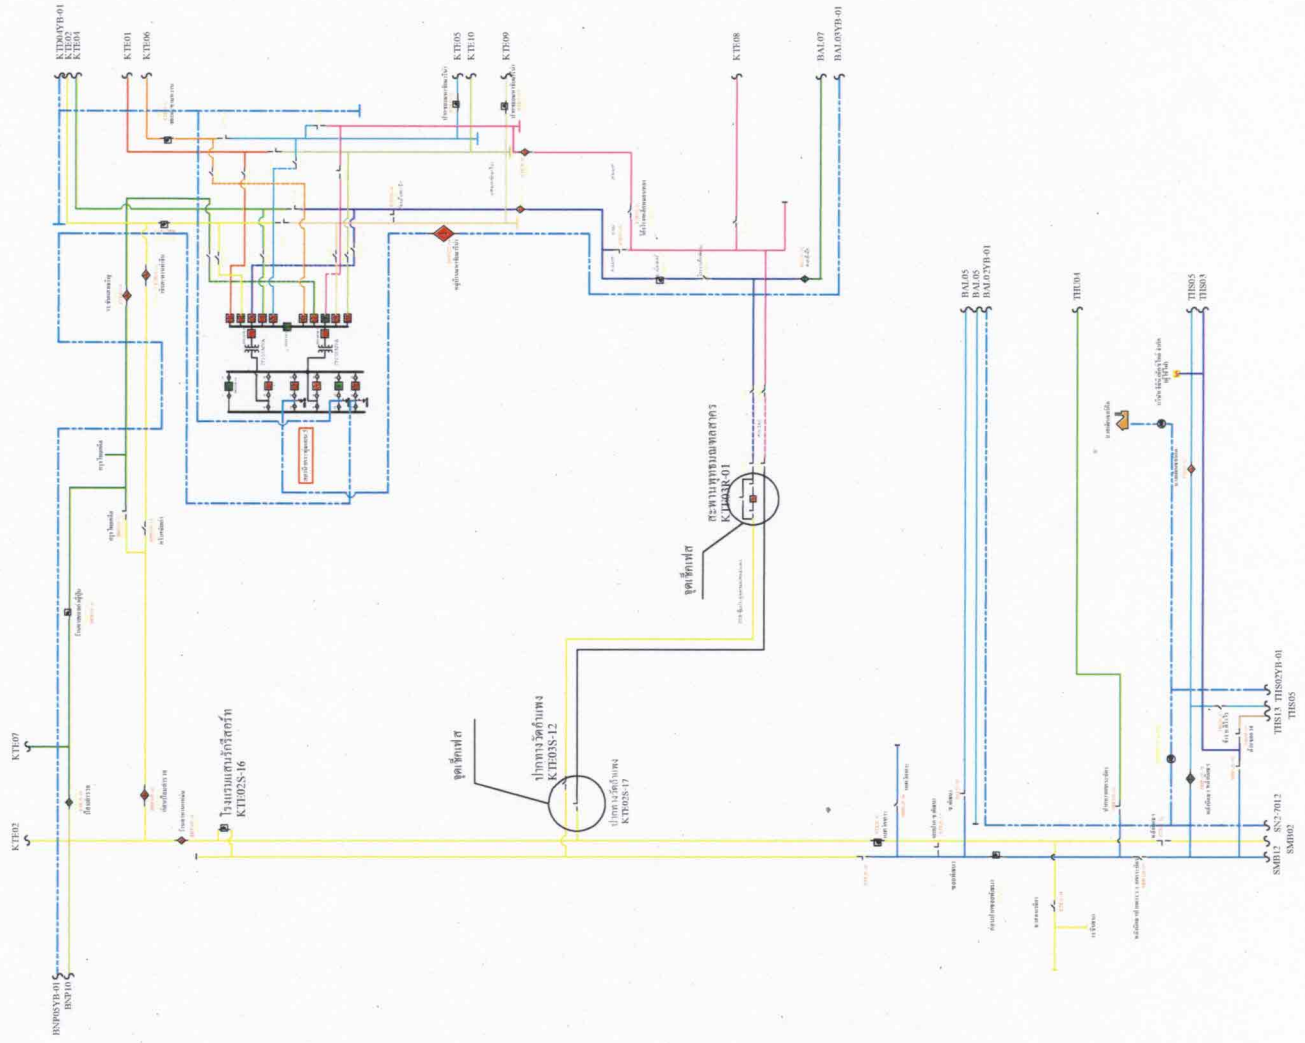

แผนผังติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และตัดตอนพื้นที่ กฟส. สมุทรสาคร, กฟส.สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)

(หลังวันที่ 19 ก.พ. 67)

