



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ป.บ.) ๓๗๓ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอย้ายโหลดระบบ ๒๒ เควี เพื่อแก้ไขจุดร้อน DISCONNECTING ระบบ ๒๒ เควี  
ของสถานี OYK ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK03	๑๘ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอย้ายโหลดเพื่อแก้ไขจุดร้อน	OYK03S-03	-	นายอรรถพล พยับเดช ๐๘๔-๐๕๕-๕๑๘๕
๒.	OYK08	๑๘ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		OYK08S-03	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผ.ขฟ.ที่ได้รับความคิดเห็น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวรัฐวิภา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศว.๖ ผ.บ. โทร. ๐๙๓-๓๕๕-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)  
ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ 0๗๕๐3 จาก 0๗๕35-๐3 ถึง -  
ในวันที่ 18 ก.พ. ๖7 ตั้งแต่เวลา 0๘.3๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๒๙๖/25๖7

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเตอร์ 0๗๕๐๔ จาก 0๗๕๕5-๐3 ถึง -  
ในวันที่ 18 ก.พ. ๖7 ตั้งแต่เวลา 0๘.3๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นางสาว อธิธา ไร่โพธิ์ทอง

(นายพิรภัทร์ ไร่โพธิ์ทอง)  
จก.๔ แทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓ อสมท

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น


ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)



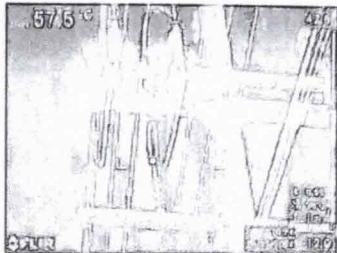
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)




## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS OYK03S-03,OYK08S-03					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.พ. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.อมน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	296/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	16 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แก้ไขจุดร้อน OYK03S-03						
3	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
4	OYK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
5	ย้ายโหลด OYK03 บางส่วนไปจ่ายจาก OYK04						
6	OYK04S-10	ปลด	สับ		อมน.		DIS แพคเตอร์แลนด์ 1 ซอย 2
7	OYK03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ซอยเพลินเพชร
8	ให้ตั้ง MANUAL OYK03,OYK04 ไว้ตลอดขณะปฏิบัติงาน						
9	แจ้งชุด กฟผ.อมน. ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ OYK03S-03 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
10	หลังจากแก้ไขจุดร้อนเสร็จเรียบร้อย						
11	ย้ายโหลด OYK03 บางส่วนกลับจาก OYK04						
12	OYK03S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS ซอยเพลินเพชร
13	OYK04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS แพคเตอร์แลนด์ 1 ซอย 2
14	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
15	OYK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
16	แก้ไขจุดร้อน OYK08S-03						
17	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
18	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
19	OYK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
20	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
21	ย้ายโหลด OYK08 บางส่วนไปจ่ายจาก OYK05						



 ภาวไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <small>REGIONAL ELECTRICAL AUTHORITY</small>	รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน					วันที่ตรวจสอบ <b>22 / 01 / 2567</b>		
	กลุ่มอุปกรณ์: จุดร้อนในระบบจำหน่าย (D-HS)					ZPM4 <b>4006745752</b>		
กฟฟ.	กฟฟ.ฉะเชิงเทรา	สถานีไฟฟ้า	ฉนวนไทย 2 (OYK)	ระบบ	22kV	วงจร	08VB01	
จาก	สถานี	ถึง	OYK08S-03	ระยะทาง (วงจรถ-กบ.)	0.2			
								
ภาพที่ 1 ก่อนการแก้ไข (ภาพจริง)		ภาพที่ 1 ก่อนการแก้ไข (ภาพถ่ายความร้อน)						
<b>รายละเอียดการตรวจสอบ</b>								
หมายเลขเสา / สถานที่	OYK08S-03 หน้า7-11 ตรงข้าม กฟท.ฉะ.				PatrolMan	นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู		
จุดร้อนที่ตรวจสอบพบ	ตำแหน่งจุดร้อน	เฟส	Actual (°C)	Reference (°C)	Temp Rise (°C)	ระดับความรุนแรง		
1. Cable lug (ทางปลา)/Pin Terminal (D-HS-25)	จุดต่อทางปลา	B	57.50	42.60	14.90	ปานกลาง (Fair)		
ข้อแนะนำในการแก้ไข	-							
การดำเนินการ	-							
วิธีการแก้ไข	Contact Resistance (μΩ)		Temp (°C)		ZPM2	ผู้ดำเนินการ		
	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข				
1.	0.00	0.00	14.90	0.00		น.ส.ฐิษา วัฒนโพธิทอง		

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ELECTRICITY AUTHORITY	<b>รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้า          ส่วนกึ่งกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</b>					<b>วันที่ตรวจสอบ</b> 22 / 01 / 2567 <b>ZPM4</b> 4006745749	
	<b>กลุ่มอุปกรณ์: จุดเชื่อมโยงบัสบาร์ (D-HV)</b>						
กฟฟ.	กฟฟ.ลพบุรี	สถานีไฟฟ้า	คอกใหญ่ 2 (OYK)	ระบบ	22kV	วงจร	03/801
จาก	สถานี	ถึง	OYK03S-03	ระยะทาง (ว.จ.จ.-กม.)	0.1		
							
ภาพที่ 1 ก่อนการแก้ไข (ภาพจริง)		ภาพที่ 1 ก่อนการแก้ไข (ภาพถ่ายความร้อน)					
<b>รายละเอียดการตรวจสอบ</b>							
หมายเลขเสา / สถานี	ทางเข้าชุมชนประจูดวัดเพณิณเพชร				PatrolMan	นายเกียรติศักดิ์ ชวชาญ	
จุดร้อนที่ตรวจสอบพบ	ตำแหน่งจุดร้อน	เฟส	Actual (°C)	Reference (°C)	Temp Rise (°C)	ระดับความรุนแรง	
1. Cable lug (ทางปลา)/Pin Terminal (D-HS-25)	จุดต่อทางปลา	A	60.20	40.00	20.20	ป (Poor)	
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข	-						
การดำเนินการ	-						
วิธีการแก้ไข	Contact Resistance (μΩ)		Temp (°C)		ZPM2	ผู้ดำเนินการ	
	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข			
1.	0.00	0.00	20.20	0.00		น.ส.ฐิษา รมโพธิ์ทอง	
