



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปบ.) **๗๗๕** /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณพิศล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิศร แก้วสินธุ์

Switching Deadline

21 ก.พ. 67

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.น.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย ๕ ถาวร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB04	๒๕ ก.พ. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย ๕ ถาวร	DIS ชั่วคราว สวนกล้วยไม้ (ฝั่งONB)	ONB04S-04 ONB04S-05	นายบัญชา พุกอาษา ๐๘๔-๗๐๓-๘๒๕๓
๒.	ONB05	๒๕ ก.พ. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราว สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)	DIS ชั่วคราว โรงรับจำนำ (ฝั่งตรงข้าม ONB)	
๓.	ONB08	๒๕ ก.พ. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราว สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)	ONB08S-06 ONB08S-04	
๔.	ONB09	๒๕ ก.พ. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราว สวนกล้วยไม้ (ฝั่งONB)	ONB09S-02 ONB09S-03	
๕.	ONB10	๒๕ ก.พ. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONB10S-02	ONB10S-03 ONB04S-06 ONB10S-04 ONB10S-05 ONB10S-07 ONB10S-06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ขอขยโรงรับจำนำสวนหลวง,ปทุม ปตท.ขาเข้าเพชรเกษม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พงจ.๒ ผปบ. โทร. ๐๖๓-๒๔๑-๔๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิศร แก้วสินธุ์)
ผจก. กฟส.อ้อมน้อย

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ONB045-04

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ ONB04 จาก Dis ๕๓ สหกรณ์แม่ไร่ ถึง ONB045-05
ในวันที่ 25 ก.พ. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 306/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ ONB05 จาก Dis ๕๓ สหกรณ์แม่ไร่ ถึง Dis ๕๓ โรงจมน้ำ (ตรงข้าม ONB)
ในวันที่ 25 ก.พ. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๐16 ๕๓ สหกรณ์แม่ไร่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ ONB08 จาก Dis ๕๓ สหกรณ์แม่ไร่ ถึง ONB085-06
ในวันที่ 25 ก.พ. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๕๓ สหกรณ์แม่ไร่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พิดเตอร์ ONB09 จาก Dis ๕๓ สหกรณ์แม่ไร่ ถึง ONB095-02
ในวันที่ 25 ก.พ. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๕๓ สหกรณ์แม่ไร่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พิดเตอร์ ONB10 จาก ONB105-02 ถึง ONB045-06 , ONB095-07
ในวันที่ 25 ก.พ. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๕๓ สหกรณ์แม่ไร่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิรัชชา วัตต์บุญมงคล ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู
2๐ ก.พ. ๖7

วิรัชชา วัตต์บุญมงคล
(นางสาววิรัชชา วัตต์บุญมงคล)
จตภ.๔ ๓๓๖ นผ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ้อมน้อย

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

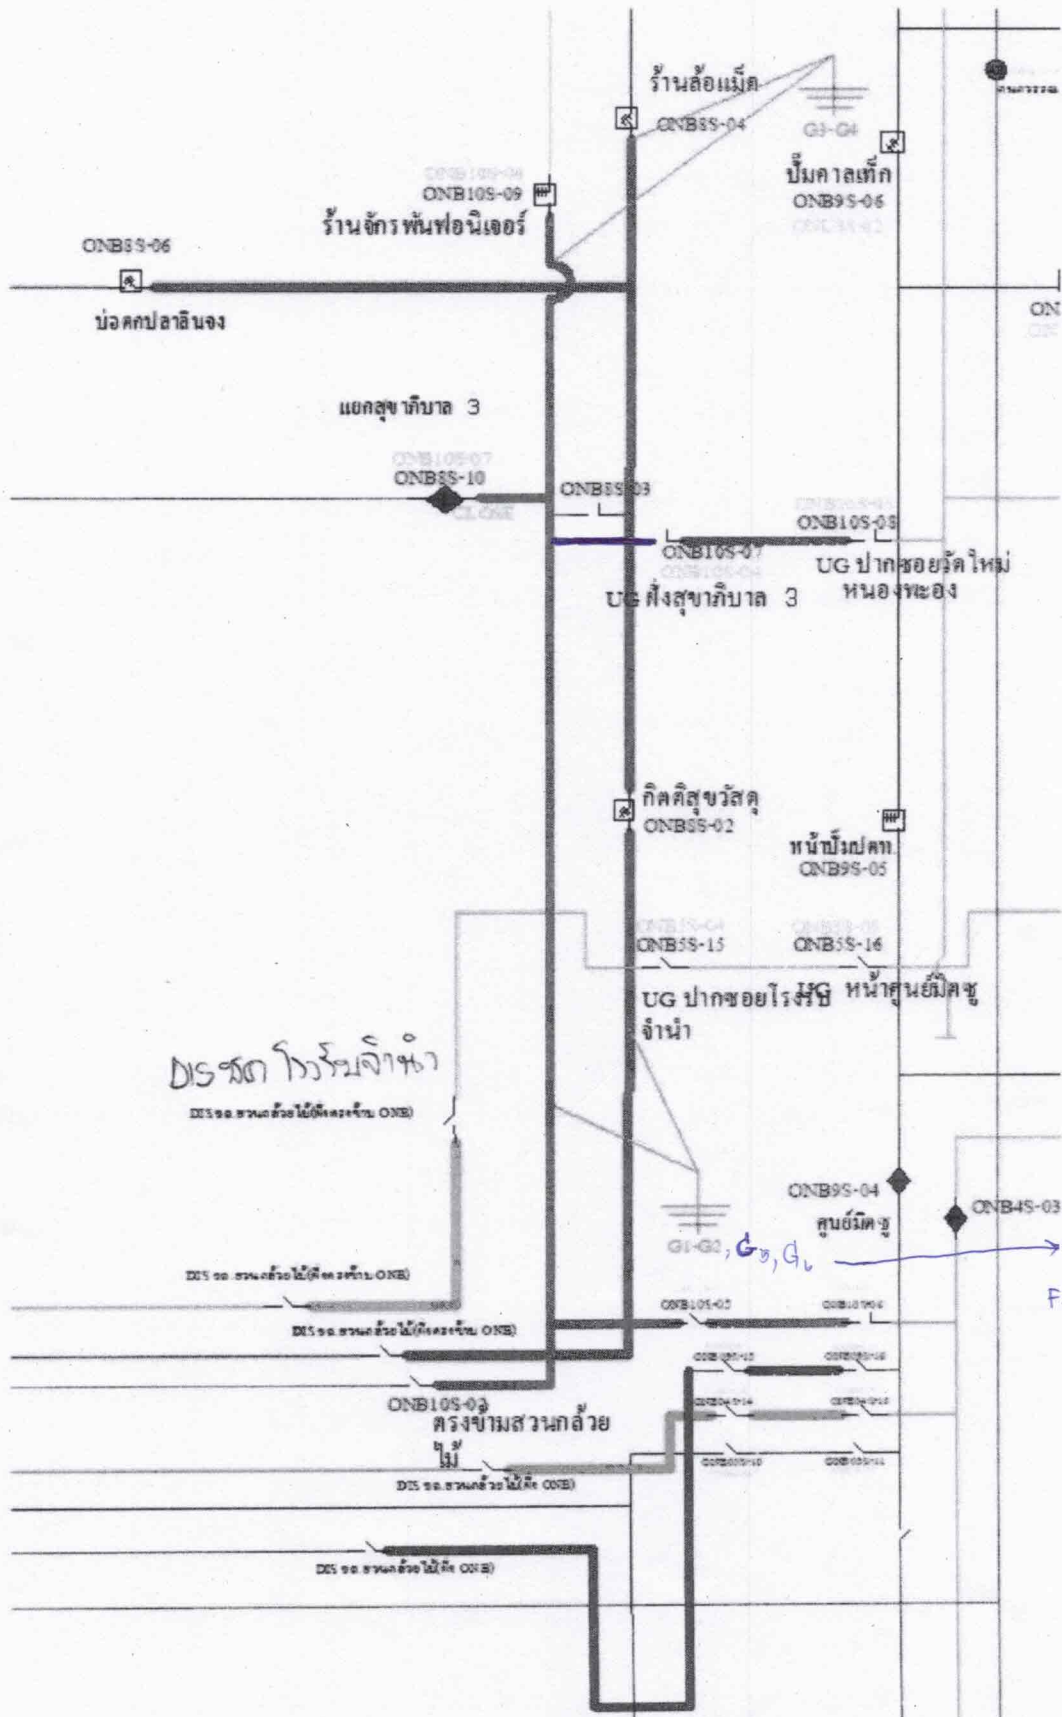
1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 5 (ถาวร) (ONB04,05,08,09,10,ONU02)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.พ. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมน.	งานที่ทำ	ก่อสร้างสายส่ง 115 เครือ รองรับสถานีฯ อ้อมน้อย 5 (ถาวร) ตามใบขอปฏิบัติงาน 306/2567				
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนี (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	
3	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	
4	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		Load = 2.61 MW
5	ONB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		Load = 1.85 MW
6	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		Load = 0.61 MW
7	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		Load = 0.68 MW
8	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		Load = 3.31 MW
9	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	
10	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	" Auto Reclose		ONA		Load = 2.68 MW
11	ONU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONU	-	
12	ONU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		Load = 1.53 MW
13	ONU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		Load = 1.66 MW
14	ONU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		Load = 0.21 MW
15	ย้ายโหลด ONB09 บางส่วนไปรับไฟจาก ONU03						
16	ONB10S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6 จักรกัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
17	ONB09S-05	ปลด	สับ		อมน.		SF6 หน้าปัด ปตท.
18	ONB09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
19	ย้ายโหลด ONB05 บางส่วนไปรับไฟจาก ONU05						
20	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB	-	ขนานบัส
21	ONB05S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ก่อนแยกวัดใหม่หนองพะอง
22	Dis ไลน์ ONB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชั่วคราวโรงรับจำนำ
23	ย้ายโหลด ONB04 บางส่วนไปรับไฟจาก ONU05						
24	ONB04S-03	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 เอ็นวียานยนต์
25	ONB04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
26	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB	-	ขนานบัส
27	ONB10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 จักรกัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
28	ย้ายโหลด ONB08 และ ONB10 บางส่วนไปรับไฟจาก ONA09						
29	ONA09S-14	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	ONA09S-08	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ปากซอยสุขาภิบาล 3 ผังเพชรเกษม
31	OND09S-09	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยสุขาภิบาล 3 ผังเพชรเกษม
32	ONB10S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SCADA	SF6	ปาก ซ.สุขาภิบาล 3 ผังสาย ง.
33	ONB08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	บ่อปลาจีน
34	ONB08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	ร้านล้อแม็ก
35	ตรวจสอบ Dis. UG ONB10S-04,05 และ ONB04S-06 อยู่สถานะ ปลด							
36	เมื่อพร้อมดับไฟ							
37	Dis. โลว์ ONB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)
38	Dis. โลว์ ONB08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)
39	ONB10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ตรงข้ามสวนกล้วยไม้
40	Dis. โลว์ ONB09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)
41	Dis. โลว์ ONB04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)
42	ONB04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
43	ONB09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
44	ONB10S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
45	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
46	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1							
47	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2							
48	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3							
49	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G4							
50	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G5							
51	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G6							
52	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
53	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB			
54	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB			
55	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
56	ONB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
57	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
58	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
59	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
60	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA			
61	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA			
62	ONU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONU			
63	ONU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU			
64	ONU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU			
65	ONU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU			
66	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้							
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****								

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
68	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
69	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
70	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G3						
71	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G4						
72	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G5						
73	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G6						
74	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
75	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
76	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
77	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
78	ONB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
79	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
80	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
81	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
82	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
83	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
84	ONU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONU		
85	ONU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		
86	ONU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		
87	ONU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		
88	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
89	Dis. โลน ONB05	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS ชค. สวณกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)
90	Dis. โลน ONB08	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS ชค. สวณกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)
91	ONB10S-02	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS ตรงข้ามสวณกล้วยไม้
92	Dis. โลน ONB09	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS ชค. สวณกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)
93	Dis. โลน ONB04	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS ชค. สวณกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)
94	ONB04S-04	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
95	ONB09S-02	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
96	ONB10S-03	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
97	ย้ายโหลด ONB08 และ ONB10 บางส่วนกลับจาก ONA09						
98	ONB10S-07	ปลด	ล๊ับ		อมน.	SCADA	SF6 ปาก ช.สุขาภิบาล 3 ฝั่งสาย ง.
99	ONB08S-06	ปลด	ล๊ับ		อมน.		SF6 บ่อปลาหินจง
100	ONB08S-04	ปลด	ล๊ับ		อมน.		SF6 รั้วล้อแม็ก
101	OND09S-09	ปลด	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 3 ฝั่งเพชรเกษม
102	ONA09S-08	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ปากซอยสุขาภิบาล 3 ฝั่งเพชรเกษม
103	ONA09S-14	ล๊ับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG
104	ย้ายโหลด ONB09 บางส่วนกลับจาก ONU03						
105	ONB10S-06	ปลด	ล๊ับ		อมน.		SF6 จักรกัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
106	ONB09S-03	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
107	ONB09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	หน้าบีม ปตท.
108	ย้ายโหลด ONB05 บางส่วนกลับจาก ONU05							
109	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		-	ขนานบัส
110	Dis. โลจน์ ONB05	ปลด	สับ		อมน.		Dis	ชั่วคราวโรงรับจำนำ
111	ONB05S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ก่อนแยกวัดใหม่หนองพะอง
112	ย้ายโหลด ONB04 บางส่วนกลับจาก ONU05							
113	ONB04S-05	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
114	ONB04S-03	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	เอ็นวียานยนต์
115	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		-	ขนานบัส
116	ONB10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	จักรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
117	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB			
118	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB			
119	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
120	ONB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
121	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
122	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
123	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
124	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA			
125	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA			
126	ONU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONU			
127	ONU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU			
128	ONU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU			
129	ONU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU			
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								



DIS ชุด 100 โวลท์/100 วัตต์
(ใช้สำหรับ ONB)

Short ground
 F4, F5, F8, F10
