



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.คช.(กป)๑๓๗/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

วันที่ ๒๐.ก.พ. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน ซีที แบ่งแดน ที่ชำรุด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.9 สถานี ด่านช้าง	21ก.พ.2567	10.00	12.00	สับเปลี่ยนซีทีแบ่ง แดน ที่ชำรุด ไร่ทรัพย์ทวี(เร่งด่วน)	DAA09S-24 ไร่ทรัพย์ทวี	BOU01S-09 สี่แยกหนองผักแว่น	นายปรัชญา สว่างศรี พงษ.๖ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร ๐๙๕- ๕๙๖๗๕๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตติวิไลค์ ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร๐๙๕-๕๖๓๕๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ MA9 จาก MA9S-24 ถึง BOU1S-09
ในวันที่ 21 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 312/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย รัชศาสตร์ ฉิมทิน

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนาเดช กิตติวิไลค์

(นายธนาเดช กิตติวิไลค์)

๒๐.๒.๖๖ ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๐๖, กฟย.พร.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

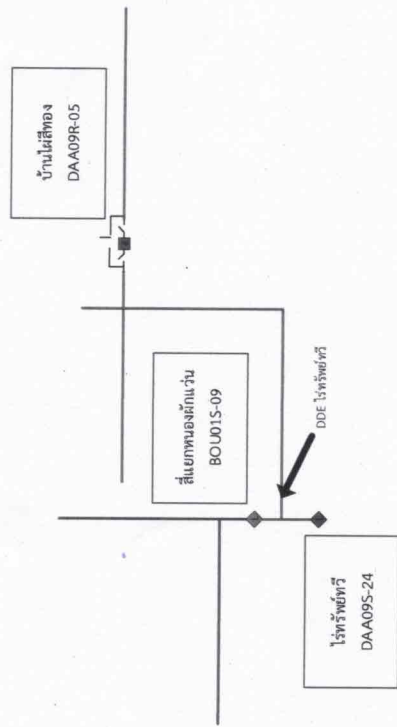
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DAA09S-24(ไร่ทรัพย์ทวี)-BOU1S-09(สี่แยกหนองผักแว่น)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.พ. 67	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยนซีทีแบ่งแดนที่ชำรุด	ตามใบขอปฏิบัติงาน	312/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมน โทง (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ทุงแสม
3	DAA09R-01	Normal	Non-Reclosing		ดช.		AVR ทุงแสม
4	DAA09R-03	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดช.		R ปลักประตู
5	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		- -
6	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		- -
7	BOU01R-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		หปร.		R หนองขอน
8	*ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนไปรับไฟจาก BOU01*						
9	BOU02S-05	ปลด	สับ		หปร.	SCADA	SF6 ปลักประตู
10	DIS BOU01-DAA09	ปลด	สับ		ดช.		DIS บีม่วงเด้า
11	DAA09S-24	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS ไร่ทรัพย์ทวี
12	BOU02S-05	สับ	ปลด		หปร.	SCADA	SF6 ปลักประตู
13	แจ้ง กฟส.ดช. ตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส BOU1S-09(สี่แยกหนองผักแว่น) อยู่สถานะปลดโซ่ OPEN และให้ดำเนินการถอดคาน						
14	เมื่อพร้อม ปลด DDE(ไร่ทรัพย์ทวี) เวลา 10.00 น.						
15	แจ้ง กฟส.ดช. โหลดหม้อแปลง ตั้งแต่ DAA9S-24(ไร่ทรัพย์ทวี)- BOU1S-09(สี่แยกหนองผักแว่น)						
16	หลังจาก กฟส.ดช. โหลดหม้อแปลง ตั้งแต่ DAA9S-24(ไร่ทรัพย์ทวี)- BOU1S-09(สี่แยกหนองผักแว่น) แล้วเสร็จ						
17	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ Hotline ปลด DDE วงจร DAA09 บริเวณไร่ทรัพย์ทวี ออกทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ)						
18	หลังจาก กฟส.ดช. ให้ Hotline ปลด DDE วงจร DAA09 บริเวณไร่ทรัพย์ทวี ออกทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ) แล้วเสร็จ						
19	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ดช. รับทราบพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยและปฏิบัติงานได้(ปฏิบัติงานโดย Hotline ไม่มีชื่อตกราวด์)						
20	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ทุงแสม
21	DAA09R-01	Non-Reclosing	Normal		ดช.		AVR ทุงแสม
22	DAA09R-03	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดช.		R ปลักประตู
23	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		- -
24	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		- -
25	BOU01R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal		หปร.		R หนองขอน
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
26	หลังจาก กฟส.ดช. ปฏิบัติแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
28	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ทุงแสม
29	DAA09R-01	Normal	Non-Reclosing		ดช.		AVR ทุงแสม
30	DAA09R-03	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดช.		R ปลักประตู่
31	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		- -
32	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		- -
33	BOU01R-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		หปร.		R หนองซอน
34	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ Hotline เชื่อม DDE วงจร DAA09 บริเวณไร่ทรัพย์ทวี เข้าทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ)						
35	หลังจาก กฟส.ดช. ให้ Hotline เชื่อม DDE วงจร DAA09 บริเวณไร่ทรัพย์ทวี เข้าทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ) แล้วเสร็จ						
36	แจ้ง กฟส.ดช. นำโหลดหม้อแปลง ตั้งแต่ DAA9S-24(ไร่ทรัพย์ทวี)- BOU1S-09(สี่แยกหนองผักแว่น)						
37	หลังจาก กฟส.ดช. นำโหลดหม้อแปลง ตั้งแต่ DAA9S-24(ไร่ทรัพย์ทวี)- BOU1S-09(สี่แยกหนองผักแว่น) แล้วเสร็จ						
38	*ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนกลับคืนจาก BOU01*						
39	BOU02S-05	ปลด	สับ		หปร.	SCADA	SF6 ปลักประตู่
40	DAA09S-24	ปลด	สับ		ดช.		DIS ไร่ทรัพย์ทวี
41	DIS BOU01-DAA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS บีม่วงเฒ่า
42	BOU02S-05	สับ	ปลด		หปร.	SCADA	SF6 ปลักประตู่
43	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ดำเนินปลดล๊อคคาน SF6 รหัส BOU1S-09(สี่แยกหนองผักแว่น)						
44	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ทุงแสม
45	DAA09R-01	Non-Reclosing	Normal		ดช.		AVR ทุงแสม
46	DAA09R-03	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดช.		R ปลักประตู่
47	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		- -
48	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		- -
49	BOU01R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal		หปร.		R หนองซอน
	สิ้นสุด Switching						

แผนผังงานดับไฟสลับเปลี่ยนซีทีแบ่งแดนชั่วคราว บริเวณโทรศัพท์
(เร่งด่วน) ก่อนดับไฟ



แผนผังงานดับไฟสลับเปลี่ยนซีทีแบ่งแดนชาร์ต บริเวณไร่ทรัพย์ทวี
(แรงดัน) หลังดับไฟ

