



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

14 ก.พ. 68

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๖๓๓ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอ่ำไพ

วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายและติดตั้ง DIS รหัส SMO๐๔S-๐๗ บริเวณ หน้าโครงการ อยู่เจริญท่าจีน (เลยคร้ววังกะพง) ตามแผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๑๓	๑๖ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย และติดตั้ง DIS รหัส SMO๐๔S-๐๗ บริเวณ หน้าโครงการอยู่เจริญ ท่าจีน (เลยคร้ววังกะพง)	SMB๑๓S-๐๖ ปากซอยคลอง ชลประทาน	SMB๑๓S-๐๗ คร้ววังกะพง	นายจิรวัฒน์ บุญ พร้อม โทร. ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	SMB๑๓	๑๖ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๓S-๐๖ ปากซอยคลอง ชลประทาน	SMB๑๓S-๐๘ เขเว้นปากทาง นิคมฯ	
๓	SMB๑๓	๑๖ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๓S-๐๖ ปากซอยคลอง ชลประทาน	SMB๑๓S-๐๙ ตรงข้าม บ.จงไทย	
๔	SMB๑๓	๑๖ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๓S-๐๖ ปากซอยคลอง ชลประทาน	SMB๑๓S-๑๐ ก่อนถึงหมู่บ้านสัน ธร	
๕	SMK๐๓	๑๖ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMK๐๓S-๐๔ ก่อนคร้ววังกะพง	SMB๑๓S-๐๗ คร้ววังกะพง	
๖	SMK๐๓	๑๖ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMK๐๓S-๐๔ ก่อนคร้ววังกะพง	ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ตั้งแต่ปากทางนิคมฯอยู่เจริญถึง ปากทางคลองชลประทาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พช.๖ โทร. ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายวิโรจน์ เอกอ่ำไพ)


ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMB13 จาก SMB175-06 ถึง SMB175-07
ในวันที่ 16 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 323/68
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMB17 จาก SMB175-06 ถึง SMB175-08
ในวันที่ 16 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SMB19 จาก SMB175-06 ถึง SMB175-09
ในวันที่ 16 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ SMB17 จาก SMB175-06 ถึง SMB175-10
ในวันที่ 16 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ SMK02 จาก SMK035-04 ถึง SMB175-07
ในวันที่ 16 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 ฟีดเดอร์ SMK03 จาก SMK035-04 ถึง 2/ขสาย
ในวันที่ 16 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กัทธีร์ เลมมิ่ง ประสานงานการขอดับไฟกับ นายจิรวิวัฒน์ ขจรพริ้ม
12 ก.พ. 66


(นายกนก งามดีโพธิ์)
กคก 7 ปฏิบัติงาน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓-๕๐

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... 2 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

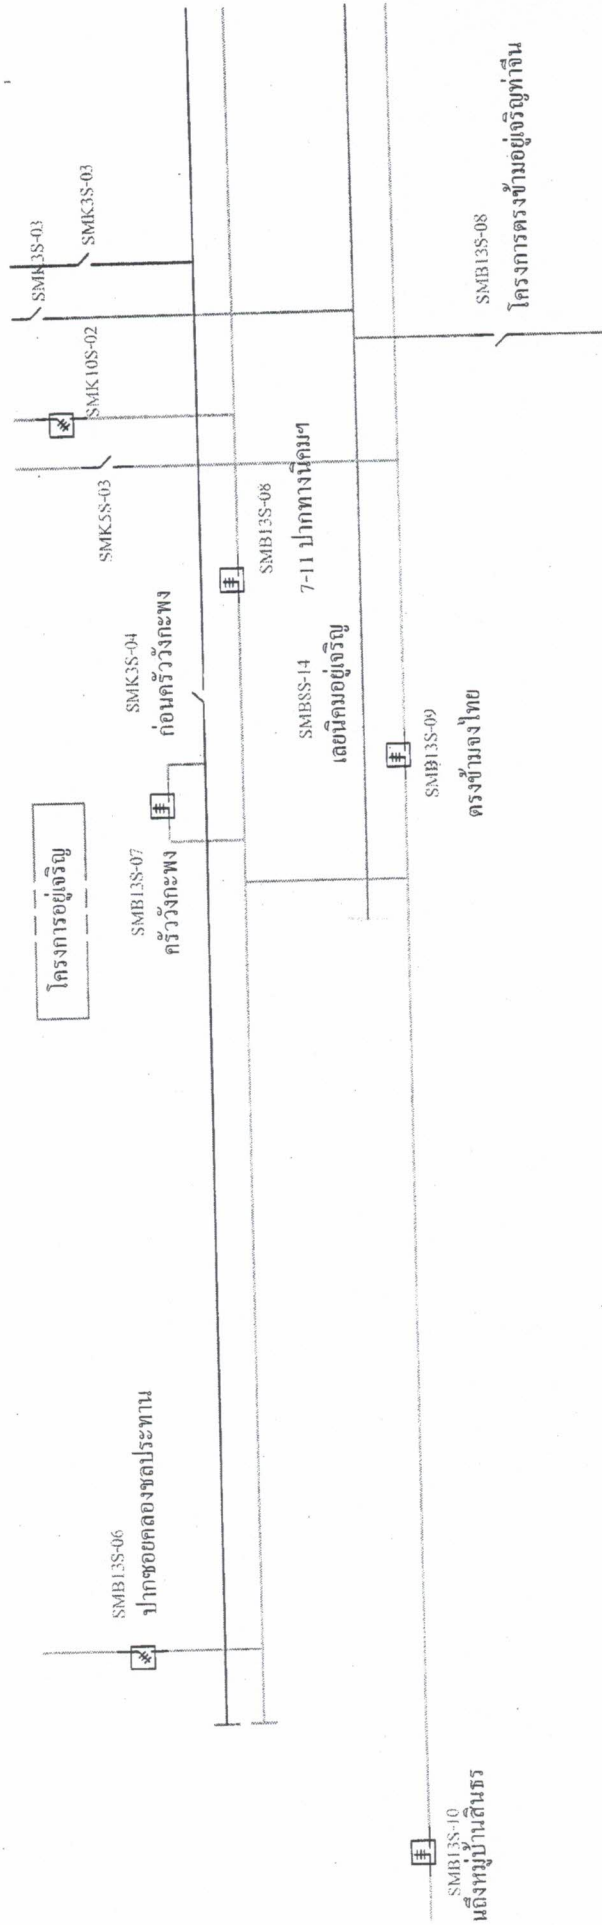

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ครีววังกะพง				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.พ. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายและติด DIS เพิ่ม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	323/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	12 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกัษษา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ SF6 SMB13S-08 หน้าเซเวนปากทางนิคม อยู่สถานะ OPEN+Lockคาน						
3	ตรวจสอบ SF6 SMB13S-09 ตรงข้าม บ.จกไทยเคมีคอล อยู่สถานะ OPEN+Lockคาน						
4	ตรวจสอบ SF6 SMB13S-10 เลยกชอยคคลองชลประทาน อยู่สถานะ OPEN+Lockคาน						
5	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
6	SMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	SMK03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สค.		DIS ก่อนครีววังกะพง
9	SMB13S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากชอยคคลองชลประทาน
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
13	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
15	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
16	SMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ (ตรวจสอบ DIS ติดตั้งใหม่จนจ่ายไฟ = C (case))						
18	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
19	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
20	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
21	SMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	SMK03S-04	ปลด	สับ		สค.		DIS ก่อนครีววังกะพง
24	SMB13S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากชอยคคลองชลประทาน
25	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
26	SMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน



สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

