



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) ๔๐๕ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หິงสุวรรณ

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เป็น SF6 ตามแผนผังสังเขปแนบ

จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SPN4	1 มี.ค.67	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เป็น SF6	SPN4S-05	SPN4S-07 จุดปลดบั๊กอาร์ม	นายบุญฤทธิ์ พันธิบุตร พง.6 ผจก.กฟอ.บางเลน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ริมแม่น้ำท่าจีน

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ท.ป.บ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หິงสุวรรณ)

ผจก.กฟอ.บางเลน

หมายเหตุ ขอตัดไฟแบบแรงดัน เนื่องจากส่วนเกี่ยวข้องพร้อมในวันนี้

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPN4 จาก จุดปลดสวิตช์ที่ทางท.ร.ง.บางเลน ลง ถึง จุดปลดสวิตช์ที่สำนักงาน ท.ค.ก.บ.ท่าจีน
ในวันที่ 1 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 335/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มิธดา พงษ์ศิริ ประสานงานขอตัดไฟกับ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์
28 ก.พ. 67

(นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์)
จก.สทค.บ.บ.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บางเลน

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2แผ่น

แผนผังแนบ..... 1แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสอพงค์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ปากทาง ม.4 บางหลวง (SPN04S-05)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 1 มี.ค. 67 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บล. งานที่ทำ เปลี่ยน Dis เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 335/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		Load = 1.04 MW
3	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		Load = 1.01 MW
4	ย้ายโหลด SPN04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPN05						
5	SPN04S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บลง.	SF6	มิเตอร์จุดแบ่งเขต (SPN04)
6	SPN04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.	DIS	ปากทาง ม.4 บางหลวง
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	แจ้ง กฟอ.บล. ทำการไลน์โหลดตั้งแต่ จุดปลดสายปากทางม.4 บางหลวง - จุดปลดสายเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน						
9	เมื่อ กฟอ.บล. ทำการไลน์โหลดตั้งแต่ จุดปลดสายปากทางม.4 บางหลวง - จุดปลดสายเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน แล้วเสร็จ						
10	แจ้งขอทไลน์ทำการปลดสายปากทางม.4 บางหลวง (ตามผังแนบ)						
11	เมื่อขอทไลน์ทำการปลดสายปากทางม.4 บางหลวง แล้วเสร็จ						
12	แจ้งขอทไลน์ทำการปลดสายเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (ตามผังแนบ)						
13	เมื่อขอทไลน์ทำการปลดสายเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน แล้วเสร็จ						
14	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟอ.บล. รับทราบ						
15	แจ้ง กฟอ.บล. ทำการทดสอบพร้อมช็อตกราว จุด G1,G2						
16	แจ้ง กฟอ.บล. We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
17	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
18	SPN05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อ กฟอ.บล. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
20	แจ้ง กฟอ.บล. ทำการปลดช็อตกราว จุด G1,G2						
21	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
22	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
8	ตรวจสอบสถานะ SF6 ปากทาง ม.4 บางหลวง ติดตั้งใหม่ SPN04S-05 สถานะ "OPEN+LOCK"						
23	แจ้งขอทไลน์ทำการเชื่อมสายปากทางม.4 บางหลวง (ตามผังแนบ)						
24	เมื่อขอทไลน์ทำการเชื่อมสายปากทางม.4 บางหลวง แล้วเสร็จ						
25	แจ้งขอทไลน์ทำการเชื่อมสายเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (ตามผังแนบ)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อขอทโหนดทำการเชื่อมสายเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน แล้วเสร็จ						
27	ย้ายโหลด SPN04 บางส่วนกลับจ่ายไฟจาก SPN05						
28	SPN04S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บลง.	SF6	ปากทาง ม.4 บางหลวง
29	SPN04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บลง.	SF6	มิเตอร์จุดแบ่งเขต (SPN04)
30	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
31	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

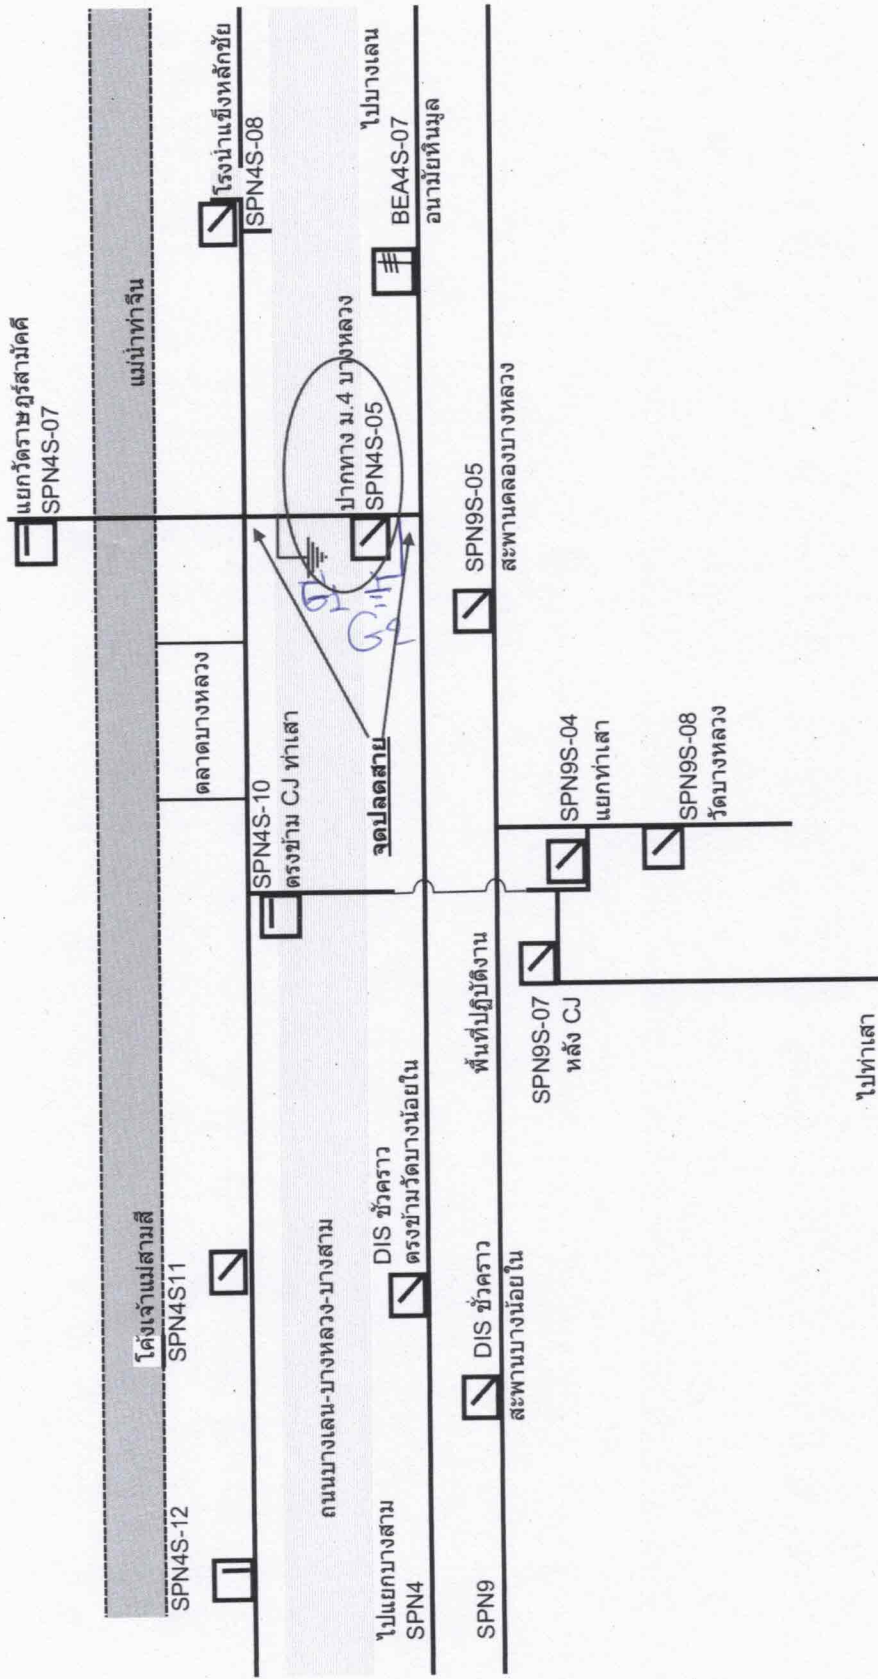

ผังดับไฟ 22 kV. วันที่ 1 มีนาคม 2567
