



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

2 มี.ค. 67

เลขที่ ก.๓ กฟส.กทบ.(ปบ) - ๐๓๖/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอน ชนิด SF6 เพื่อทดแทน รหัสอุปกรณ์ KTA05S-10 ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTA ๐๕, KTA ๑๐, KTB ๐๒, KTB ๐๖	๓ มี.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	สับเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอน ชนิด SF6 เพื่อทดแทน รหัสอุปกรณ์ KTA05S-10	ก่อนทางแยกเข้าถ.สค. 4009 (ถ.แคราย)	ฝั่งตรงข้ามซอยผู้ใหญ่ถึก (รหัสอุปกรณ์ KTA10S - 09) และ ฝั่งตรงข้าม TIP FACTORYLANDS	นายนพพร ชาวไชยศรี ทพ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน จำนวน ๑๘๗ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ทพ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑  มีโอกาสชำรุด  ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายนรุตม์ชัย เกษมณี )

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ KTA05 จาก ถ.สค. 4009 (ถ.แคราย) ถึง KTA10S-09, 1102 ฝั่งตรงข้าม TIP FACTORYLANDS.  
ในวันที่ 3 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 336/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิบรุต จิตรวาทะกิจัก ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเนนพร ชาวไชยศรี  
28 ก.พ. 67

( นายจิรวุฒินันท์ แก้วสินธุ์ )  
จตอ.5 หน่วยงาน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ.

อก.บช.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) \_\_\_\_\_  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ก่อนแยกเข้า (ถ.แควราย) - ฟังตรงข้ามซอยผู้ใหญ่ถึก (KTA05S-10)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 มี.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอน SF6 แทน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 336/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
2	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
3	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		LOAD 2.08 MW
4	KTA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		LOAD 1.69 MW
5	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		-
6	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		LOAD 4.1 MW
7	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		LOAD 2.51 MW
8	KTB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
9	KTB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
10	ย้ายโหลด KTA05 บางส่วนไปจ่ายจาก KTU05						
11	KTA10S-14	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ตรงข้าม รร.บ้านแควราย
12	KTABVB-01	ปลด	สับ		KTA		- ฆนนานบัส
13	KTA05S-12	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ตรงข้าม รร.บ้านแควราย
14	KTA05S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หอพักสี่สั้ม
15	KTABVB-01	สับ	ปลด		KTA		- ฆนนานบัส
16	ย้ายโหลด KTA10 บางส่วนไปจ่ายจาก KTU03						
17	KTA10S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตรงข้าม ซ.บ้านผู้ใหญ่ถึก
18	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
19	แจ้ง กฟอ.กทบ.ทำการไลน์โหลดในพื้นที่ดับไฟในไลน์ KTA05,10,KTB02,06 ออกได้						
20	เมื่อ กฟอ.กทบ.ทำการไลน์โหลดในพื้นที่ดับไฟในไลน์ KTA05,10,KTB02,06 ออกแล้วเสร็จ						
21	แจ้ง HL ทำการปลดจุดเชื่อมสายทั้ง 5 จุดออกได้ (ตามผังแนบ)						
22	เมื่อ HL ทำการปลดจุดเชื่อมสายทั้ง 5 จุดออกแล้วเสร็จ						
23	แจ้ง กฟอ.กทบ.ตรวจสอบ SF6 KTA05S-04 (โรงไม้ซ้อชัยพฤกษ์) อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม "ล๊อคคาน"						
24	แจ้ง กฟอ.กทบ.ตรวจสอบ SF6 KTA10S-08 (โรงปูนนายสวาสดี) อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม "ล๊อคคาน"						
25	แจ้ง กฟอ.กทบ.ตรวจสอบ SF6 KTA10S-07 , KTA5S-08 , KTA5S-09 อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม "ล๊อคคาน"						
26	แจ้ง กฟอ.กทบ.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้ง กพอ.กทบ.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
28	แจ้ง กพอ.กทบ.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
29	แจ้ง กพอ.กทบ.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4						
30	แจ้ง กพอ.กทบ.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G5						
31	แจ้ง กพอ.กทบ.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G6						
32	แจ้ง กพอ.กทบ.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G7						
33	แจ้ง กพอ.กทบ.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G8						
34	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.กทบ.ทราบ						
35	เมื่อ กพอ.กทบ.Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
36	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
37	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
38	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
39	KTA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
40	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU		-
41	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		-
42	KTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		-
43	KTB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
44	KTB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
45	แจ้ง กพอ.กทบ.ปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
46	เมื่อ กพอ.กทบ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
47	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
48	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
49	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
50	KTA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
51	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		-
52	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-
53	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-
54	KTB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
55	KTB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
56	แจ้ง กพอ.กทบ.ปลด Short Ground จุด G1						
57	แจ้ง กพอ.กทบ.ปลด Short Ground จุด G2						
58	แจ้ง กพอ.กทบ.ปลด Short Ground จุด G3						
59	แจ้ง กพอ.กทบ.ปลด Short Ground จุด G4						
60	แจ้ง กพอ.กทบ.ปลด Short Ground จุด G5						
61	แจ้ง กพอ.กทบ.ปลด Short Ground จุด G6						
62	แจ้ง กพอ.กทบ.ปลด Short Ground จุด G7						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	แจ้ง กฟอ.กทบ.ปลด Short Ground จุด G8						
64	ตรวจสอบ KTA5S-10 SF6 หอพักสี่เหลี่ยมติดตั้งใหม่สถานะ "Open พร้อม ล็อคคาน"						
65	แจ้ง กฟอ.กทบ.ตรวจสอบ SF6 KTA05S-04 (โรงไม้ซ่อชัยพฤกษ์) อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม "ปลดล็อคคาน"						
66	แจ้ง กฟอ.กทบ.ตรวจสอบ SF6 KTA10S-08 (โรงปูนนายสวาสดี) อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม "ปลดล็อคคาน"						
67	แจ้ง HL ทำการเชื่อมสายทั้ง 5 จุดเข้าได้ (ตามผังแนบ)						
68	เมื่อ HL ทำการเชื่อมสายทั้ง 5 จุดเข้าแล้วเสร็จ						
69	ย้ายโหลด KTA10 บางส่วนกลับจาก KTU03						
70	KTA10S-09	ปลด	สับ		กทบ.	SF6	ตรงข้าม ช.บ้านผู้ใหญ่ถัก
71	KTA10S-14	สับ	ปลด		กทบ.	SF6	ตรงข้าม รร.บ้านแคทราย
72	ย้ายโหลด KTA05 บางส่วนกลับจาก KTU05						
73	KTA05S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.	SF6	หอพักสี่เหลี่ยม
74	KTA05S-12	สับ	ปลด		กทบ.	SF6	ตรงข้าม รร.บ้านแคทราย
75	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA	-	-
76	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA	-	-
77	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	-
78	KTA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	-
79	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU	-	-
80	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU	-	-
81	KTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU	-	-
82	KTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU	-	-
83	KTU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU	-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณ ปากทาง ถ.ศค.4009 จนถึง ฝั่งตรงข้ามซอยผู้ใหญ่เถิก

เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอน ชนิด SF6 เพื่อทดแทน รหัสอุปกรณ์ KTA05S-10

บริเวณ ก่อนทางแยกเข้า ถ.ศค. 4009 (ถ.แคทราย) จนถึง ฝั่งตรงข้ามซอยผู้ใหญ่เถิก (รหัสอุปกรณ์ KTA10S - 09) และ ฝั่งตรงข้าม TIP FACTORYLANDS

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

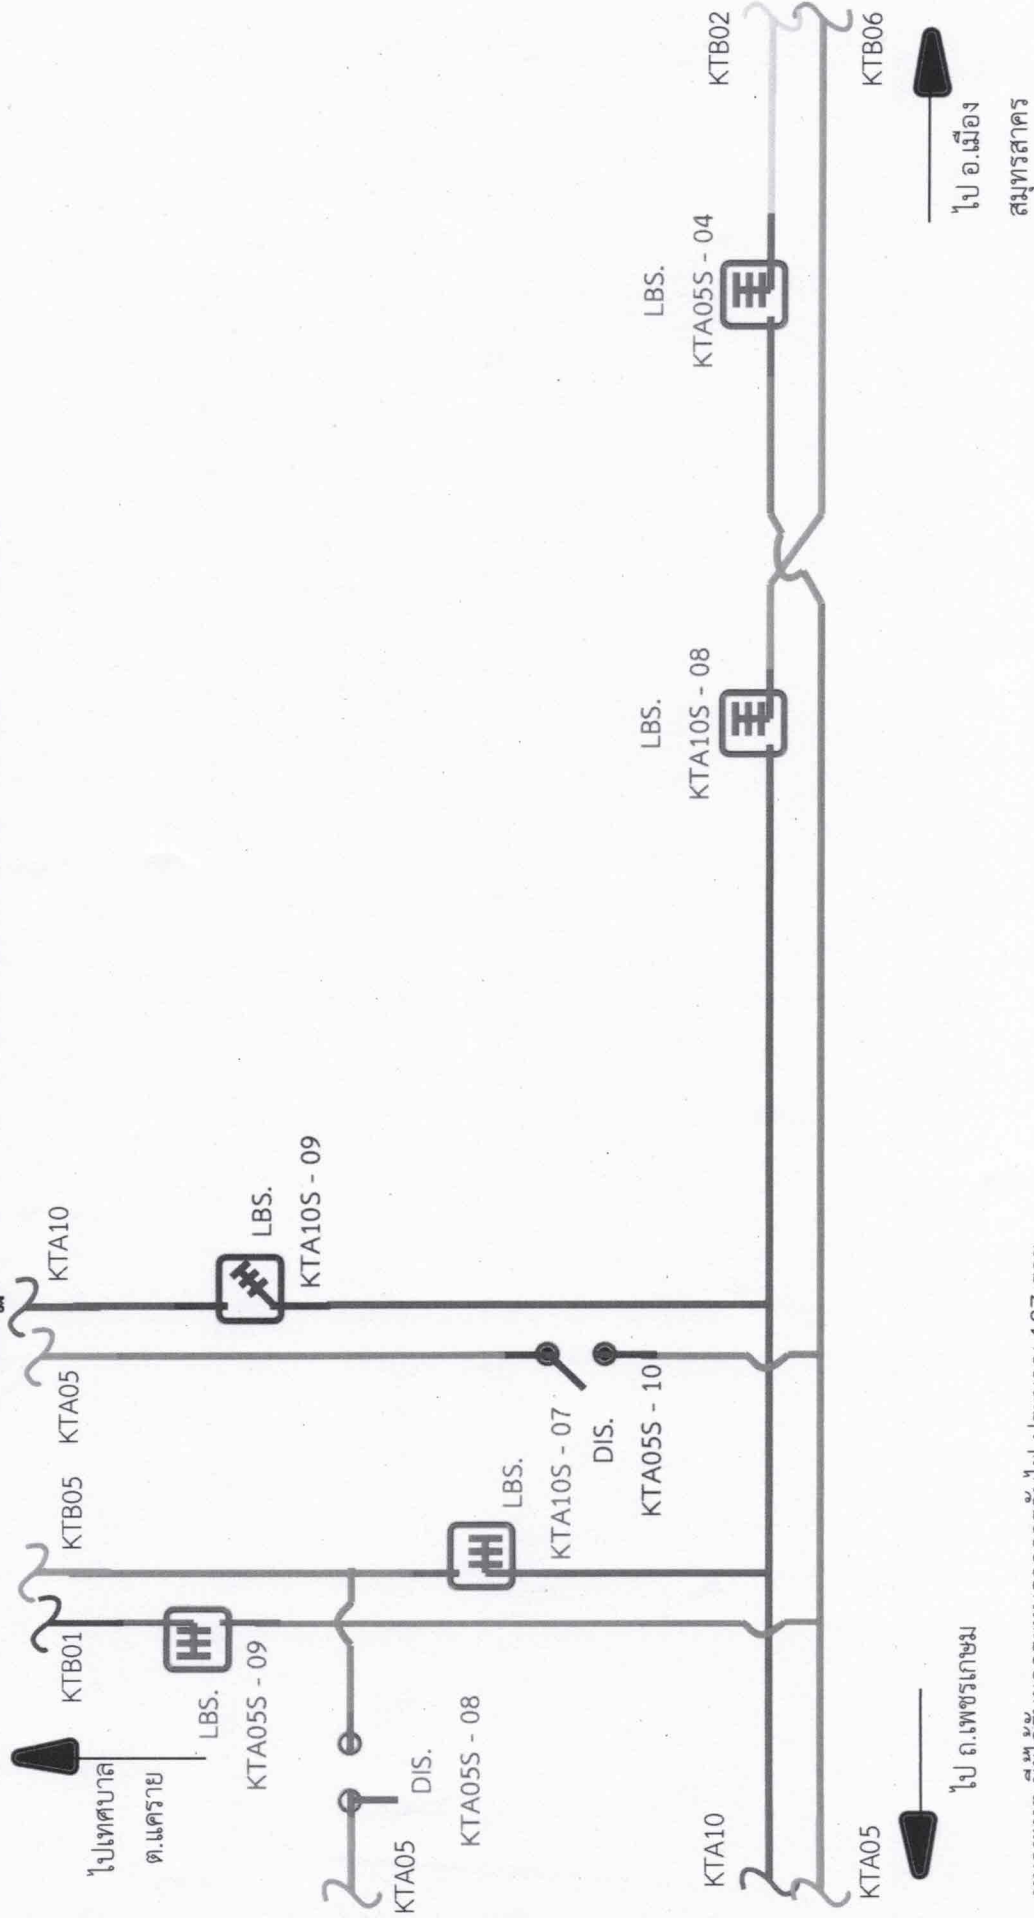


หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 187 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณ ปากทาง อ.สค.4009 จนถึง ฝั่งตรงข้ามซอยผู้ใหญ่ถึก

เพื่อให้ชุดงาน ผบ.ภพ.ส.ทท.ท. ปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอน ชนิด SF6 เพื่อทดแทน รหัสอุปกรณ์ KTA05S-10

บริเวณ ก่อนทางแยกเข้า อ.สค. 4009 (อ.แคทราย) จนถึง ฝั่งตรงข้ามซอยผู้ใหญ่ถึก (รหัสอุปกรณ์ KTA10S - 09) และ ฝั่งตรงข้าม TIP FACTORYLANDS

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

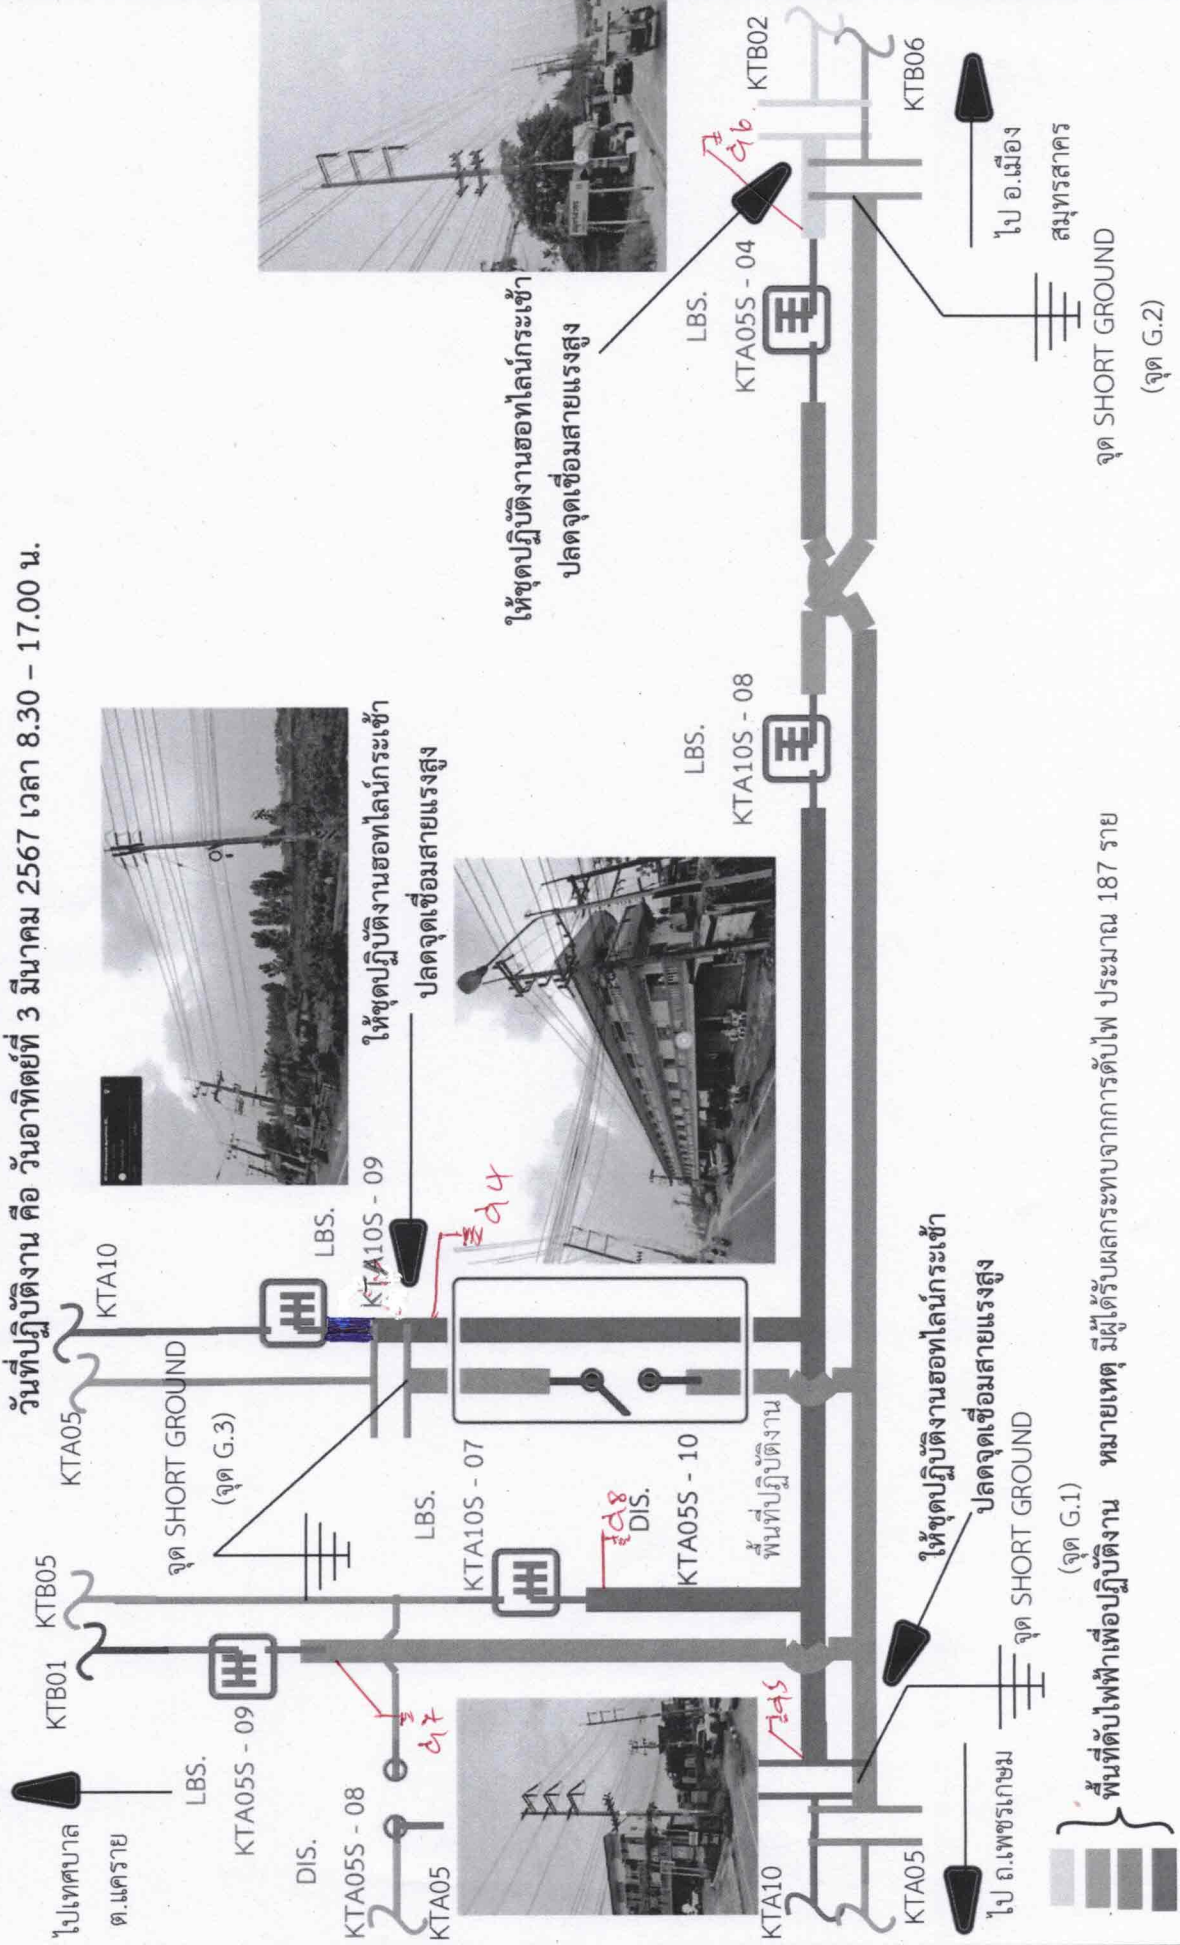

พื้นที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน หมายถึง มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 187 ราย

(จุด G.1)

จุด SHORT GROUND (จุด G.2)

ให้ชุดปฏิบัติงานขอทไลน์กระแสเข้า  
ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง

ให้ชุดปฏิบัติงานขอทไลน์กระแสเข้า  
ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง

ไป อ.เมือง  
สมุทรสาคร

ไป อ.เพชรเกษม
