



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สน(กป.) 013 /2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง (นายพฒชงค์ กาทหลง)

วันที่ 13 ก.พ. 2568

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 1 สถานีไฟฟ้าสามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA1	18 ก.พ. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ตัดไฟปักเสาและพาดสาย	DISชั่วคราว หอมเตย	DISชั่วคราว สะพานขาว	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมอฉลปรง 1 เครื่อง 100 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 90 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชผ.กป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.775541, 100.090621
3.2 สิ้นสุด 14.769972, 100.092116

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ 1 ฟีดเดอร์ XCA1 จาก DISชั่วคราวหอมเตย ถึง DISชั่วคราวสะพานขาว
ในวันที่ 18 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 336/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อก.กทกท

พนักงานศูนย์ฯ นาย จรรณพงษ์ นกาทด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

(นายพฒชงค์ กาทหลง)
ผจก.กฟส.สข.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สข.

อก.บข.(ก.3), อก.รว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

รองฯ
(ทนายวิภาวดี งามบุญทด)
อด. 5 แทน ทพ.คฟ.


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค.หอมเตย - DIS ชค.สะพานขาว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 336/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต 3. นส.สุภัชชา, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA	-	-
2	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	-
3	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	-
4	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
6	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
7	- ย้ายโหลด XCA01 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA02						
8	XCA02S-07	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
9	DBA02S-04	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 บางแอก
10	DIS ชค.ไลน์ XCA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS หอมเตย
11	XCA02S-07	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
12	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
13	DIS ชค.ไลน์ XCA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS สะพานขาว
14	แจ้ง กฟส.สช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟส.สช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ						
17	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
18	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA	-	-
19	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	-
20	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	-
21	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
22	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
23	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
24	แจ้ง กฟส.สช. ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
25	เมื่อ กฟส.สช. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
26	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA	-	-
27	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	-
28	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
30	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
31	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
32	แจ้ง กฟส.สข ทำการปลด Short Ground จุด G1							
33	แจ้ง กฟส.สข ทำการปลด Short Ground จุด G2							
34	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
35	DIS ชค.ไลน์ XCA01	ปลด	สับ		สข.		DIS	สะพานขาว
36	- ย้ายโหลด XCA01 บางส่วนกลับจาก DBA02							
37	XCA02S-07	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หมอมจรัญ
38	DIS ชค.ไลน์ XCA01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	หมอมเตย
39	DBA02S-04	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	บางแวก
40	XCA02S-07	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	หมอมจรัญ
41	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA		-	-
42	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-	-
43	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-	-
44	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
45	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
46	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

ดับไฟปักเสาและพาดสาย

บริเวณ DIS หัวควาหอมเตย ถึง DIS หัวควาสะพานขาว


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ติดต่อจุด G1

นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกป.กฟล.สามชุก

ผู้ติดต่อจุด G2

นาย บัณฑิต เทพบุตร พง.5 ผกป.กฟล.สามชุก

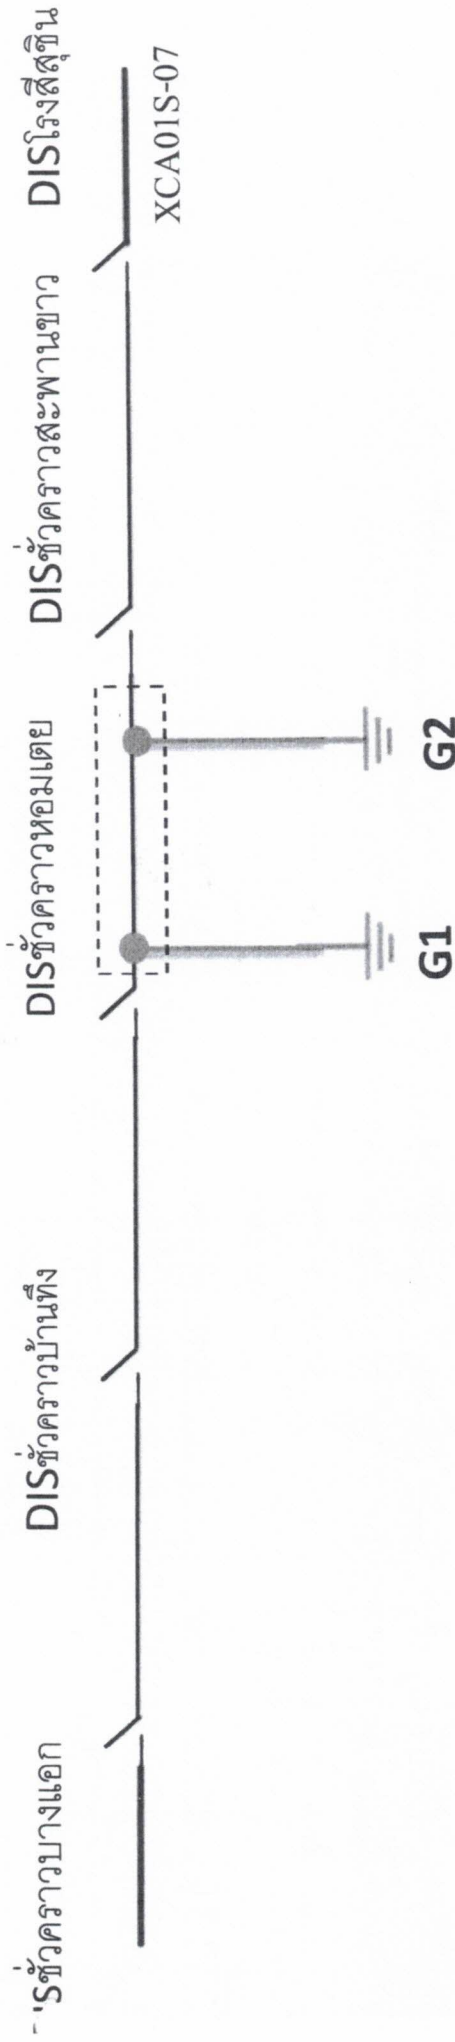

ไปเดิมบางนางบวช

ไปเฟแดงสามชุก
