



วิทย์ขอดับไฟ

Switching Deadline

29 ก.พ. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปป) ๕๓๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนรินทร์ เข้มทอง
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง SF๖ ตัดไลน์ DAA๐๙ บริเวณฝั่งตรงข้ามแยก
โรงพยาบาลสถานพระบารมี(ม่วงเต่า) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๒

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒ ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๙ สถานี ด้านข้าง	๑ มี.ค.๖๗	๐๙.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้ง SF๖ ตัดไลน์ DAA๐๙	ตรงข้ามทางแยก โรงพยาบาล สถานพระ บารมี(ม่วง เต่า)	Drop out fuse หน้า โรงพยาบาล	นายวิษณุ มีผล พงง.๖(ปป) โทร.๐๘๒- ๒๔๒๕๖๘๙

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายบัญชา เขาวัว ตำแหน่ง พงง.๖ (สข) โทร ๐๙๘๘๒๒๕๕๖๙

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายวิษณุ มีผล ตำแหน่ง พงง.๖(ปป) โทร ๐๘๒-๒๔๒๕๖๘๙

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบ
ก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด (๑.๒)ไม่มีโอกาสขำรด

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

.....
ตำแหน่ง
นาย.....
รองหัวหน้างาน
ก.๓.กฟอ.บ่อพลอย

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

✓อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA9 จาก P.๕๗๐๓๕๕๕๕ ถึง D/P 1๓๖ รพ.ภร๕๕๕

ในวันที่ 1 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 339/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง


ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ วัฒนพงษ์ ประสานงานขอดับไฟกับ กิ่งปรเมศ วัฒนอย.


 นายอนุสรณ์ วัฒนพงษ์
 ๖๗๖.๕ ๖๓๖๖.๐๗.

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ๓๗๐. ๖๓๕., กฟข. นปร., กฟสร.๓๖.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไปจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
 รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)





หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณป้อมตำรวจม่วงเฒ่า (DAA09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 มี.ค. 67	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่ทำ	ติดตั้ง SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน	199/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	29 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 3. นายจรัสวัฒน์, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิทย์, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ : 1. ช่วงเข้าดับไฟวงจร DAA09 ปลด PG ข้ามถนนทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณป้อมตำรวจม่วงเฒ่า เพื่อติดตั้ง SF6 ข้ามถนน							
2. จ่ายไฟไลน์เมนวงจร DAA09 เพื่อ Check Phase Dis. ปุ่มม่วงเฒ่า (Tie วงจร BOU01-DAA09)							
3. หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ไลน์ รพ.บารมีฯ จะจ่ายไฟจากวงจร BOU01							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA09R-03	Normal	Nonreclosing, GND		ดช.	R	ปลักประตู่
3	BOU01R-02	Normal	Nonreclosing		หปร.	R	หนองซอน
4	BOU01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.	R	AVR วัดเขาขาม
5	ย้ายโหลดวงจร DAA09 ไปรับไฟจากวงจร BOU01 (ดับไฟย้ายโหลด)						
6	D/F ไลน์ DAA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หปร.	D/F	ปากทางตรงป้อมตำรวจม่วงเฒ่า
7	D/F Tie BOU01-DAA09	ปลด	สับ		หปร.	D/F	พื้นแปลง 2
8	เปลี่ยนทางจ่ายไฟวงจร DAA09						
9	DAA09S-26	ปลด	สับ		หปร.	DIS	ตรงข้ามบ้านม่วงเฒ่า
10	DAA09S-27	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หปร.	DIS	ก่อนมิเตอร์แบ่งแดน 1 ต้น
11	เมื่อพร้อมดับไฟ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปลดโหลดหม้อแปลงวงจร DAA09 บริเวณพื้นที่ดับไฟ ออก						
13	หลังจากปลดโหลดหม้อแปลงวงจร DAA09 บริเวณพื้นที่ดับไฟ ออก เรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด PG วงจร DAA09 บริเวณช่วงตั้งข้ามถนนป้อมตำรวจ ทั้ง 2 ฝั่ง (ตามแผนผัง) ออก						
15	หลังจาก Hotline ทำการปลด PG วงจร DAA09 บริเวณช่วงตั้งข้ามถนนป้อมตำรวจ ทั้ง 2 ฝั่ง (ตามแผนผัง) ออก เรียบร้อย						
16	จ่ายไฟวงจร DAA09 (ไลน์เมน ตั้งแต่ DAA09S-27 - Dis. ป้อมตำรวจ)						
17	DAA09S-27	ปลด	สับ		หปร.	DIS	ก่อนมิเตอร์แบ่งแดน 1 ต้น
18	Check Phase Dis. ปุ่มม่วงเฒ่า (Tie วงจร BOU01-DAA09)						
19	หลังจาก Check Phase Dis. ปุ่มม่วงเฒ่า (Tie วงจร BOU01-DAA09) เฟสตรง						
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
23	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
24	DAA09R-03	Nonreclosing	Normal		ดช.	R	ปลักประตู่
25	BOU01R-02	Nonreclosing	Normal		หปร.	R	หนองซอน
26	BOU01R-03	Nonreclosing	Normal		หปร.	R	AVR วัดเขาขาม
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
31	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
32	DAA09R-03	Normal	Nonreclosing,GND		ดช.		R ปลักประตู
33	BOU01R-02	Normal	Nonreclosing		หปร.		R หนองซอน
34	BOU01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.		R AVR วัดเขาขาม
35	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
36	ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ บริเวณช่วงดิ่งข้ามถนนป้อมตำรวจ สถานะ OPEN ล็อคคาน						
37	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อม PG วงจร DAA09 บริเวณช่วงดิ่งข้ามถนนป้อมตำรวจ ทั้ง 2 ฝั่ง (ตามแผนผัง) เข้า						
38	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อม PG วงจร DAA09 บริเวณช่วงดิ่งข้ามถนนป้อมตำรวจ ทั้ง 2 ฝั่ง (ตามแผนผัง) เข้า เรียบร้อย						
39	ย้ายโหลดวงจร DAA09 ไปจ่ายจากวงจร BOU01 (เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟไลน์ รพ.บารมีฯ)						
40	BOU01S-09	ปลด	สับ		หปร.	SCADA	SF6 สีแยกหนองผักแว่น
41	Dis.BOU01-DAA09	ปลด	สับ		หปร.		DIS บั้มม่วงเฒ่า
42	DAA09S-27	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หปร.		DIS ก้อนมิเตอร์แบ่งแดน 1 ต้น
43	BOU01S-09	สับ	ปลด		หปร.	SCADA	SF6 สีแยกหนองผักแว่น
44	เปลี่ยนทางจ่ายไฟวงจร BOU01 (ดับไฟย้ายโหลด)						
45	D/F Tie BOU01-DAA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หปร.		D/F พันแปลง 2
46	D/F ไลน์ DAA09	ปลด	สับ		หปร.		D/F ปากทางตรงป้อมตำรวจม่วงเฒ่า
47	DAA09R-03	Nonreclosing	Normal		ดช.		R ปลักประตู
48	BOU01R-02	Nonreclosing	Normal		หปร.		R หนองซอน
49	BOU01R-03	Nonreclosing	Normal		หปร.		R AVR วัดเขาขาม
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

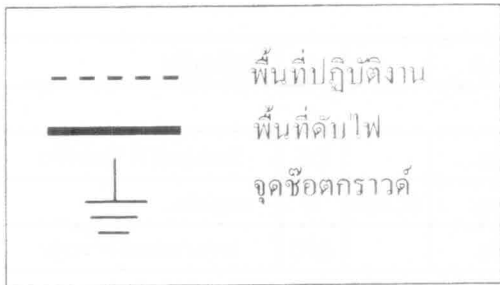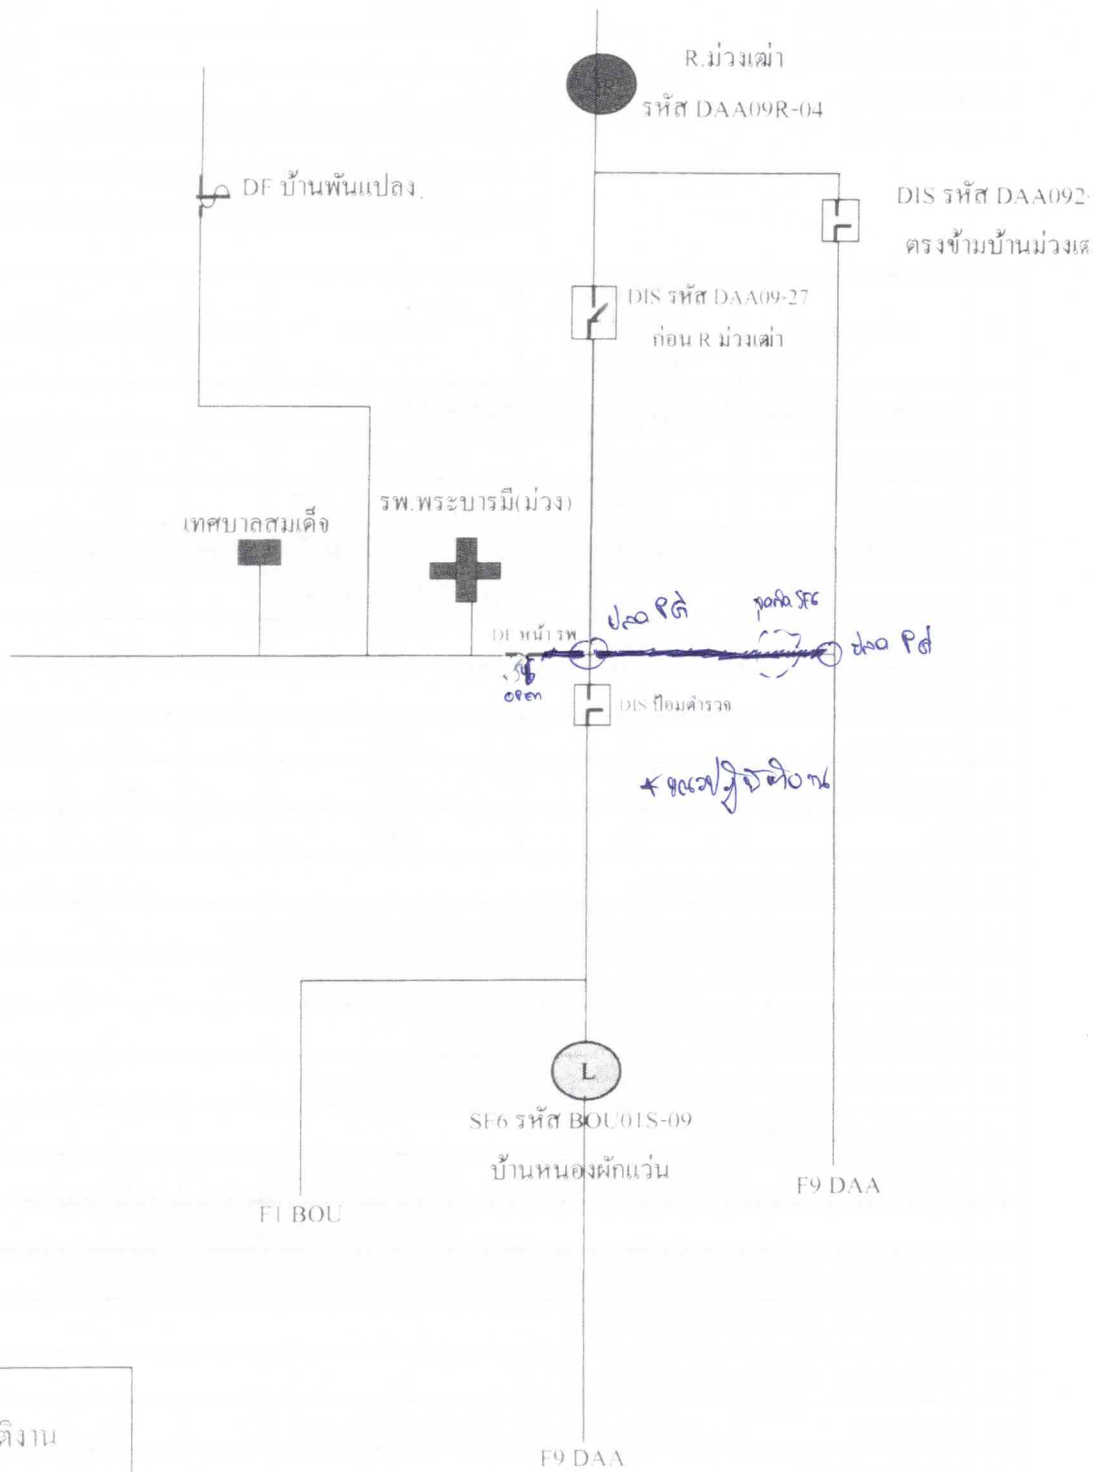



Handwritten signature or mark.

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

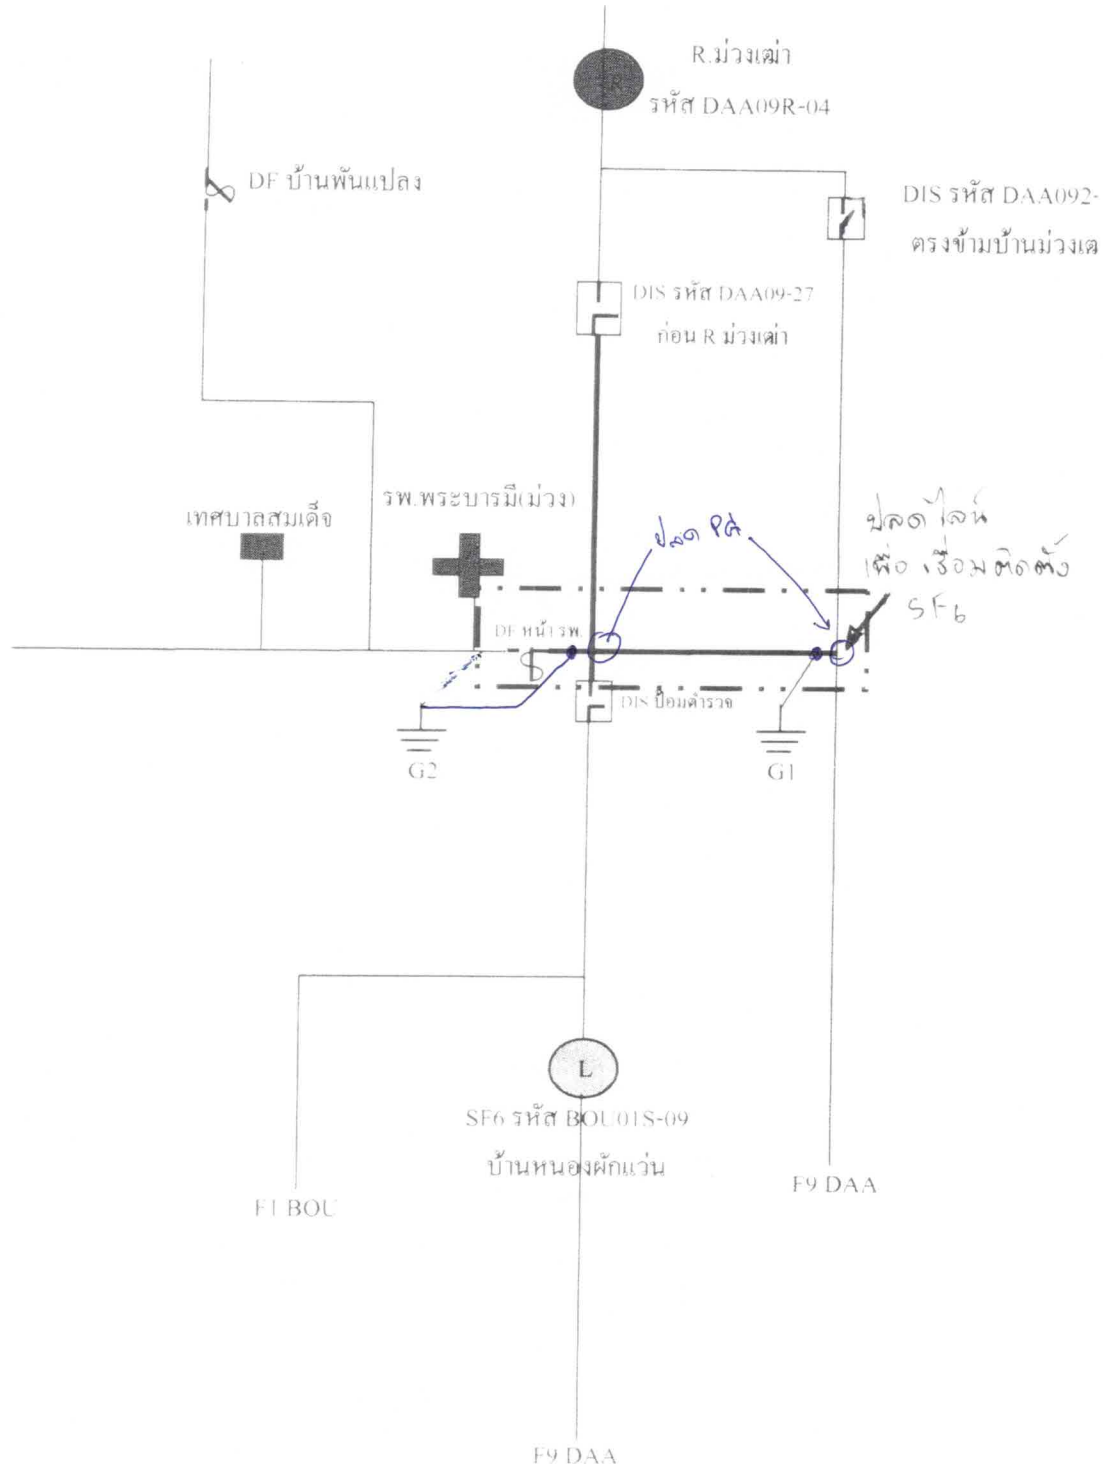

Handwritten signature or mark

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

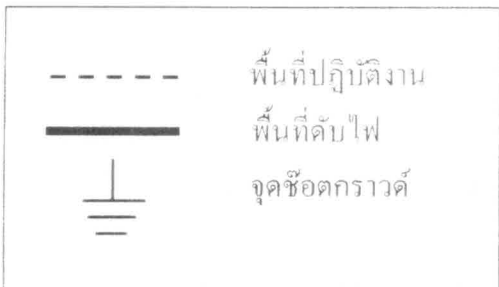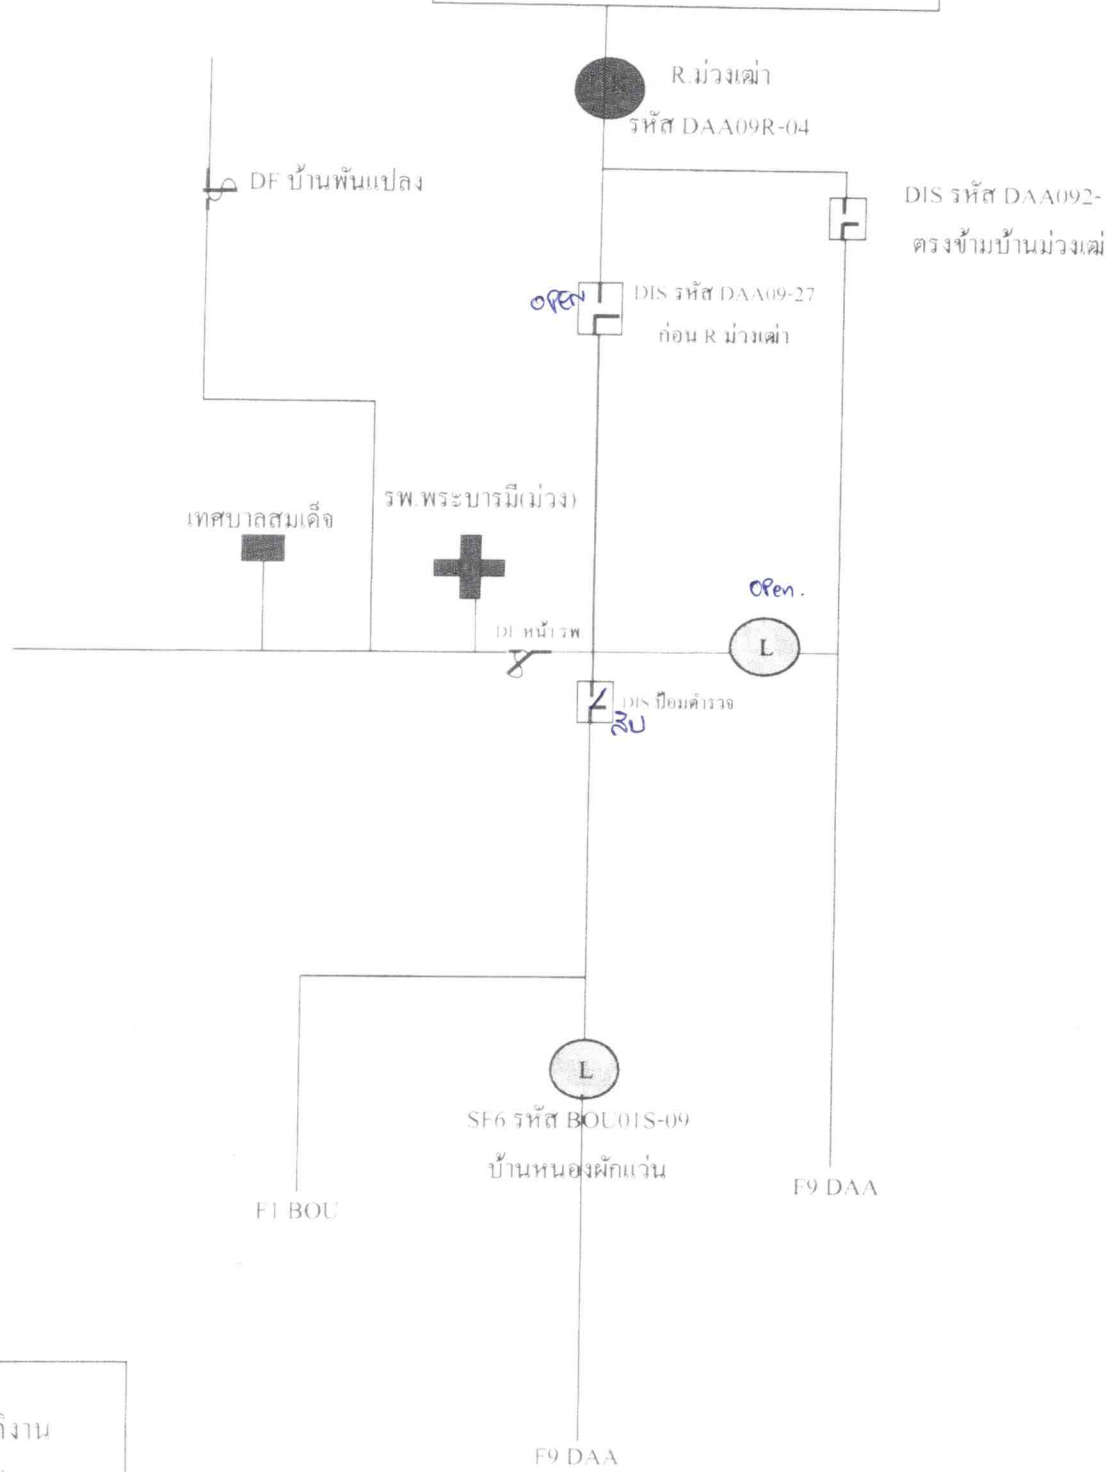

Handwritten signature
