



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
21 ก.พ. 2568

เลขที่ ก.๓ บลน.(ป.บ.) ๓๒๙ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หึงสุวรรณ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง ออก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วย กฟส.บางเลน ขอตัดไฟ เพื่อปักเสาเข็มไลน์ ๒๒ KV. และตัดต่อสายใหม่ ตามแผนผังสั่งเขบแนบ จำนวน ๑
แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEA6	26 ก.พ.68	08.30 น.	16.30 น.	ปักเสาเข็มไลน์ และตัด ต่อสาย	BEA6S-09	BEA6S-10 BEA6S-11 BEA6R-01	นายธนภณ มีจันเพชร พงช.5 ผปบ.กฟส. บางเลน
2.	BEA8					จุดฮอทไลน์ปลด	BEA8S-05	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ผ.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)
ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ ไม่ต้องดับไฟ ๑๑๕ KV. เนื่องจากฮอทไลน์กระเช้าดำเนินการในจุดที่ใกล้กับระบบ ๑๑๕ KV.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BEA6 จาก BEA6S-09 ถึง BEA6R-01, BEA6S-10, 11

ในวันที่ 26 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 347/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ BEA8 จาก จุดฮอท hotline clamp ถึง BEA8S-05

ในวันที่ 26 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ ธารารังษิต ประสานงานขอตัดไฟกับ ผอ.ปบ.๒๒๖๕๕ ไทยงามศิลป์

(นายอภิสิทธิ์ ธารารังษิต)
วคก. 5 ผปบ. ก.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. บ.๓

อก.บช.(ก.๓)อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2แผ่น

แผนผังแนบ..... 1แผ่น



ผจฟ.(สถานี)..... -)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกวัดเกษม (BEA06, 08)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ก.พ. 68	ระหว่าง	8.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟ.ส.บ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 347/2568	
4. เตรียมการ Switching โดย	นายศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์			วันที่	21 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบ Switching โดย				วันที่	21 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติ Switching โดย				วันที่	21 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำ Switching โดย	1. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
3	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
4	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
5	BEA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
6	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	R	วัดสุขเกษม
7	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
8	DTM10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	R	ปากทางวัดบางปลา
9	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		-
10	BEV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-
11	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM10						
12	BEA06S-18	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 ศาลาแดง
13	BEA06R-01	สับ	ปลด		บล.	R	วัดสุขเกษม
14	DIS. ด้าน Load	สับ	ปลด		บล.	DIS	ด้าน Load R.วัดสุขเกษม
15	ย้ายโหลด BEA08 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA07						
16	DIS.ชด. BEA07-08	ปลด	สับ		บล.	DIS	ชั่วคราว ก่อนโทรประปา
17	BEA08S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	แยกวัดเกษมา
18	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนไปรับไฟจาก BEV01						
19	BEV01S-07	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 หน้าบีม PT LPG ถนนบางเลนปทุม
20	BEA06S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.	SCADA	SF6 โหลดสับบางเลน
21	เมื่อพร้อมดับไฟ						
22	BEA06S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	มัจฉาการช่าง
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการ ปลด DDE วงจร BEA08 บริเวณจุดตั้งข้ามถนน (ตามแผนผังแนบ) ออก						
24	หลังจาก Hotline ทำการ ปลด DDE วงจร BEA08 บริเวณจุดตั้งข้ามถนน (ตามแผนผังแนบ) ออก เรียบร้อย						
25	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
28	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
29	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
30	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
31	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
32	BEA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
33	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
34	DTM10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R	ปากทางวัดบางปลา
35	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		-	-
36	BEV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-	-
37	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้							
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****								
38	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
39	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short Ground จุด G1							
40	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short Ground จุด G2							
41	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงใน Wesafe เรียบร้อย							
42	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-	-
43	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-	-
44	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-	-
45	BEA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-	-
46	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	-
47	DTM10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	ปากทางวัดบางปลา
48	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		-	-
49	BEV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-	-
50	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
51	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการ เชื่อม DDE วงจร BEA08 บริเวณจุดตั้งข้ามถนน (ตามแผนผังแนบ) เข้า							
52	หลังจาก Hotline ทำการ เชื่อม DDE วงจร BEA08 บริเวณจุดตั้งข้ามถนน (ตามแผนผังแนบ) เข้า เรียบร้อย							
53	BEA06S-11	ปลด	สับ		บล.		DIS	มีฉากร่าง
54	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนกลับจาก BEV01							
55	BEA06S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.	SCADA	SF6	โหลดสับบางเลน
56	BEV01S-07	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	หน้าบีม PT LPG ถนนบางเลนปฐม
57	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM10							
58	DIS. ด้าน Load	ปลด	สับ		บล.		DIS	ด้าน Load R.วัดสุขเกษม
59	BEA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บล.		R	วัดสุขเกษม
60	BEA06S-18	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	ศาลาแดง
61	ย้ายโหลด BEA08 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA07							
62	BEA08S-05	ปลด	สับ		บล.		DIS	แยกวัดเกษมา
63	DIS.ชค. BEA07-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	ชั่วคราว ก่อนโทรประปา
64	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	-
65	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
66	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
67	BEA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
68	BEA06R-01	Nonreclosing	Normal		บล.		R	วัดสุขเกษม
69	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	-
70	DTM10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R	ปากทางวัดบางปลา
71	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		-	-
72	BEV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-	-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

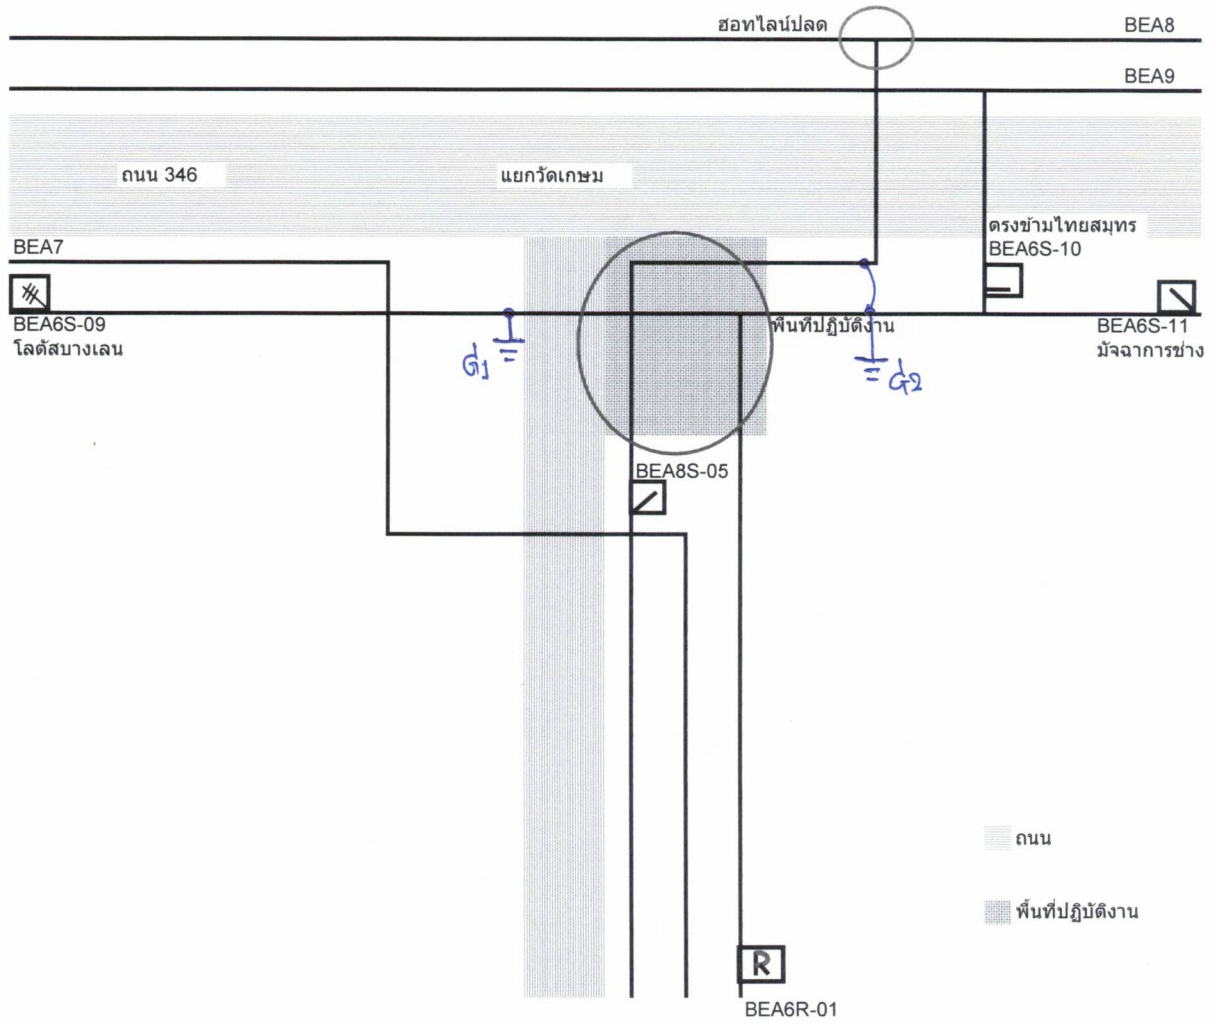

ฝังดับไฟ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
 งานปักเสาเข็มไลน์ 22 kV. 2 วงจร
