



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายทัศนัย พิชิตสุวรรณชัย ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนปีกเสาและพาดสายแรงสูง บริเวณถนนเลี่ยงเมืองบางปลา
หมอ-ก่อนโรงงานเจียหมูอินเตอร์แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๐ สท.๒	๙/๓/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนและปีกเสาแรงสูง	Disชั่วคราวบาง ปลาหมอ	DDE ก่อนเจีย หมูอินเตอร์	โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ นายวรพล สุทธิไกร
๒.	๑๐ สท.๒	๒๓/๓/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนพาดสายแรงสูง	Disชั่วคราวบาง ปลาหมอ	DDE ก่อนเจีย หมูอินเตอร์	โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ นายวรพล สุทธิไกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPB10 จาก DIS ต. บางปลาหมอ ถึง DDE ก่อนเจียหมูอินเตอร์
ในวันที่ 9 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 348/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SPB10 จาก DIS ต. บางปลาหมอ ถึง DDE ก่อนเจียหมูอินเตอร์
ในวันที่ 23 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิรช วัฒนศิริพิทักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒๖๓๓๖๗ ๒๖๓๓๖๗
5 มี.ค. 67

(นาย กิรช วัฒนศิริพิทักษ์)

๒๖๓๐.5 ๖๖๓๖ ๒๕.๓๖.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.ว.(ก3) ผจก. กฟ.คพ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานที่ทำงาน บริเวณถนนเลี้ยวเมืองบางปลาหมอ
- กำหนดวันที่ทำงาน 9 มี.ค. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
- ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ รื้อถอนและปักเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 348/2567
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว วันที่ 6 มีนาคม 2567
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 6 มีนาคม 2567
- อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 6 มีนาคม 2567
- สั่งทำสวิตชิงโดย
 - นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายนครินทร์, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	โหลด 2.8 MW
3	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ	-	วัดพันด่ำลิ่ง
4	ย้ายโหลด SPB10 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPB04						
5	DOA09S-09	ปลด	ล๊اب		สพ	DIS	ลานตากข้าวสามเหลี่ยม
6	DIS ชค. SPB10	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ	DIS	DIS ชค. บางปลาหมอ
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน โหลด SPB10 ตั้งแต่ DIS ชค. บางปลาหมอ ถึง จุดตัด DDE ก่อนจ่ายหมูอินเตอร์ (ตามผังแนบ)						
9	เมื่อผู้ควบคุมงาน โหลด SPB10 ตั้งแต่ DIS ชค. บางปลาหมอ ถึง จุดตัด DDE ก่อนจ่ายหมูอินเตอร์ (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตัด DDE SPB10 บริเวณก่อนจ่ายหมูอินเตอร์ โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
11	เมื่อผู้ควบคุมงาน ตัด DDE SPB10 บริเวณก่อนจ่ายหมูอินเตอร์ โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ						
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
16	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	
17	DOA09R-02	Nonreclosing	Normal		สพ	-	วัดพันด่ำลิ่ง
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหนดกลับ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
23	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
24	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ		- วัดพันด้าสิ่ง
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน เชื่อม DDE SPB10 บริเวณก่อนเจ็ทหม้ออินเตอร์ โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
27	เมื่อผู้ควบคุมงาน เชื่อม DDE SPB10 บริเวณก่อนเจ็ทหม้ออินเตอร์ โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ						
28	ย้ายโหนด SPB10 บางส่วน กลับจาก SPB04						
29	DIS ชค. SPB10	ปลด	สับ		สพ		DIS ชค. บางปลาหมอ
30	DOA09S-09	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพ		DIS ลานตากข้าวสามเหลี่ยม
31	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
32	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ		- วัดพันด้าสิ่ง
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.


วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ด้วยในวันที่...๙,๒๓...เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...เลี้ยวเมืองบางปลาหมอ-ก่อนโรงงานเจ็ทหมูอินเตอร์...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูงสถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ..๑๐.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี๒... ตั้งแต่บริเวณ ..เลี้ยวเมืองบางปลาหมอ-ก่อนโรงงานเจ็ทหมูอินเตอร์

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นาย ปรีชา ทองระย้า พง.๖ ผจก.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร ..ตำแหน่ง ผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

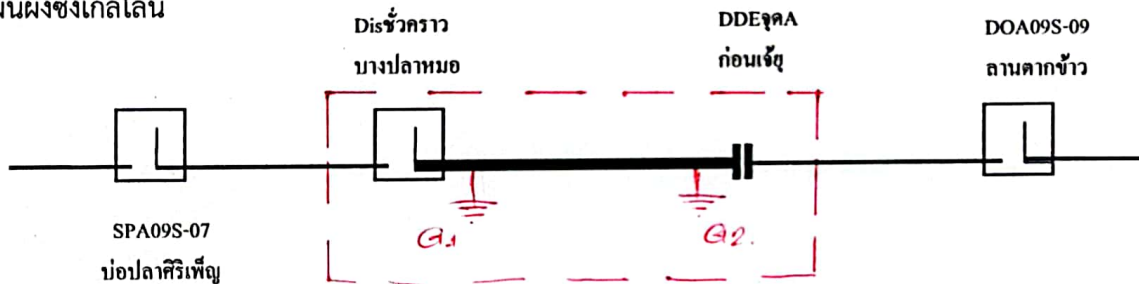

ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง

- ๑.ย้ายโหนดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ตัดเขต ๒จุด
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อบกพร่อง ๒จุด
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณประทีป)

รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕๑, ๑๔๘๕๕๐
