



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 มี.ค. 2567

เลขที่ ก.๓ กฟส.กทบ.(ปบ) - ๐๓๙/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนฤตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบจำหน่ายวงจร KTD๐๔, KTD๐๕ และ KTD๐๘ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|------------------------------|--------------|-------------|----------|---|---|-----------------------|---|
| ๑ | KTD ๐๔, KTD ๐๕, KTD ๐๘ | ๑๐ มี.ค. ๖๗ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า หน้า สฟฟ.กทบ.๔ - ข้างสวนธรรมรัตน์ | หน้า สฟฟ.กทบ.๔ (ซอยวิรุฬหาราชฎูร์ ฝั่ง ตรงข้าม สฟฟ.) เข้า ซอยข้างวัดนางสาว | ข้าง สวน ธรรมรัตน์ | นายนพพร ชาวไชยศรี ท.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานจำนวน ๑๘๓ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ท.ปบ. กฟส.กทบ. โทร ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนฤตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ จาก KTD 4,5,8 KTD 45-02 Dis ต. โรงน้ำจี่น้ำ สนิมจ
ในวันที่ 10.3.67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 369/2567 KTD 5,85-01 Dis ต. โรงน้ำจี่น้ำ สนิมจ

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถพงษ์ นกทต ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย นพพร ชาวไชยศรี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(รกทต)

นางสาวสุภัทรา รุ่งกัญญา รตท 4 แทน น.ค.ฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี) KTD

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|--|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | หน้าสถานีฯ KTD4,5,8 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 10 มี.ค. 67 | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.กทบ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 369/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวรรณพงษ์ นกเทศ | | วันที่ 5 มีนาคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 5 มีนาคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 5 มีนาคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมนโฆช, วรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, พิษชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร, นายวัฒน์นา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|------------------------------------|
| 1 | - ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching | | | | | | |
| 2 | KTD-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTD | | |
| 3 | KTD-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTD | | |
| 4 | KTD04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTD | | |
| 5 | KTD05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTD | | |
| 6 | KTD08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTD | | |
| 7 | KTD09VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTD | | |
| 8 | KTA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTA | | |
| 9 | KTD07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTA | | |
| 10 | KTD08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTA | | |
| 11 | - ย้ายโหลด KTD04 บางส่วนไปจ่ายจาก KTA08 | | | | | | |
| 12 | KTA08S-03 | ปลด | สับ | | กทบ. | SF6 | หน้าโลตัสซอยตู้เย็น |
| 13 | KTD04S-02 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | กทบ. | SCADA SF6 | ข้างรร.วัดนางสาว |
| 14 | - ย้ายโหลด KTD08 บางส่วนไปจ่ายจาก KTA07 | | | | | | |
| 15 | KTA07S-06 | ปลด | สับ | | กทบ. | SCADA SF6 | หน้าโรงงานผ้าขนหนู |
| 16 | KTD08S-02 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | กทบ. | SCADA SF6 | SK FOOD |
| 17 | - ย้ายโหลด KTD05 บางส่วนไปจ่ายจาก KTD09 | | | | | | |
| 18 | KTDBVB-01 | ปลด | สับ | | KTD | CB | ขนานเมนบัส |
| 19 | DIS ชค.KTD05/09 | ปลด | สับ | | กทบ. | DIS | Loop line KTD05/09 |
| 20 | DIS ชค.KTD05 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | กทบ. | DIS | บ.เวนท์ อินดัสเตรียล |
| 21 | KTDBVB-01 | สับ | ปลด | | KTD | CB | ขนานเมนบัส |
| 22 | - ดับไฟเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 23 | KTD05VB-01 | สับ | ปลด | | KTD | CB | KTD05 |
| 24 | KTD08VB-01 | สับ | ปลด | | KTD | CB | KTD08 |
| 25 | DIS ชค.KTD04 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | กทบ. | DIS | หน้าโรงบำบัดน้ำเสีย บ.นันทนาการทอฯ |
| 26 | KTD05S-01 | สับ | ปลด | | กทบ. | CB | Pothead F.5 |
| 27 | KTD08S-01 | สับ | ปลด | | กทบ. | CB | Pothead F.8 |
| 28 | KTD10S-01 | สับ | ปลด | | กทบ. | CB | Pothead F.10 |
| 29 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 30 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------------|------|--------------|------------|------------------------------------|
| 31 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 32 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3 | | | | | | |
| 33 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4 | | | | | | |
| 34 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5 | | | | | | |
| 35 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6 | | | | | | |
| 36 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G7 | | | | | | |
| 37 | หลังจาก กฟอ.กทบ.Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย | | | | | | |
| 38 | ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 39 | KTD-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | KTD | | |
| 40 | KTD-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | KTD | | |
| 41 | KTD04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTD | | |
| 42 | KTD09VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTD | | |
| 43 | KTA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | KTA | | |
| 44 | KTD07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTA | | |
| 45 | KTD08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTA | | |
| 46 | *** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *** | | | | | | |
| 47 | เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 48 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 49 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 50 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3 | | | | | | |
| 51 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G4 | | | | | | |
| 52 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G5 | | | | | | |
| 53 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G6 | | | | | | |
| 54 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G7 | | | | | | |
| 55 | - ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching | | | | | | |
| 56 | KTD-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTD | | |
| 57 | KTD-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTD | | |
| 58 | KTD04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTD | | |
| 59 | KTD09VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTD | | |
| 60 | KTA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTA | | |
| 61 | KTD07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTA | | |
| 62 | KTD08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTA | | |
| 63 | - จ่ายไฟ | | | | | | |
| 64 | KTD05S-01 | ปลด | สับ | | กทบ. | CB | Pothead F.5 |
| 65 | KTD08S-01 | ปลด | สับ | | กทบ. | CB | Pothead F.8 |
| 66 | KTD10S-01 | ปลด | สับ | | กทบ. | CB | Pothead F.10 |
| 67 | DIS ชค.KTD04 | ปลด | สับ | | กทบ. | DIS | หน้าโรงบำบัดน้ำเสีย บ.นันทนาการทอฯ |
| 68 | KTD05VB-01 | ปลด | สับ คง "OFF" Auto Reclose | | KTD | CB | KTD05 |
| 69 | KTD08VB-01 | ปลด | สับ คง "OFF" Auto Reclose | | KTD | CB | KTD08 |
| 70 | - ย้ายโหลด KTD05 บางส่วนไปจ่ายจาก KTD09 | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------|----------------------|
| 71 | KTDBVB-01 | ปลด | สับ | | KTD | | CB | ขนานเมนบัส |
| 72 | DIS ชค.KTD05 | ปลด | สับ | | กทบ. | | DIS | บ.เวนซ์ อินดัสเตรียล |
| 73 | DIS ชค.KTD05/09 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | กทบ. | | DIS | Loop line KTD05/09 |
| 74 | KTDBVB-01 | สับ | ปลด | | KTD | | CB | ขนานเมนบัส |
| 75 | - ย้ายโหลด KTD04 บางส่วนไปจ่ายจาก KTA08 | | | | | | | |
| 76 | KTD04S-02 | ปลด | สับ | | กทบ. | SCADA | SF6 | ช่างรร.วัดนางสาว |
| 77 | KTA08S-03 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | กทบ. | | SF6 | หน้าโหลดสขอยตู้เย็น |
| 78 | - ย้ายโหลด KTD08 บางส่วนไปจ่ายจาก KTA07 | | | | | | | |
| 79 | KTD08S-02 | ปลด | สับ | | กทบ. | SCADA | SF6 | SK FOOD |
| 80 | KTA07S-06 | สับ | ปลด | | กทบ. | SCADA | SF6 | หน้าโรงงานผ้าขนหนู |
| 81 | KTD-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | KTD | | | |
| 82 | KTD-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | KTD | | | |
| 83 | KTD04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTD | | | |
| 84 | KTD05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTD | | | |
| 85 | KTD08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTD | | | |
| 86 | KTD09VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTD | | | |
| 87 | KTA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | KTA | | | |
| 88 | KTD07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTA | | | |
| 89 | KTD08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTA | | | |
| | *** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *** | | | | | | | |

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนตัดไฟ บริเวณ โลงน้แยก ถ.สายใยรัก - ซอยคลองมะเดื่อ 11

เพื่อให้ชุดงาน ผบ.ภพส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ หน้า สฟฟ.กทบ.4 (ซอยวิรุฬหาราษฎร์ ฝั่งตรงข้าม สฟฟ.) -

ซอยข้างวัดนางสาว - สวนธรรมรัตน์

DIS. KTD10S - 01

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

DIS. KTD08S - 01 DIS. KTD05S - 01

ไปวัดท่าไม้



DIS. ชั่วคราว

ตรงข้าม บ.เวนท์ อินเทลเตรียมลา



ไป ถ.เศรษฐกิจ



หจก.สุรัตน์พัฒนการทอ



DIS. ชั่วคราว

หน้าโรงพยาบาลน้ำเสียว บ.นันทยางการทอฯ

LBS. KTD08S - 02



LBS. KTD04S - 02



รร.วัดนางสาว

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ ประมาณ 183 ราย

DIS. KTA03S - 06




แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังตัดไปไฟ บริเวณ โลงแยก ถ.สายใยรัก - ซอยคลองมะเดื่อ 11

เพื่อให้ชุดงาน ผบ.ภพส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ หน้า สฟพ.กทบ.4 (ซอยวิรุฬหาราชบุรี ฝั่งตรงข้าม สฟพ.) - ซอยข้างวัดนางสาว - สวนธรรมรัตน์

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

ปลด DIS. KTD10S - 01
ปลด DIS. KTD08S - 01 ปลด DIS. KTD05S - 01

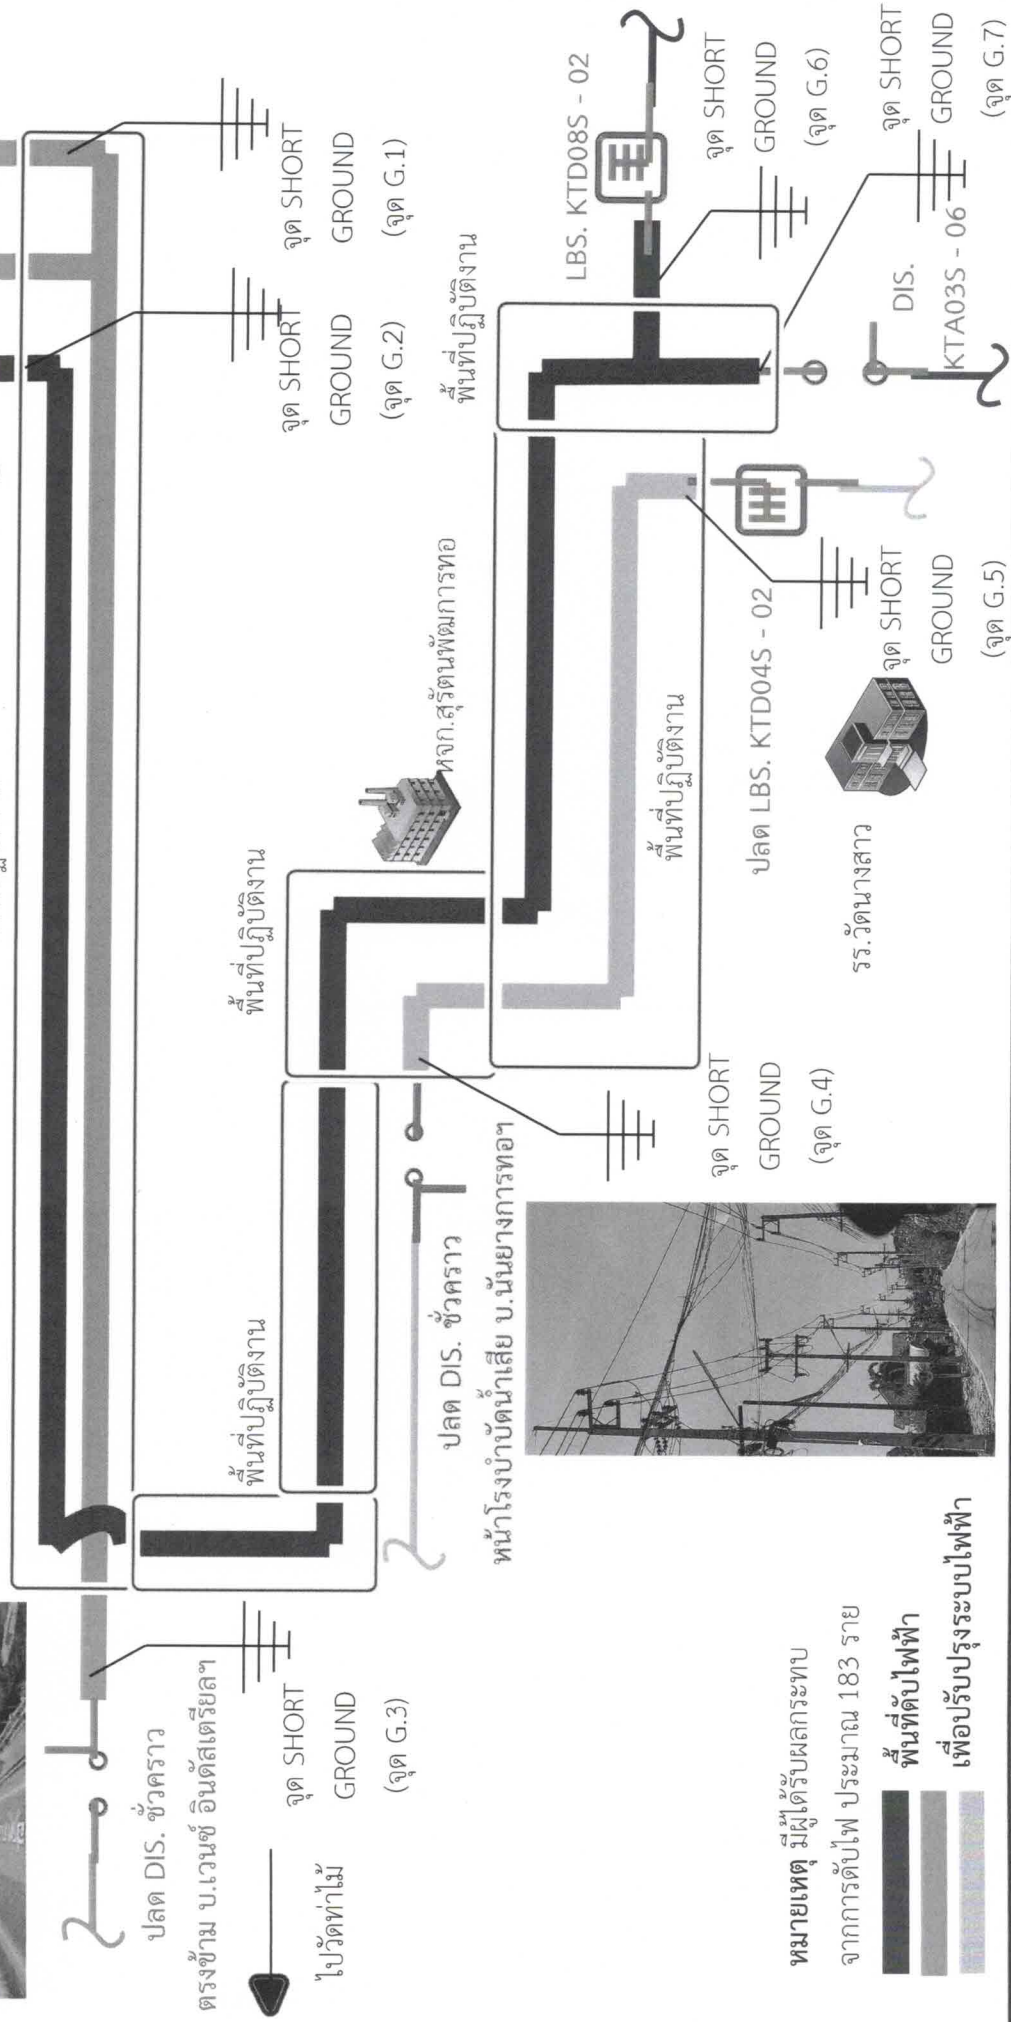

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไปไฟ ประมาณ 183 ราย

พื้นที่ตัดไปไฟ

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
