



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 มี.ค. 2567

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๑๓๙ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงค์ ภาหลง

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟล.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย ทிடเดอร์ ๓  
สถานีไฟฟ้า เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ทิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DDA๐๓	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟปักเสา-ทาดสายใหม่ บริเวณดิสชั่วคราวก่อนวัด หนองหินถึงดิสชั่วคราวหนอง หัววัง	Dis ชั่วคราว ก่อนวัดหนอง หิน	Dis ชั่วคราว หนองหัววัง	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...หม้อแปลง ๑๑. เครื่อง ๓๓๐. เควี.เอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ขณ.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๒๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายประเสริฐ คอกไม้...)  
หม.บต.กฟส.สข.  
รักษาการแทน ผจก.กฟส.สข

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ทิดเดอร์ DDA๐๓ จาก บริเวณ หนองหัววัง ถึง หนองหัววัง  
ในวันที่ 14 มี.ค.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 1๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 384/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ... ทิดเดอร์ ... จาก ... ถึง ...  
ในวันที่ ... ตั้งแต่เวลา ... น. ถึง ... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ...

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุทธิ ศรีศรีษะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ Le. เทอดไทย จันทร์เพ็ญ

( นาย สอน สอน พงษ์ศิริ )  
ว.ก. ๕ 1๗๗๖๘.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟล.อ.จ.  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจก. (สถานี) ...  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดหนองหิน - วัดหนองหัววัง (DOA03)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มี.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ปักเสา-พาดสายแรงสูงใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 384/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 10 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายไพรัช,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นาย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing		สข.	SCADA	R บ้านสระด่าน
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
4	ตรวจสอบ Dis ชค. บ้านหนองหัววัง สถานะใบมีด "เปิด" วงจร						
5	Dis ชค. DOA03	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สข.		DIS ก่อนวัดหนองหิน
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สข. ทราบ						
7	แจ้งกฟส.สข. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งกฟส.สข. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
9	เมื่อกฟส.สข. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
10	แจ้งกฟส.สข. ปฏิบัติงานได้						
11	DBA03R-02	Nonreclosing	Normal		สข.	SCADA	R บ้านสระด่าน
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
12	เมื่อกฟส.สข. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหดกลับ						
13	แจ้งกฟส.สข. ปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งกฟส.สข. ปลด Short Ground จุด G2 และเมื่อกฟส.สข. ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
15	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing		สข.	SCADA	R บ้านสระด่าน
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	Dis ชค. DOA03	ปลด	สับ		สข.		DIS ก่อนวัดหนองหิน
18	DBA03R-02	Nonreclosing	Normal		สข.	SCADA	R บ้านสระด่าน
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							

ปฏิบัติงานปักเสาเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 14 มีนาคม 2567

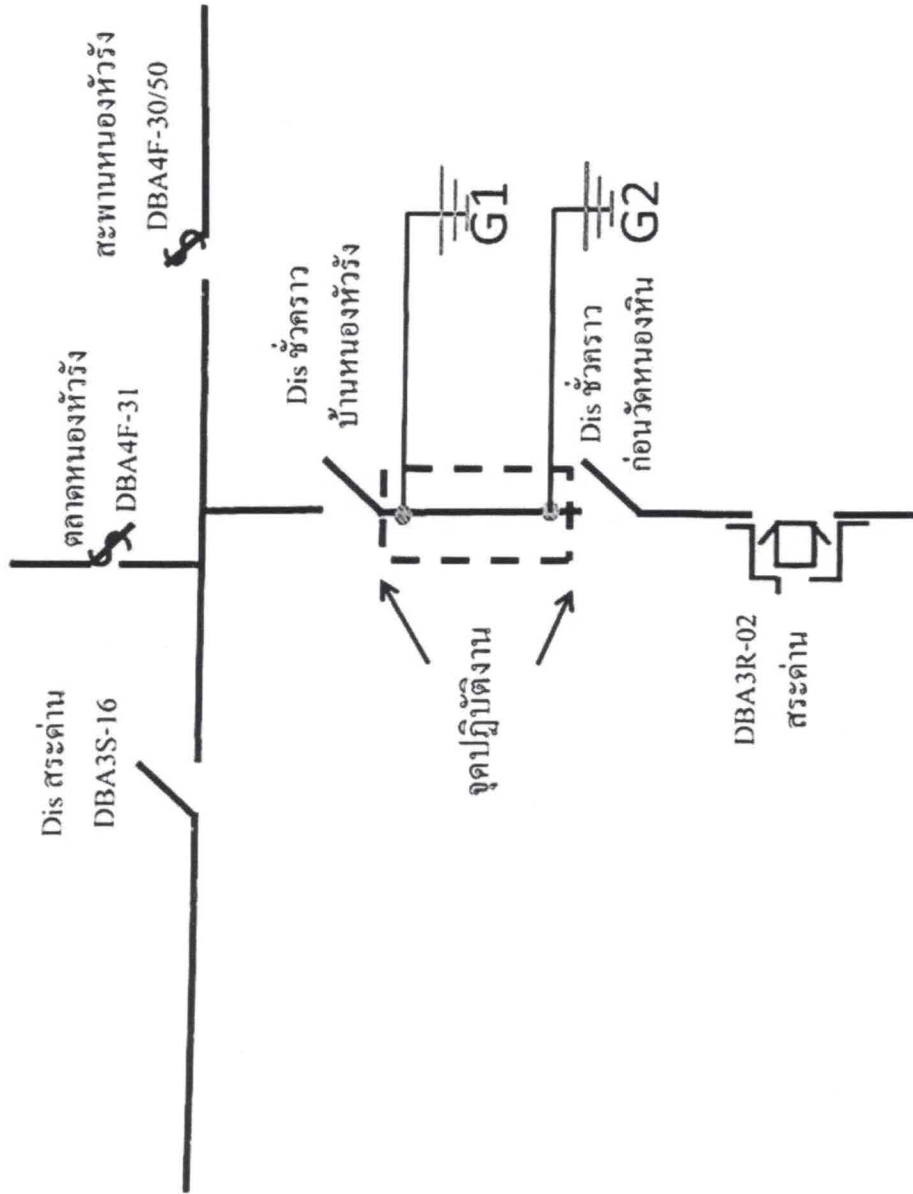

G1 ช็อคกราวด์ นายปิ่นผัด เทพบุตร ควบคุมงาน  
G2 ช็อคกราวด์ นายธวัช จันทร์เพ็ญ ควบคุมงาน
