



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ รื้อถอนสับเปลี่ยนอุปกรณ์ จากDisเป็นSF๖ แผนผังสังเขปแนบ
จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๗ สฟ.๒	๑๕/๓/๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนDis SPA๐๔S-๐๖ เปลี่ยนเป็นSF๖	SPA๐๔S-๐๖	SPA๐๔S-๐๖	โทร.๐๘๑-๔๘๑๕๕๑๓ นายธนภฤต พวงตอกไม้
๒.	๑๐ สฟ.๒	๑/๔/๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนDisชั่วคราววัดสาม นาค เปลี่ยนเป็นSF๖	Disชั่วคราววัด สามนาค	Disชั่วคราววัด สามนาค	โทร.๐๘๑-๖๐๔๑๐๔๓ นายทศพล สังข์ทอง
๓.	๑๐ สฟ.๒	๒/๔/๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนDisบ้านดอนโก SPB๑๐S-๐๖ เปลี่ยนเป็นSF๖	SPB๑๐S-๐๖	SPB๑๐S-๐๖	โทร.๐๘๑-๖๐๔๑๐๔๓ นายทศพล สังข์ทอง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พทง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ SPB10 จาก SPB10S-06 ถึง -

ในวันที่ 2 มี.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 392/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิตติพัฒน์ ติงตอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทงธนากร สุวรรณประทีป

(นายกิตติพัฒน์ ติงตอง)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก.

กคพ.๕๗.
กคพ.๑๗๑, กคพ.๒๒๖.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณต้น Dis SPB10S-06 (ดอนโก)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 เม.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Dis. เป็น SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน 392/2567		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง				วันที่	17 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	17 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	17 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
2	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-	-
3	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-	-
4	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-	-
5	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	-
6	UTG08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สดง.		R	แยกสังขจาย
7	ย้ายโหลด SPB10 บางส่วนไปปรับไฟจาก UTG08							
8	DOA09S-12	ปลด	ล๊اب		สพ.	SCADA	SF6	สามเหลี่ยม
9	SF6 โล้น UTG08	ปลด	ล๊اب		มชล.		SF6	ชค.ป้อมตำรวจไผ่มั่ง
10	SPB10S-06	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		มชล.		DIS	ดอนโก
11	DOA09S-12	ล๊اب	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	สามเหลี่ยม
12	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
13	ปฏิบัติงานโดย Hotline ไม่มี Short Ground							
14	ให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร SPB10 และตั้ง Nonreclosing, ALT UTG08R-01 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน							
2	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-	-
3	SPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	-
5	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
6	UTG08R-01	Block GND	Normal		สดง.		R	แยกสังขจาย
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ปฏิบัติงาน ได้							
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****								
16	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
17	ตรวจสอบสถานะ SF6 ติดตั้งใหม่ SPB10S-06(ดอนโก) อยู่ตำแหน่ง Open ล็อคคาน							
18	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-	-
19	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	-
20	ย้ายโหลด SPB10 บางส่วนกลับจาก UTG08							
21	SPB10S-06	ปลด	ล๊اب		มชล.		SF6	ดอนโก
22	SF6 โล้น UTG08	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		มชล.		SF6	ชค.ป้อมตำรวจไผ่มั่ง
23	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-	-
24	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	-
25	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
26	UTG08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สดง.		R	แยกสังขจาย
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒...เดือน...เมษายน...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... Disบ้านดอนโกSPB๑๐S-๐๖(BAM๐๒S-๑๗รหัสเดิม)...เพื่อ...สับเปลี่ยนDisเป็นSF๖ สถานีสุพรรณบุรี๒... โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเดอร์ ...๑๐... สถานี ...สุพรรณบุรี๒... ตั้งแต่บริเวณ ...Disบ้านดอนโกSPB๑๐S-๐๖(BAM๐๒S-๑๗รหัสเดิม)

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายทศพล สังข์ทอง พชง.ผบ.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๖๑-๔๔๑๗๑๓๔.. เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายพิบูล ปานขำ ..ตำแหน่ง ชม.ปบ.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.....๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕.. เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

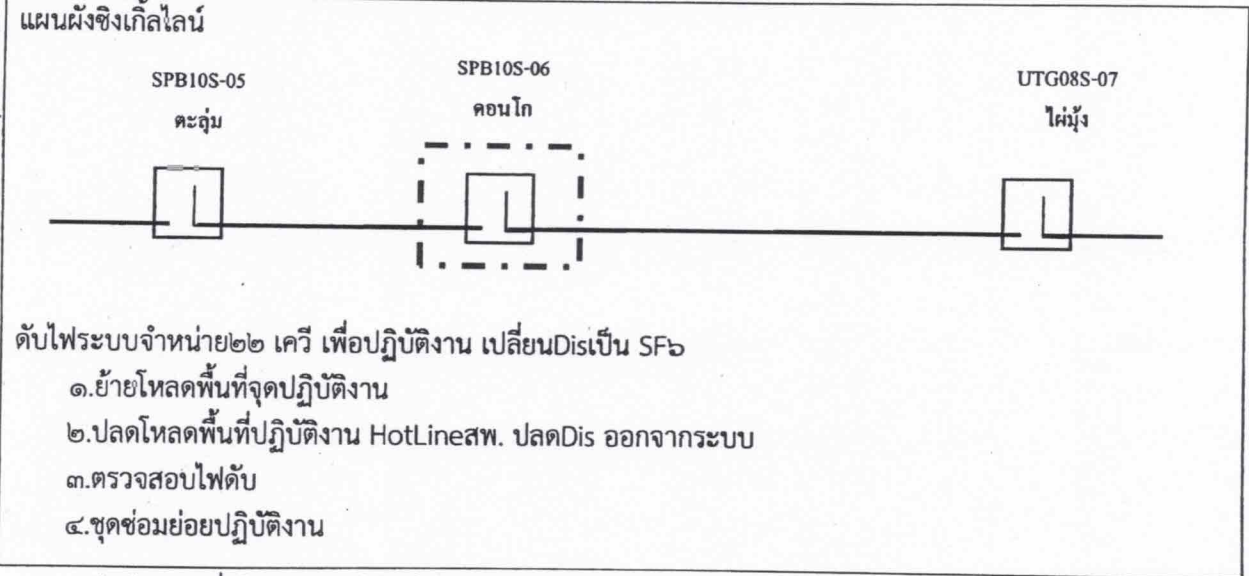

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.
