

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟผ.บค, กฟผ.บว.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



ขั้นตอนการสวิทชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตลาดนัดโรงสีจิวพัฒนา					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24-มี.ค.-67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS เป็น SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน	400/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	12 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิราวัฒน์ วัฒนา, นายพิชชา, นายธีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	LBL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		- โหลด 8.0 MW
3	LBL04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LBL		- โหลด 4.5 MW
4	LBL09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		R บ.เบียร์สิงห์
5	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- โหลด 12.5 MW
6	SPN10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		R สภท.บางตาเถร
7	SPN10R-04	Normal	Nonreclosing, GND		บลง.		R โรงสีจิวพัฒนา
8	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing		บลง.		R คลองขุดใหม่
9	BEA08R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R บ้านคลองขุนพระ
10	ย้ายโหลด LBL09 บางส่วนไปรับจาก SPN10						
11	SPN10S-14	ปลด	สับ		บลง.	SCADA	SF6 คลองรากผักชี
12	LBL09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บลง.		SF6 ตรงข้ามโรงสีจิวพัฒนา
13	ย้ายโหลด LBL04 บางส่วนไปรับจาก BEA09 (ดับไฟย้ายโหลด)						
14	SW. By Pass	ปลด	สับ		บลง.		DIS R โรงสีจิวพัฒนา
15	SPN10R-04	สับ	ปลด		บลง.		R โรงสีจิวพัฒนา
16	DIS ชค. LBL04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS ชค. โรงสียายแป้น
17	D/O	ปลด	สับ		บลง.		D/O วัดเกษตร
18	เมื่อพร้อมดับไฟ						
19	DIS ชค. LBL04	สับ	ปลด		บลง.		DIS ชค. จุด B
20	DIS ชค. LBL09	สับ	ปลด		บลง.		DIS ชค. จุด A (สะพานคลองใหม่)
21	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	LBL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		-
27	LBL04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LBL		-
28	LBL09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		R บ.เปียร์สิงห์
29	SPN-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
30	SPN10R-01	Nonreclosing	Normal		บลง.		R สภต.บางตาเถร
31	BEA08R-03	Nonreclosing	Normal		บล.		R บ้านคลองขุนพระ

สิ้นสุด Switching แรก

32	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
35	LBL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		- โหลด MW
36	LBL04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LBL		- โหลด MW
37	LBL09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		R บ.เปียร์สิงห์
38	SPN-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- โหลด MW
39	SPN10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		R สภต.บางตาเถร
40	BEA08R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R บ้านคลองขุนพระ
41	ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ รหัส LBL04S-13 ตลادنัดโรงสีกิจวัฒนา สถานะ "ปลด+ถือคาน"						
42	DIS ชค. LBL04	ปลด	สับ		บลง.		DIS ชค. จุด B
43	DIS ชค. LBL09	ปลด	สับ		บลง.		DIS ชค. จุด A (สะพานคลองใหม่)
44	ย้ายโหลด LBL04 บางส่วนกลับจาก BEA09 (ดับไฟย้ายโหลด)						
45	D/O	สับ	ปลด		บลง.		D/O วัดเกษตร
46	DIS ชค. LBL04	ปลด	สับ		บลง.		DIS ชค. โรงสียายแป้น
47	SPN10R-04	ปลด	สับ		บลง.		R โรงสีกิจวัฒนา
48	SW. By Pass	สับ	ปลด		บลง.		DIS R โรงสีกิจวัฒนา
49	ย้ายโหลด LBL09 บางส่วนกลับจาก SPN10						
50	LBL09S-05	ปลด	สับ		บลง.		SF6 ตรงข้ามโรงสีกิจวัฒนา
51	SPN10S-14	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	SF6 คลองรากผักชี
52	LBL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		- โหลด MW
53	LBL04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LBL		- โหลด MW
54	LBL09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		R บ.เปียร์สิงห์
55	SPN-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		- โหลด MW
56	SPN10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		R สภต.บางตาเถร
57	SPN10R-04	Nonreclosing,GND	Normal		บลง.		R โรงสีกิจวัฒนา
58	SPN10R-06	Nonreclosing	Normal		บลง.		R คลองชุดใหม่
59	BEA08R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R บ้านคลองขุนพระ

สิ้นสุด Switching

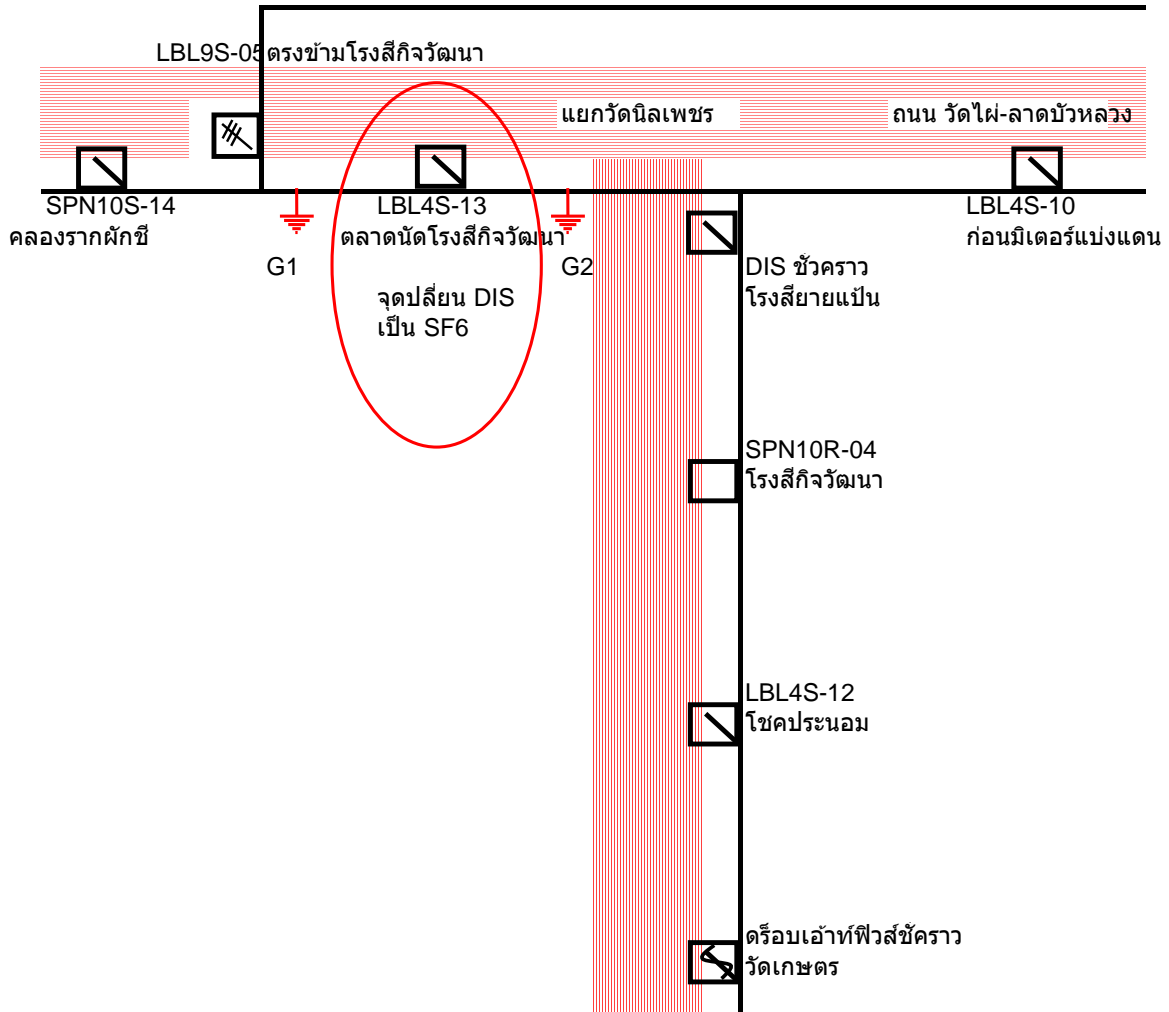

ฝังดับไฟปฏิบัติงาน วันที่ 24 มีนาคม 2567

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

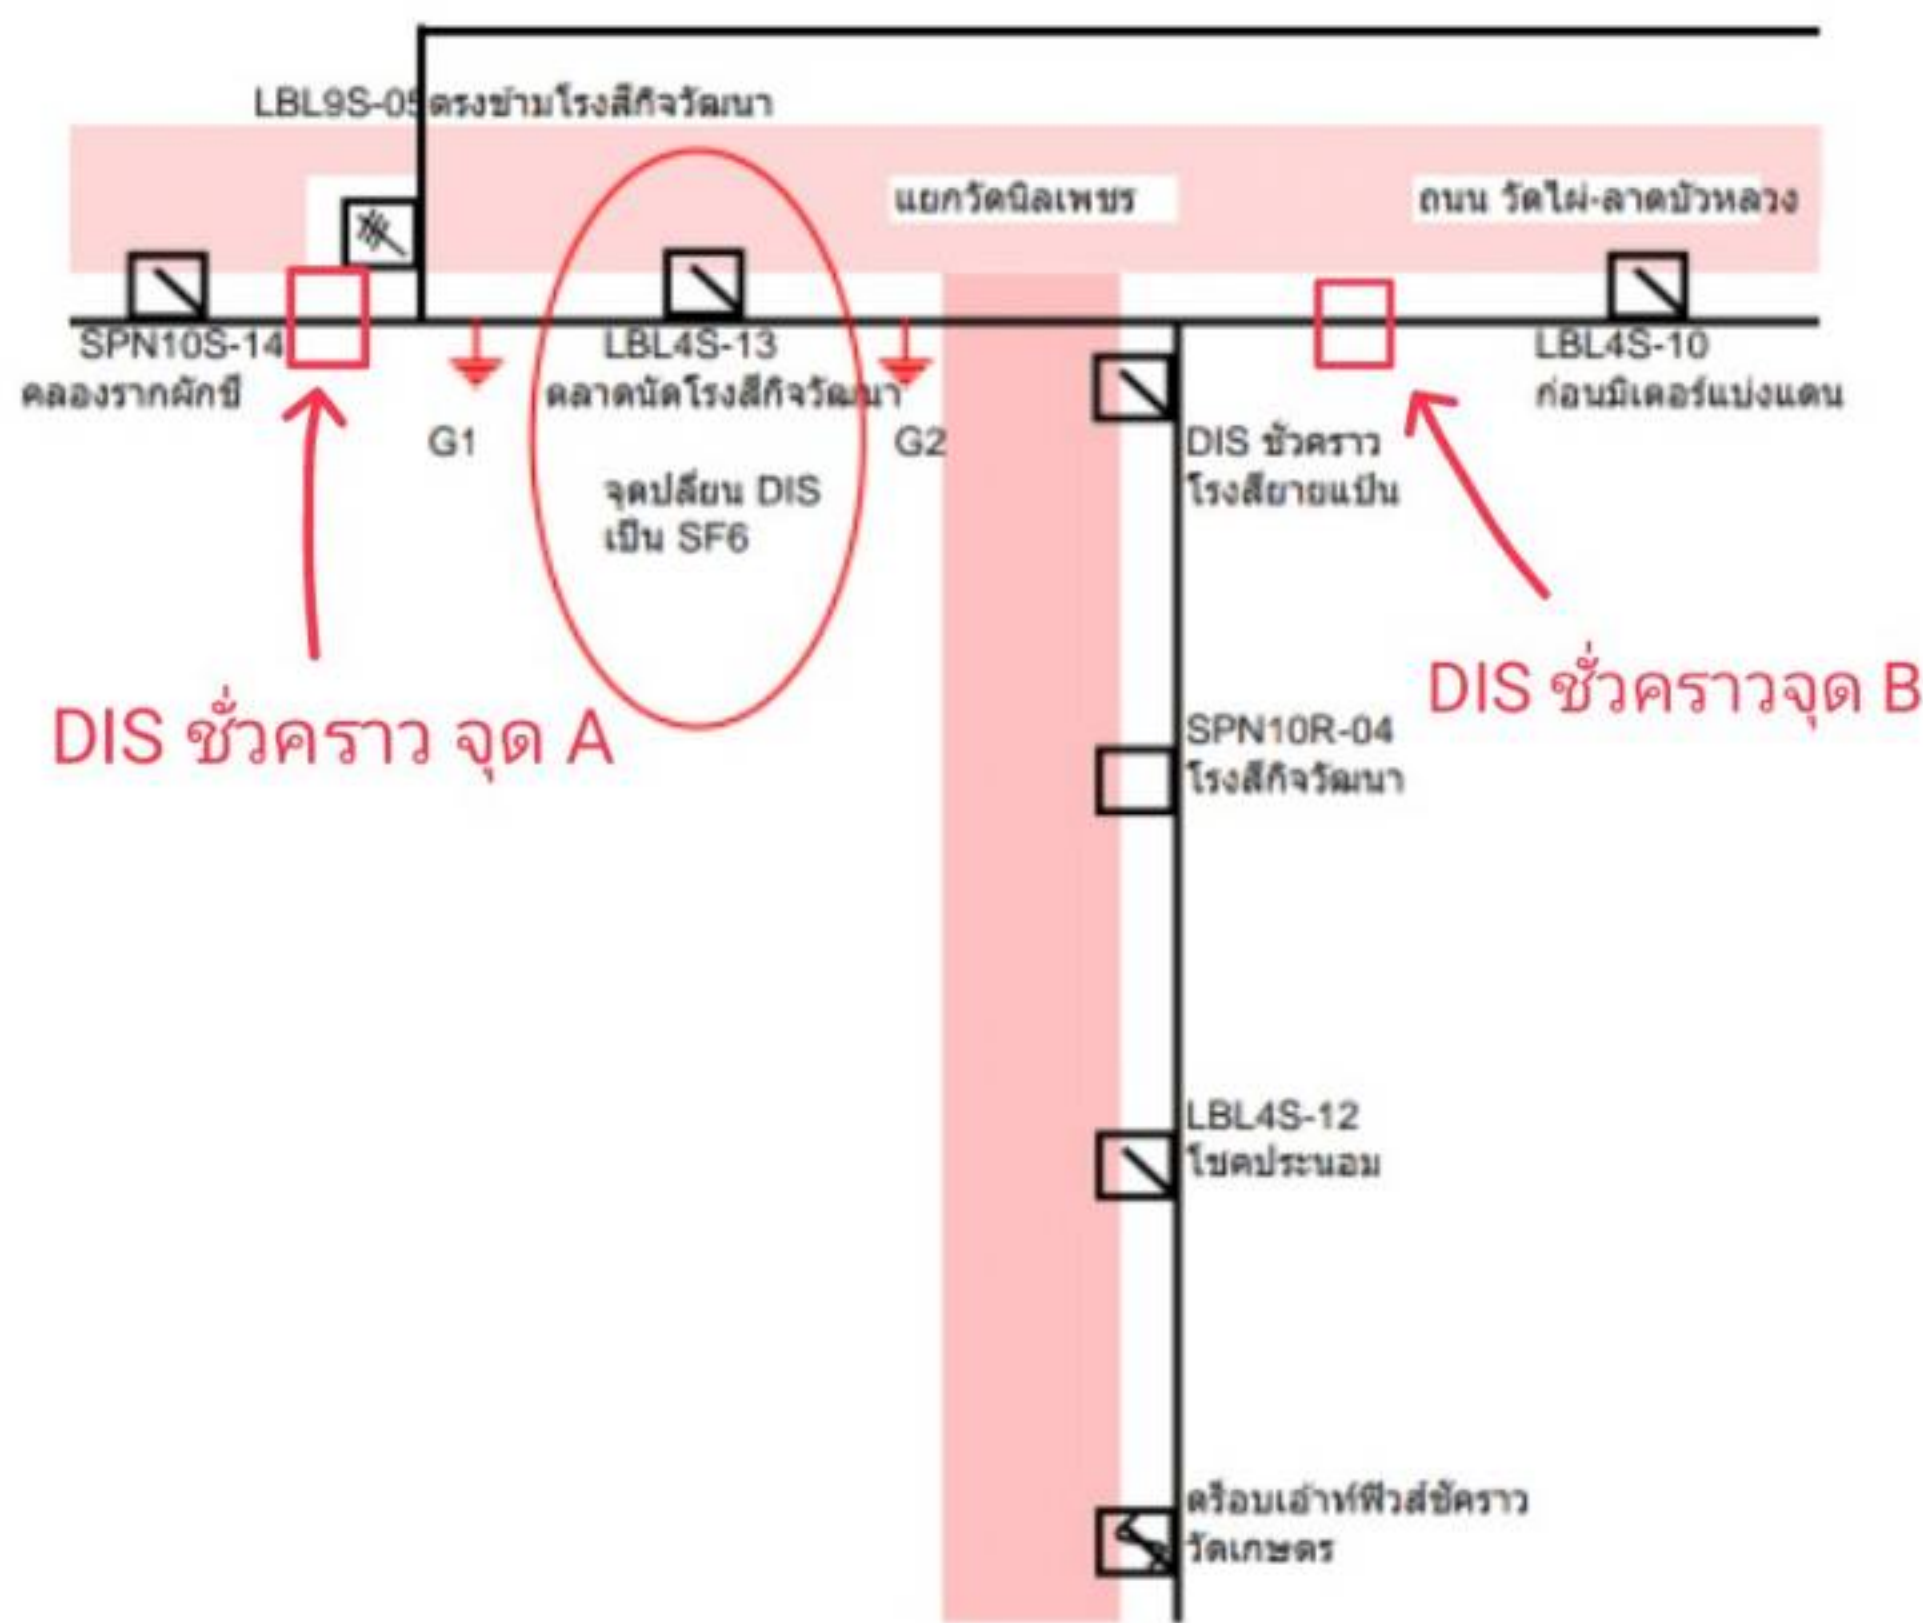

ผังดับไฟปฏิบัติงาน วันที่ 24 มีนาคม 2567
