



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHANGKHAH ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพท.(ก.ป.) ๑๙๖ /๑๕๖๗ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชด ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ผีคศิริ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รีดลอน SF6 บริเวณประตูระบายน้ำบางซอ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F5(สพท.1)	26 มี.ค. 67	09.00	12.00	1.รีดลอน SF6 บริเวณประตูระบายน้ำบางซอ	SPN055-53 ประตูระบายน้ำ บ้านบางซอ	SPN055-50 ประตูระบายน้ำ บ้านบางซอ	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕๒๑๕๖๕๕๕
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ประตูระบายน้ำบ้านบางซอ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ...นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.อ.สองพี่น้อง.....โทร ๐๘๑-๙๔๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประเสริฐ ผีคศิริ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.สพท..

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPNS จาก SPN55-53 ถึง SPN55-55
ในวันที่ 26 มี.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 427/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จรรณหงษ์ นกทต ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต

(นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต)
๖๐๓.5 ทน น.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อ.สพท.

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงชื่อลงแจ้งแผนดับไฟลงใน www.ega.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน รือถอน SF6 ประตุน้ำบ้านบางซอ SPN05S-50
2. กำหนดวันที่ทำงาน 26 มี.ค. 67 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สพน. งานที่ทำ รือถอน SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 427/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 15 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 15 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 15 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายพิรภทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต,นางสาวสุธัชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโช,นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร,นายวัฒนา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.		R บ้านสามแก้ว
3	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.		R ประตุน้ำบางสาม
4	- ย้ายโหลด SPN05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN10						
5	SPN05S-09	ปลด	สับ		สพน.		DIS ประตุน้ำบางปลาแร่
6	SPN05S-50	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		SF6 ชค. ประตุน้ำบ้านบางซอ
7	- ดับไฟ เวลา 09.00น.						
8	SPN05S-53	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS ชค. ประตุน้ำบ้านบางซอ
9	แจ้งกฟส.สพน.ทำการไลน์โหลดก่อนให้ฮอทไลน์ปลด DDE บริเวณประตุน้ำบางซอ						
10	หลังจากกฟส.สพน.ทำการไลน์โหลดก่อนให้ฮอทไลน์ปลด DDE บริเวณประตุน้ำบางซอ แล้วเสร็จ						
11	แจ้งกฟส.สพน.ให้ฮอทไลน์ปลด DDE บริเวณประตุน้ำบางซอ ออกจากกันทั้งสามเฟส						
12	หลังจากกฟส.สพน.ให้ฮอทไลน์ปลด DDE บริเวณประตุน้ำบางซอ ออกจากกันทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สพน.รับทราบ						
14	แจ้งกฟส.สพน.เทสไฟดับก่อนทำการช็อคกราวด์						
15	แจ้งกฟส.สพน.ช็อคกราวด์ จุด G1						
16	แจ้งกฟส.สพน.ช็อคกราวด์ จุด G2						
17	แจ้งกฟส.สพน.ปฏิบัติงานทำงานได้						
18	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.		R บ้านสามแก้ว
19	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.		R ประตุน้ำบางสาม
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	หลังจากกฟ.สพ.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
21	แจ้งกฟ.สพ.ปลดข้อตกราวด์ จุด G1						
22	แจ้งกฟ.สพ.ปลดข้อตกราวด์ จุด G2						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง						
24	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R บ้านสามแก้ว
25	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R ประตุน้ำบางสาม
26	- จ่ายไฟ						
27	แจ้งกฟ.สพ.ให้ฮอทไลน์เชื่อม DDE บริเวณประตุน้ำบางซอ เข้าทั้งสามเฟส						
28	หลังจากกฟ.สพ.ให้ฮอทไลน์เชื่อม DDE บริเวณประตุน้ำบางซอ เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
29	- ย้ายโหลด SPN05 บางส่วนกลับคืนจาก SPN10						
30	SPN05S-53	ปลด	สับ		สพ.		DIS ชค.ประตุน้ำบ้านบางซอ
31	SPN05S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ประตุน้ำบางปลาเจ้า
32	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R บ้านสามแก้ว
33	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R ประตุน้ำบางสาม
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 26 มิ.ค. 67 เวลา 09.00-12.00 น.

บริเวณ บ้านบางซอ

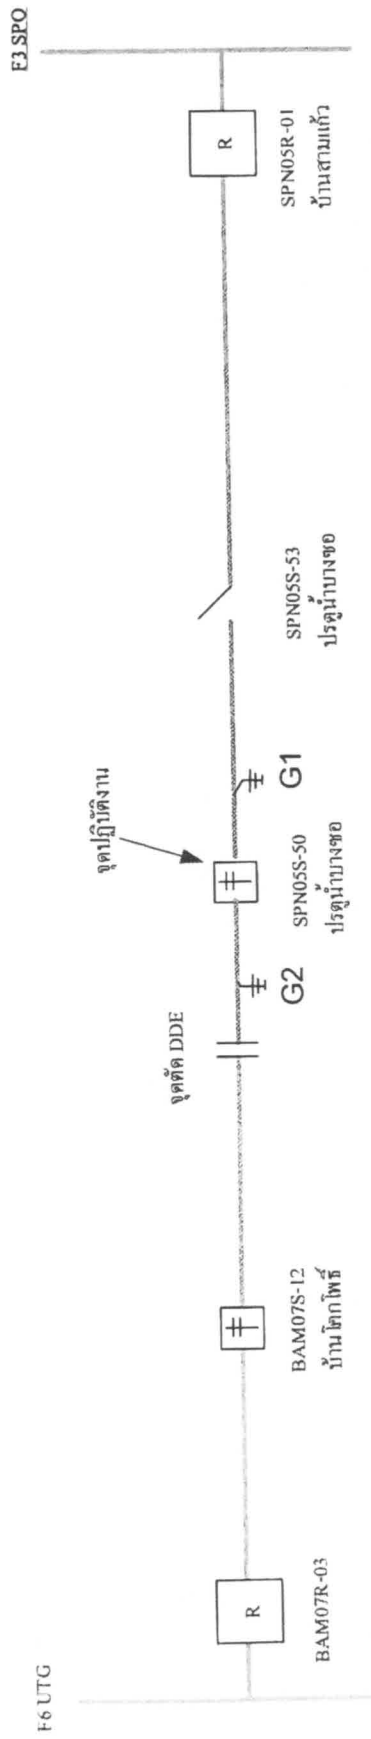

หมายเหตุ จุดตัด DDE ปฏิบัติงานโดยชุด ออกไลน์กระแสเข้า
