



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

27 มี.ค. 67

เลขที่ ก.3.คณ.(ปบ) 312/2567

วันที่ 15 มี.ค. 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมนางนางนวล ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น
ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DAA 05	1 เม.ย. 67	08.30 น.	16.30 น.	ปักเสาแรงสูง ๒๒ ม. เพื่องานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี บ้านหนองกระทุ่ม	ดิสชั่วคราว หน้ารุ่งสวัสดิ์ ค่ำไม้	DAA55-04 หน้า บ.สยามโซลาร์	นายอำนวยการ กิตติ โพนันท์ วศก.9 กรย.(ก3) 086-2691259

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ DAA5 จาก DIS ช.รุ่งสวัสดิ์ค้ำไม้ DAA55-04

ในวันที่ 1 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 431/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศรินทร์ อธิธาวิสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทอวรินทร์ ศรีศักดิ์ศรี

19 มี.ค. 67

(ทอวรินทร์ อธิธาวิสิน)
วศก. ๖1111 น.พ.ดบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.อบ., กฟผ.อส.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง...../.....แผ่น

แผนผังแนบ...../.....แผ่น



ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตำบลหนองกระทุ่ม วงจร DAA05					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 เม.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปักเสา 22 เมตร		ตามใบขอปฏิบัติงาน	431/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน			วันที่	19 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรัสวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
3	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
4	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA04						
5	DAA04S-06	ปลด	สับ		ดช.		DIS ดึงข้ามถนน บ.บ่อกรู
6	DIS ชั่วคราว DAA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS หน้ารุ่งสวัสดิ์ค้าไม้
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	DAA05S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6 หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
12	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเตสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
14	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
18	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
19	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
20	แจ้งหน้างาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
21	แจ้งหน้างาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DAA05S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดช.		SF6 หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี
24	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วนกลับจาก DAA04						
25	DIS ชั่วคราว DAA05	ปลด	สับ		ดช.		DIS หน้ารุ่งสวัสดิ์ค้าไม้
26	DAA04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS ดึงข้ามถนน บ.บ่อกรู
27	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
28	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไปไฟเพื่อก่อสร้างสายส่ง 115 เควี
 วงจร DAA 05 ตั้งแต่ DISชั่วคราวหน้ารุ่งสวัสดิ์ค้ำไม้ ถึง DAA5S-04 หน้า บ.สยามโซลาร์

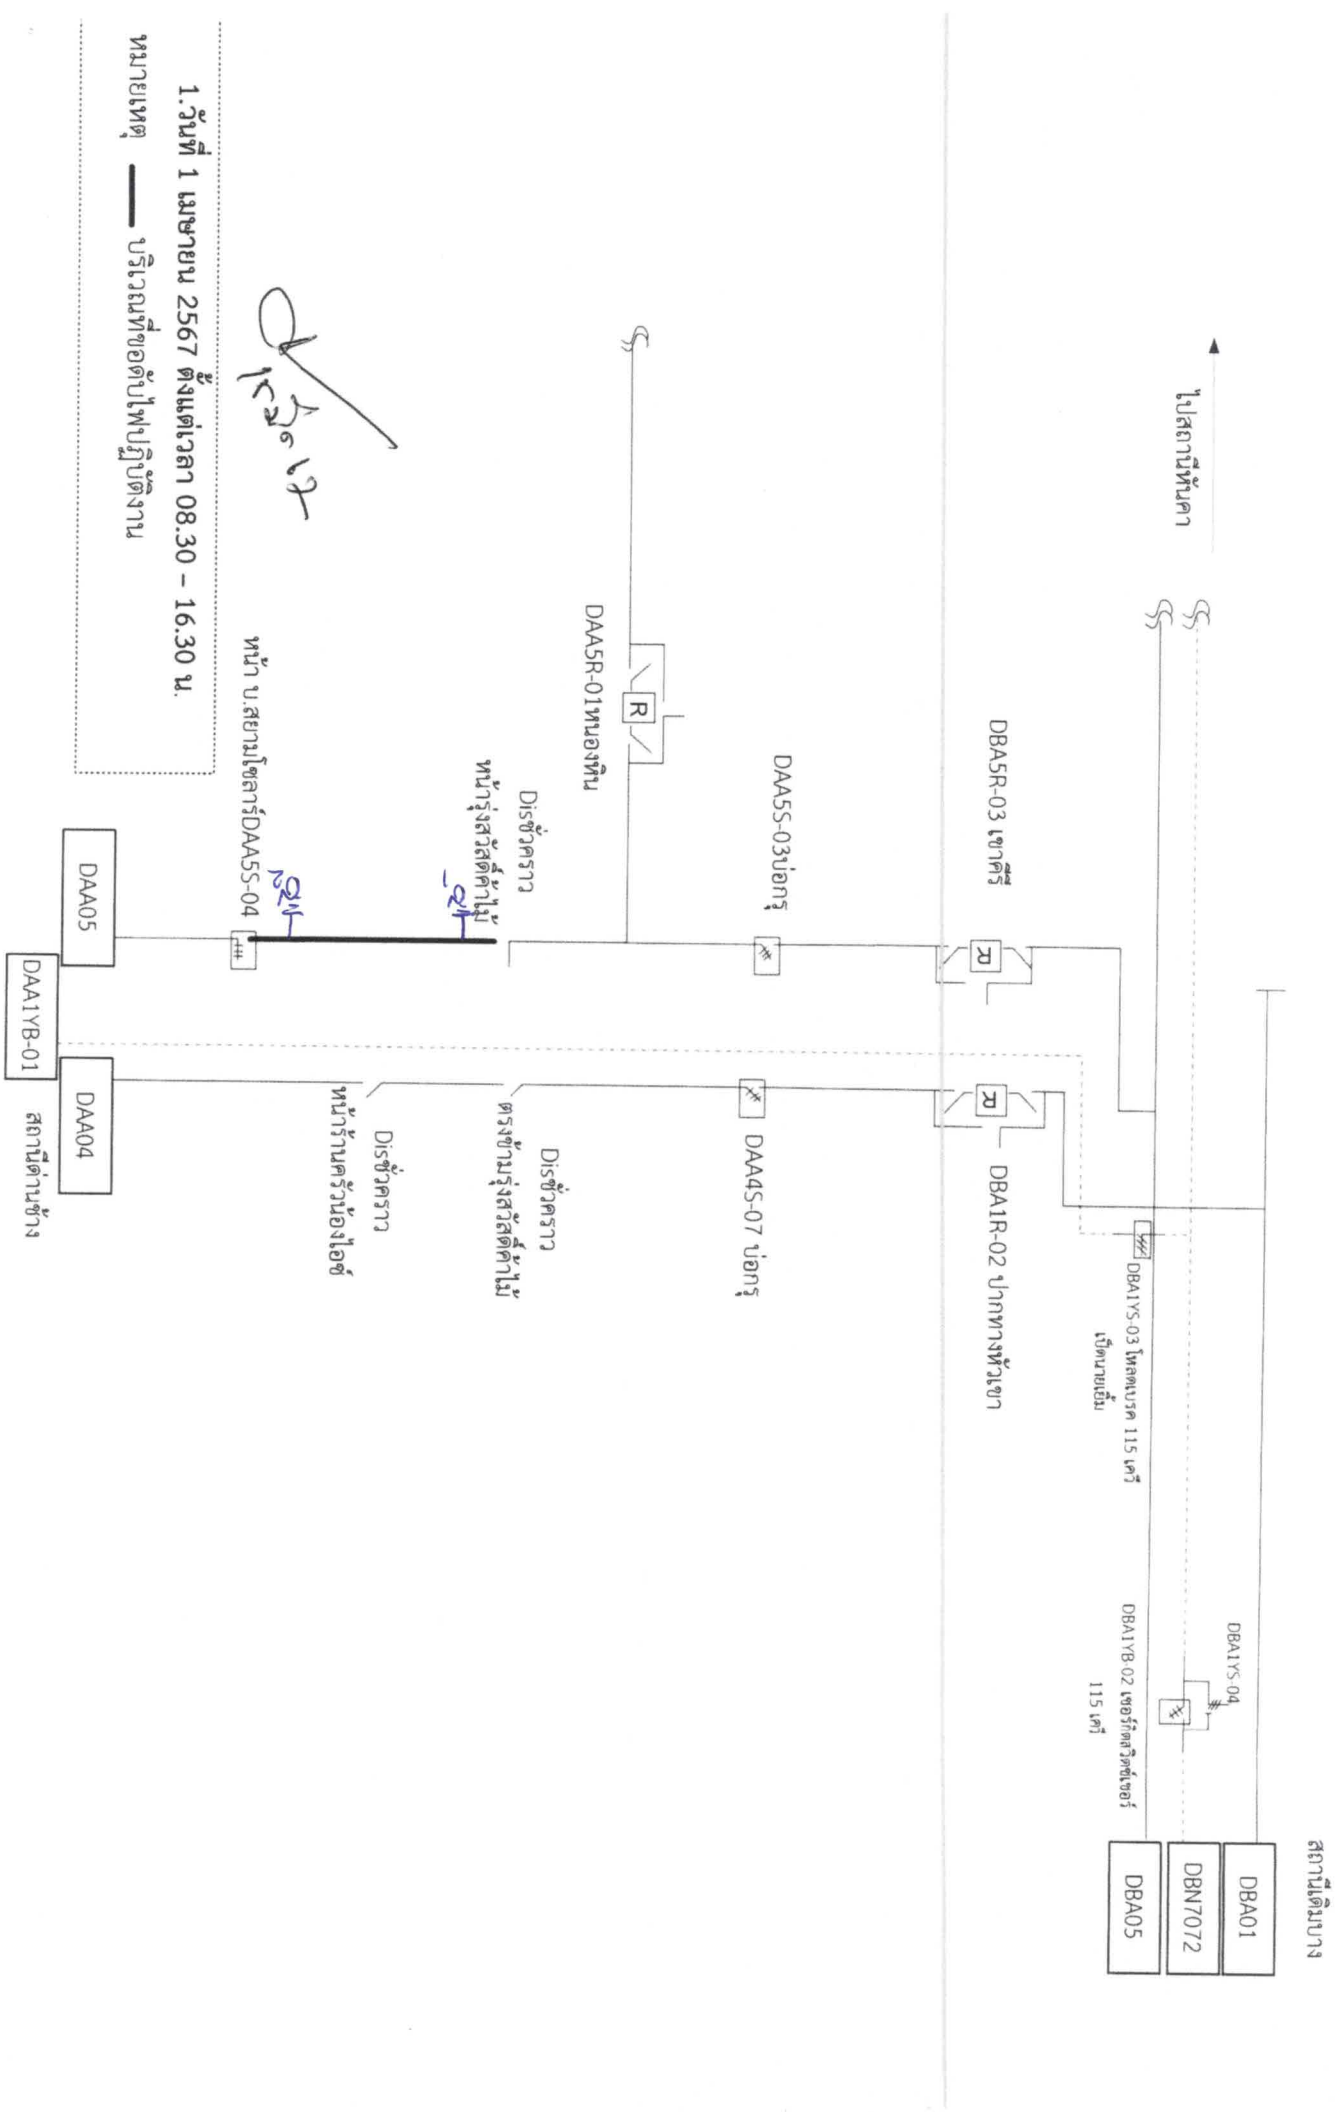

Handwritten signature

1. วันที่ 1 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไปไฟปฏิบัติงาน



บริษัท ศรีชลธร จำกัด

15/20 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02-102-857-3 แฟกซ์ 02-102-857-3 อีเมล info@srichonlathorn.com

www.srichonlathorn.com

SCT-CM-24-260

วันที่ 15 มีนาคม 2567

โครงการ งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด
จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง กำหนดการดับไฟเพื่อติดตั้งเสาโครงเหล็กโมโนโพล

เรียน ผู้จัดการโครงการ PEA ENCOM (นายวชิระ พิทักษ์ตันสกุล)

สำเนาเรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอเดิมบางนางบวช
ผู้ควบคุมงาน (นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์ วศก.9 กรย.(ก3))

อ้างอิง สัญญาเลขที่ จจ.(นทค.) BASP-SCT – 2/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน 1 ชุด

ตามที่อ้างอิง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด ให้ดำเนินการงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

บริษัท ศรีชลธร จำกัด ขอแจ้งกำหนดการดับไฟระบบ 22- 115 เควี เพื่อติดตั้งเสาโครงเหล็ก (Mono Pole) ช่วง ถนนทางหลวงหมายเลข 3350 - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4086 บริเวณ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเชื่อมโยงสายส่ง 115 เควีที่ก่อสร้างใหม่เข้ากับระบบจำหน่ายเดิม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรภัทร ลือขจร)

ผู้จัดการโครงการ

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

นางสาวกัญญ์วณิชช์ วงษ์สนอง

093-329-8963
