



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นฐ.(ปน) ๖๖๐ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพฤษ์

Switching Deadline

20 มี.ค. 67

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานย้ายเสาระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๔ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPW03	21 มีนาคม 2567	9.00 น.	15.00 น.	เปลี่ยนดิสเป็น SF๖ รหัส NPV๒S-๐๕ ข้าง.ร.ร.สิรินธร	NPV๒S-๐๕ ข้าง.ร.ร.สิรินธร	DDE ได้สายส่ง EGAT	นายธรรมรงค์ ขุนเที่ยงธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ไม่มี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง หน.ปน.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๙๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย...ศรีจารุพฤษ์)

ตำแหน่ง รจก(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPW3 จาก NPV2S-05 ถึง DDE ได้สายส่ง EGAT
ในวันที่ 21 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 433/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิ ใจภักดิ์ ประสานงานการตัดไฟกับ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์
19 มี.ค. 67

(นาย จิรวุฒ์ บึงบัวเงิน)
๐๘(๐.5) ๖๓๗ ๖๖.๐๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. ๒๕

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 แผ่น



ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณข้าง รร.สิรินธร

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณข้าง รร.สิรินธร			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 มี.ค. 67	ระหว่าง	9:00 น.	ถึง 15:00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง SF6 แทน DIS (NPV02S-05) ตามใบขอปฏิบัติงาน 433/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่	19 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	19 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	19 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		-
3	NPW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		-
4	ย้ายโหลด NPW03 บางส่วน ไปจ่ายจาก NPW01						
5	BPA09S-11	ปลด	สับ		นธ.	SCADA	DIS
6	NPV02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS
7	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการปลดจุดจัม บริเวณไลน์แยกข้าง รร.สิรินธร ออกทั้ง 3 เฟส						
8	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการปลด DDE บริเวณใต้สายส่ง EGAT ออกทั้ง 3 เฟส						
9	หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้า ดำเนินการทั้ง 2 จุด แล้วเสร็จ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุดจัม G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุดจัม G2						
12	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
13	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
14	NPW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		-
15	NPW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
16	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุดจัม G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุดจัม G2						
19	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
20	NPW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		-
21	NPW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		-
22	แจ้ง กฟจ.นธ. ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ NPV02S-05 ข้าง รร.สิรินธร อยู่สถานะ "ปลด" พร้อมล๊อคคาน						
23	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการเชื่อมจุดจัม บริเวณไลน์แยกข้าง รร.สิรินธร เข้าทั้ง 3 เฟส						
24	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณใต้สายส่ง EGAT เข้าทั้ง 3 เฟส						
25	หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้า ดำเนินการทั้ง 2 จุด แล้วเสร็จ						
26	ย้ายโหลด NPW03 บางส่วน กลับคืนจาก NPW01						
27	NPV02S-05	ปลด, ล๊อคคาน	สับ		นธ.		SF6
28	BPA09S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS
29	NPW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		-
30	NPW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

DDE ใต้สายส่ง EGAT

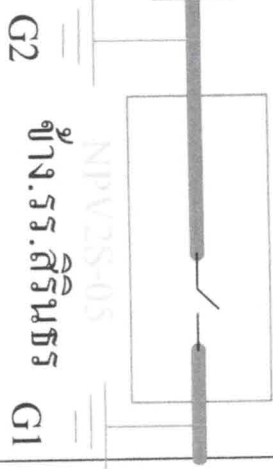

BPVA9S-06

หมู่บ้านศิรินคร

พื้นที่ลุ่มไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดชอตกราวด์

รร.ศิรินคร

NPV2S-06

#
