



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บอ.) ๕๖๕ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นาย พัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Break Switch ๑๑.๕kV พุนทรีย์แค่น รหัส SMB๐๑YS-๐๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Load Break Switch ๑๑.๕kV พุนทรีย์แค่น	๒๖ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับไฟบำรุงรักษา อุปกรณ์ Load Break Switch ๑๑.๕ kV พุนทรีย์แค่น รหัส SMB๐๑YS-๐๑	จุดต่อสาย ต้น 45	จุดต่อสาย ต้น 69	นาย วราวุธ วิรุณารักษ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวราวุธ วิรุณารักษ์ ตำแหน่ง ชผ.บอ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๕๕๙๙๐๙๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

๑๙ มี.ค.๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก DDE ต้น 45 ถึง DDE ต้น 69
ในวันที่ 26 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 448/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิรุณารักษ์ ร่วมโพธิทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวราวุธ วิรุณารักษ์

(Signature)

(นายวิรุณารักษ์ บัณฑิต)

อก.๕ แทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน Load Break Switch 115 kv SMB01YS-01 (ฟลูออรีนแคน)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 26 มี.ค. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 448/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง วันที่ 24 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย _____ วันที่ 24 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 24 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย _____
1. นายสมิทธิพร,นางสาวสุรัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิชร์,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SN2-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 kv SMB01YS-01 (ฟลูออรีนแคน) สถานะโชว์ OPEN						
6	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี ปลดสายส่งด้าน Source และ ด้าน Load ออก (ชุดพีศรายุทธ) วันที่ 45 พ.ค. 2567						
7	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี ปลดสายส่งด้าน Source และ ด้าน Load แล้วเสร็จ						
8	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SN2-7012	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	แจ้ง กบข.(ก3) ลงข้อมูลใน WeSafe						
12	แจ้ง กบข.(ก3) ปฏิบัติงานบำรุงรักษา Load Break Switch 115 kv SMB01YS-01 (ฟลูออรีนแคน) ได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
13	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานบำรุงรักษา Load Break Switch 115 kv SMB01YS-01 (ฟลูออรีนแคน) แล้วเสร็จ ตรวจสอบอยู่สถานะ OPEN						
14	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SN2-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่งด้าน Source และ ด้าน Load เข้า (ชุดพีศรายุทธ)						
18	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่งด้าน Source และ ด้าน Load แล้วเสร็จ						
19	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
20	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SN2-7012	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							

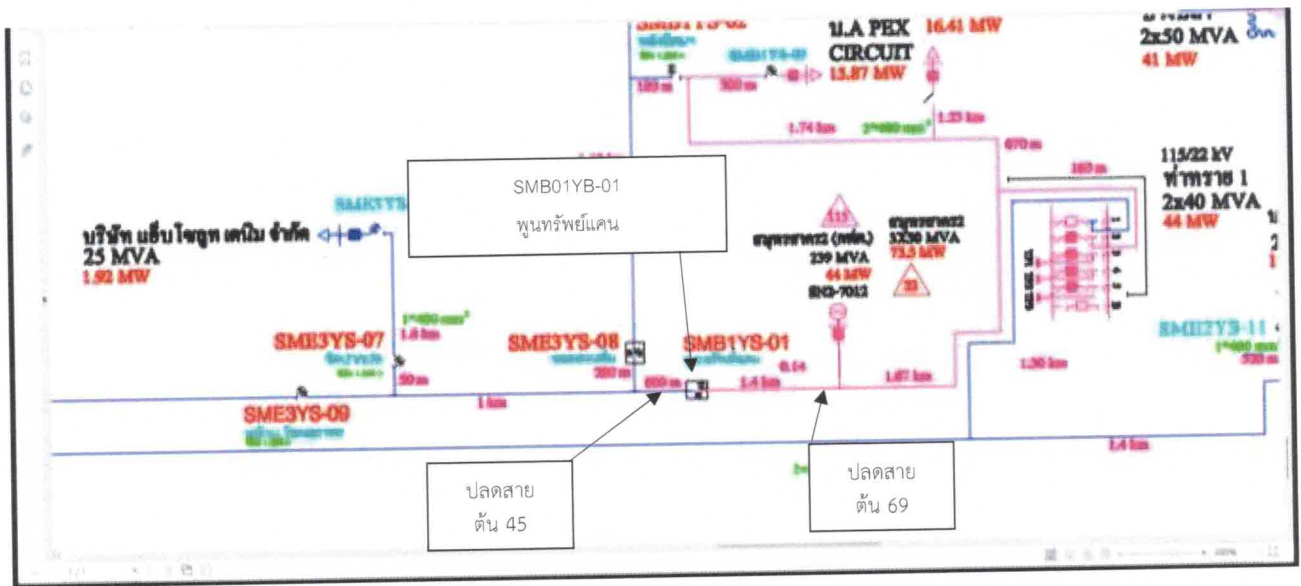

SMB01YB-01
พุนทรัพย์แดน

ปลดสาย
ต้น 45

ปลดสาย
ต้น 69
