



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

13 ม.ค. 2567

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.) 00077
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัตเส็ง

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟปักเสา ๒๒ เมตร ช่วง รีโคสเซอร์ SAB&R-๐๑-บ่อกึ่ง(บีมคอสโม
เก่า) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๔ ม.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	-ตัดไฟปักเสา ๒๒ เมตร ช่วง รีโคส เซอร์ SAB&R-๐๑-บ่อกึ่ง(บีมคอสโมเก่า)	SAB&R-๐๑	Disชั่วคราวโค้งบ่อ กึ่ง(บีมคอสโมเก่า)	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๗๒๙๖๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่รีโคสเซอร์คลองจินดา(SAB&R-๐๑) - โค้งบ่อกึ่ง(บีมคอสโมเก่า) ๖

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๖๑๑ ๘๒.๒๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยัตเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พีดเดอร์ SAB5 จาก SAB5R-01 ถึง DIS โค้งบ่อกึ่ง
ในวันที่ 14 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 51/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นริศนทร์ สิงห์ทาวลี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกฉิม

(นาย นริศนทร์ สิงห์ทาวลี
อ.ก.๓ ๓๓๖ ม.ค.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สพ.ร.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณโค้งบ่อกุ่ม ถึง รีโคลสเซอร์ อบต.คลองจินดา (SAB05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ม.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปักเสา 22 เมตร	ตามใบขอปฏิบัติงาน	51/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน			วันที่	5 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SAB5R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
4	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		
5	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R ปากทางจินดา
6	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปจ่ายจาก SAV04						
7	NPT10S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 วัดปริมาตร
8	SAB5R-01	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
9	SW. Load SAB5R-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS SW Load R อบต.คลองจินดา
10	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
11	DIS ชั่วคราว SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS โค้งบ่อกุ่ม (บี้มคอสมไม่เก่า)
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
13	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
15	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
16	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
17	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		
18	NPT10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R ปากทางจินดา
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe						
21	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
22	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
23	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		
24	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R ปากทางจินดา
25	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
26	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	DIS ชั่วคราว SAB05	ปลด	สับ		สพร.		DIS โค้งบ่อกุ่ม (บี้มคอสมไม่เก่า)
29	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนกลับจาก SAV04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SW. Load SAB5R-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS SW Load R อบต.คลองจินดา
31	SAB5R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
32	NPT10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 วัดปริมาตร
33	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
34	SAB5R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
35	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		
36	NPT10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R ปากทางจินดา

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

ช่วง รีโคลสเซอร์ อบต.คลงจندا(SAB5R-01) – บ่อกุง(บมคอสไมเกา)

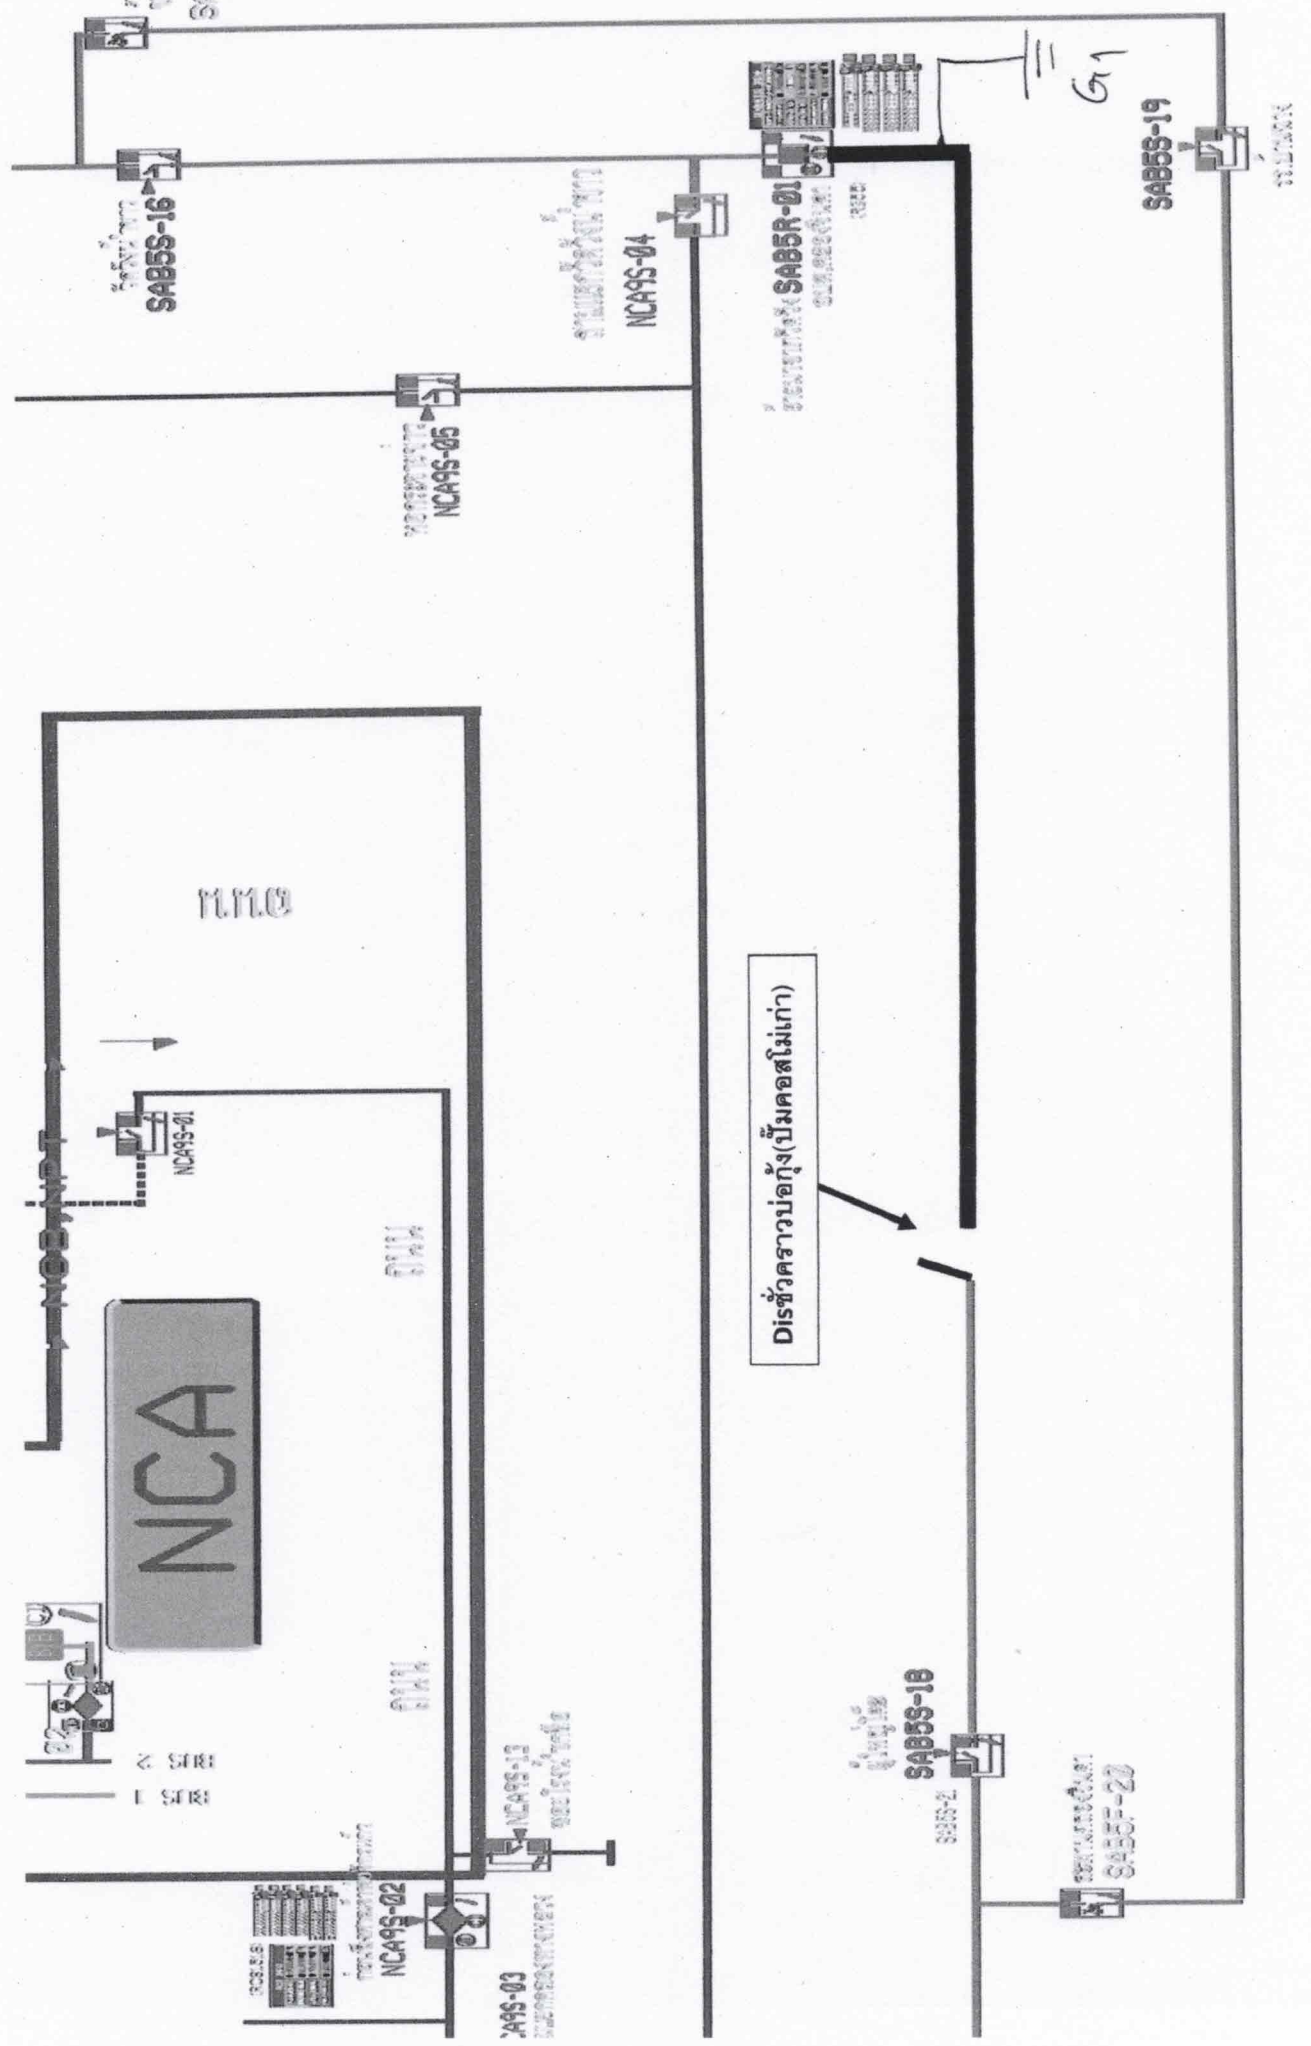

Discharge บ่อกุง(บมคอสไมเกา)

SAB5S-18

SAB5F-20

SAB5S-19

SAB5F-13

NCA

NCA9S-01

NCA9S-02

NCA9S-03

NCA9S-13

NCA9S-04

SAB5R-01

SAB5S-16

NCA9S-05

SAB5S-2

G1
