



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 เม.ย. 67

เลขที่ ก.๓ กฟส.กทบ.(ปบ) - ๐๘๓/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล

ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน หน้า รพ.สต.ท่าไม้ ม.๗ จนถึง หน้าบริษัท ไทยนำ โพลีแพค จำกัด (ซอยวัดนางสาว ๒) ตามแผนผังส่งแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTD ๐๘	๒๑ เม.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวระบบไฟฟ้า (ซอย วัดนางสาว ๒) กทบ_ย้ายแนว_วัดนางสาว	DDE จุด A หน้า รพ.สต.ท่า ไม้ ม.๗	DDE จุด B หน้าบริษัท ไทย นำ โพลีแพค จำกัด	นายนพพร ชาวไชยศรี ทผ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานจำนวน ๒๐๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ทผ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTD 8 จาก DDE หน้า รพ.สต.ท่าไม้ ม.๗ โพลีแพค
ในวันที่ 21 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 527/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ว. 12 เม.ย. 67 ประสานงานการขอดับไฟกับ นายนพพร ชาวไชยศรี

(นายจิรวัฒน์ เกียรติวัณ)

จตจ-5 หน้า ช.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟส. กทบ.

อก.บช.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

ผจก. (สถานี) -

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณซอยวัดนางสาว 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 เม.ย. 67	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟล.กทบ.	งานที่ทำ ย้ายแนวระบบไฟฟ้า	ตามใบขอปฏิบัติงาน 527/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 14 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- -
3	KTD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- -
4	ย้ายโหลด KTD08 บางส่วน ไปรับไฟจาก KTD06						
5	KTD08S-04	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		กทบ.		SF6 ตลาดนัดหน้านนทบุรี
6	KTD08S-02	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.		SF6 S.K. FOOD
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส (หม้อแปลงจำนวน 1 ลูก)						
9	แจ้งชุดฮอตไลน์ ทำการตัด DDE จุด A บริเวณหน้า รพ.สต.ท่าไม้ ม.7 ออกทั้ง 3 เฟส						
10	หลังจากชุดฮอตไลน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ						
11	KTD08S-02	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		กทบ.		SF6 S.K. FOOD
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส (หม้อแปลงจำนวน 3 ลูก)						
13	แจ้งชุดฮอตไลน์ ทำการตัด DDE จุด B บริเวณหน้าบริษัท ไทยนำโพลีแพค จำกัด ออกทั้ง 3 เฟส						
14	หลังจากชุดฮอตไลน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกราวด์จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกราวด์จุด G2						
17	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
18	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
19	KTD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- -
20	KTD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกราวด์จุด G1						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกราวด์จุด G2						
24	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
25	KTD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- -
26	KTD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- -
27	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งชุดขอทไลน์ ทำการเชื่อม DDE จุด B บริเวณหน้าบริษัท ไทยนำโพลีแพค จำกัด เข้าทั้ง 3 เฟส						
29	หลังจากชุดขอทไลน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ						
30	KTD08S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 S.K. FOOD
31	แจ้งชุดขอทไลน์ ทำการเชื่อม DDE จุด A บริเวณหน้า รพ.สต.ท่าไม้ ม.7 เข้าทั้ง 3 เฟส						
32	หลังจากชุดขอทไลน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ						
33	ย้ายโหลด KTD08 บางส่วน กลับจาก KTD06						
34	KTD08S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 S.K. FOOD
35	KTD08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตลาดนัดหน้านันยาง
36	KTD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- -
37	KTD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- -
สิ้นสุด Switching							


แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณ หน้า บริเวณ หน้า รพ.สต.ท่าไม้ ม.7 จนถึง หน้าบริษัท ไทยนำ โพลีแพค จำกัด (ซอยวัดนางสาว 2) เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กพล.กทบ. ปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบไฟฟ้า บริเวณ หน้า รพ.สต.ท่าไม้ ม.7 จนถึง หน้าบริษัท ไทยนำ โพลีแพค จำกัด (ซอยวัดนางสาว 2) วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2567 เวลา 8.30 – 17.00 น.

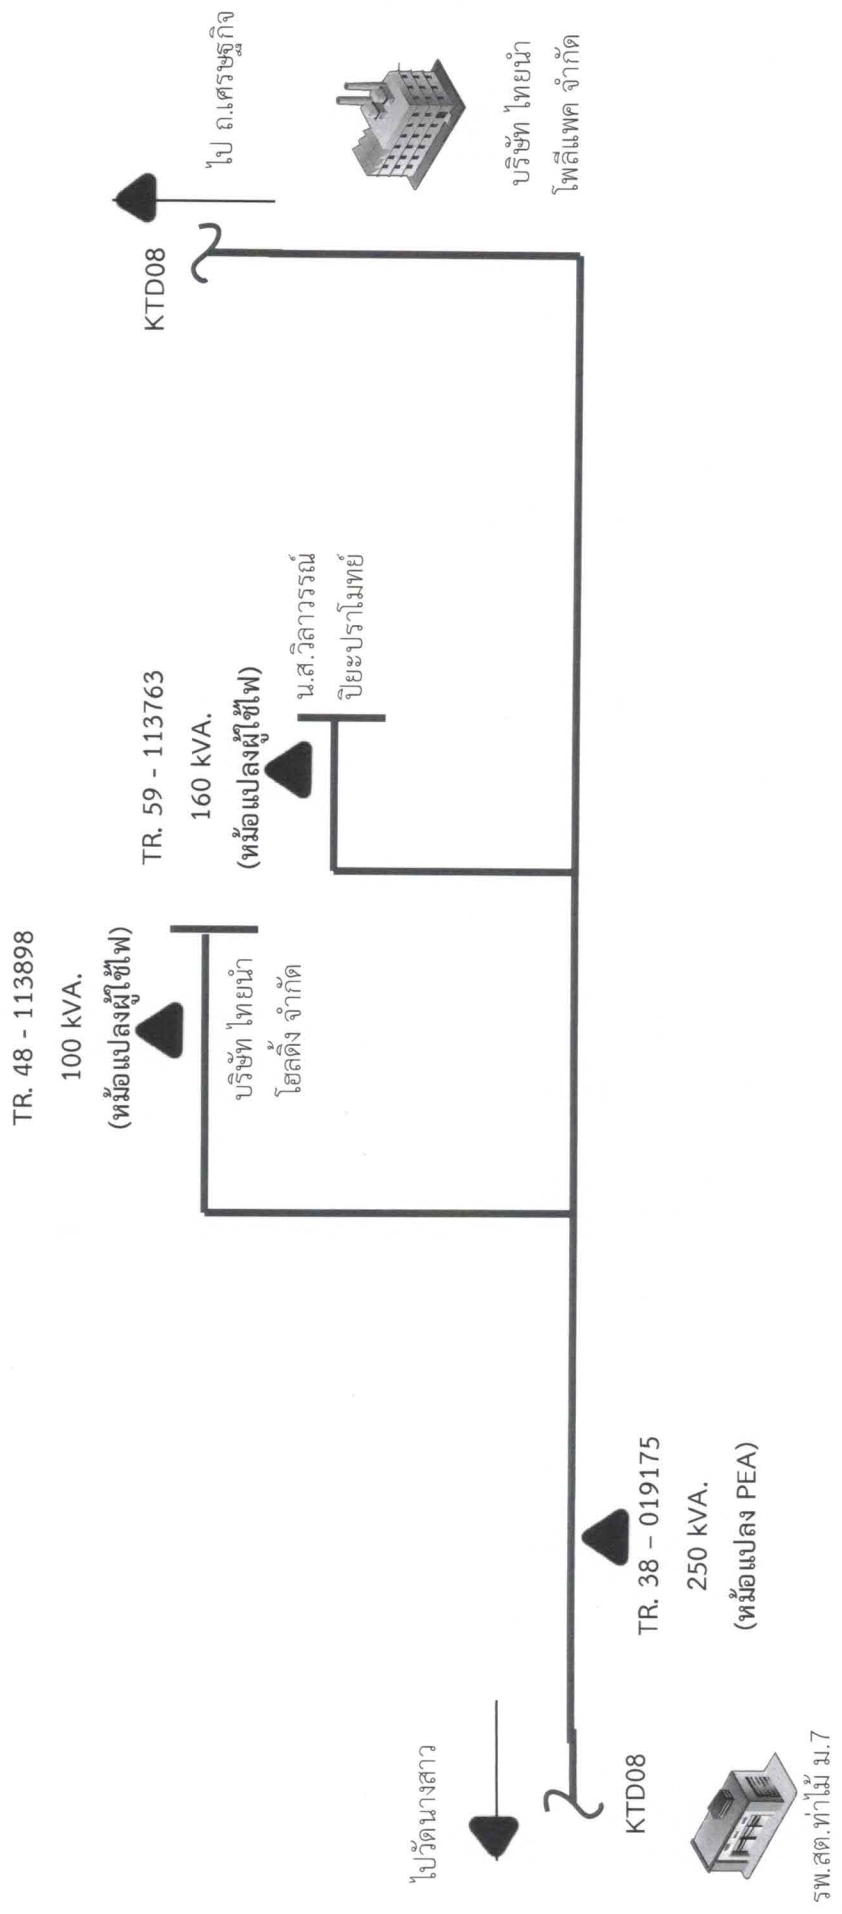

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 200 ราย

แผนผังสถานปัจจุบัน หลังตัดไป บริเวณ หน้าบริษัท ไทยนำ โพลีแพค จำกัด (ซอยวัดนางสาว 2)

เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กพส.กทบ. ปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบไฟฟ้า บริเวณ หน้า รพ.สต.ท่าไม้ ม.7 จนถึง หน้าบริษัท ไทยนำ โพลีแพค จำกัด (ซอยวัดนางสาว 2) วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2567 เวลา 8.30 – 17.00 น.

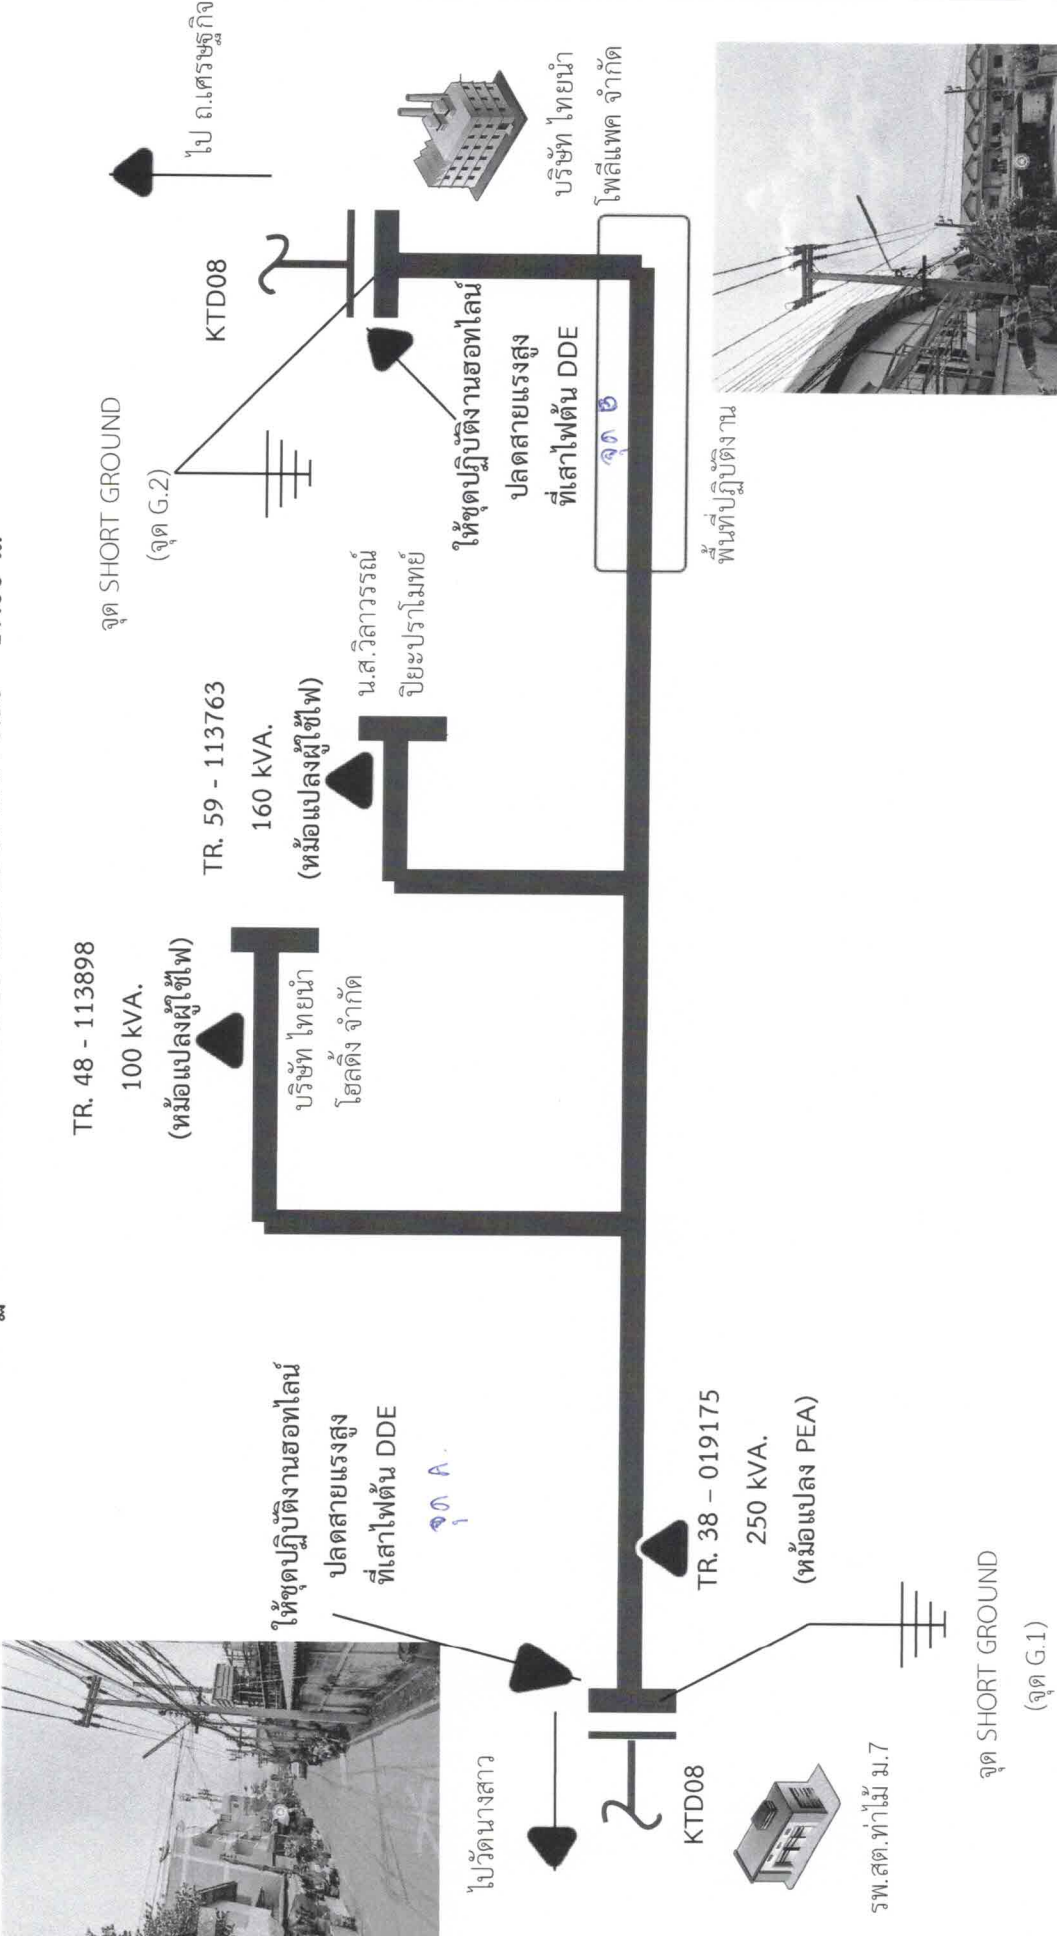

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ ประมาณ 200 ราย

พื้นที่ตัดไฟ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
