



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖..... วันที่.....๑๐ เมษายน ๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชราสุวรรณชด..... ตำแหน่ง.....อก.ปบ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา..... ตำแหน่ง.....รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอน ปักเสาและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒ บริเวณโค้งสะพานเลี้ยวเมืองสามเหลี่ยม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	4 ๑๐ สฟ.๒	๒๗/๐๔/๖๖ 27 เม.ย. 67	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนปักเสา และพาดสาย สะพานสามเหลี่ยม	SF๖ Disชั่วคราว สะพาน สามเหลี่ยม	DDEก่อนปัก เอสโซ่	โทร.๐๔๘-๒๗๕๓๖๔๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายฉนวนกร สุวรรณประทีป.....ตำแหน่ง.....พชง.๖ (สข.).....โทร.....๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำระ ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำระ
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....1.....พิดเดอร์.....SP๒๐4.....จาก.....SF๖.....เขต.....สะพานสามเหลี่ยม.....ถึง.....DPE ก่อนปักเอสโซ่

ในวันที่.....27 เม.ย. 67.....ตั้งแต่เวลา.....08:00.....น. ถึง.....17:00.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....534/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ.....นาย.....สุภัทรา.....วงศ์บุญพาศ.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายฉนวนกร.....สุวรรณประทีป

.....  
 (นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญพาศ)

วทก. 4 แทน นพ.กฟ.  
 ขั้นตอนการสวิตซ์.....2.....แผ่น

แผนผังแนบ.....1.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

สำหรับผู้อนุมัติ  
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....กฟภ.๓.....

อก.บช.(ก.๓),.....อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สะพานสามเหลี่ยม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 เม.ย. 67	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	รื้อถอน ปักเสา และพาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 534/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก	วันที่ 18 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, วรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		Load = 7.83 MW
4	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
5	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R วัดพันต่าสิ่ง
6	ย้ายโหลด SPB04 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG08						
7	DOA09S-12	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 สามเหลี่ยม
8	SF6 ชั่วคราวในไลน์ SPB04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ชั่วคราวสะพานสามเหลี่ยม
9	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
10	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการไลน์โหลด (หม้อแปลง 4 เครื่อง) ก่อนตัด DDE ก่อนบีมเอสโซ่ ตามผังแนบ						
11	เมื่อ กฟจ.สพ. ทำการไลน์โหลดแล้วเสร็จ						
12	แจ้ง HL ทำการตัด DDE บริเวณก่อนบีมเอสโซ่ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
13	เมื่อ HL ทำการตัด DDE บริเวณก่อนบีมเอสโซ่ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบแล้วเสร็จ						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ. รับทราบ						
15	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
16	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
17	เมื่อ กฟจ.สพ. ทำการ Short Ground ครบทั้ง 2 จุด พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
18	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
19	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
20	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
21	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R วัดพันต่าสิ่ง
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
24	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
25	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
26	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
27	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	วัดพันต่ำลิ่ง
28	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการปลด Short Ground จุด G1, G2						
29	เมื่อ กฟจ.สพ. ทำการปลด Short Ground จุด G1, G2 แล้วเสร็จ						
30	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE บริเวณก่อนบีมเอสโซ่ เข้าสนิททั้ง 3 เฟส						
31	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE บริเวณก่อนบีมเอสโซ่ เข้าสนิททั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
32	ย้ายโหลด SPB04 บางส่วนกลับจาก UTG08						
33	SF6 ชั่วคราวในไลน์ SPB04	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สพ.	SF6	ชั่วคราวสะพานสามเหลี่ยม
34	DOA09S-12	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA SF6	สามเหลี่ยม
35	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
36	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
37	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
38	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	R	วัดพันต่ำลิ่ง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๗...เดือน...เมษายน...พ.ศ. ...๒๕๖๗... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...โค้งสะพานเลี้ยวเมืองสามเหลี่ยม ...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี ๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเดอร์ ..๑๐.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี ๒... ตั้งแต่บริเวณ ..โค้งสะพานเลี้ยวเมืองสามเหลี่ยม

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นาย เดชาวัต คงเจริญ พชง.๖ ผก.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร ..ตำแหน่ง ผ.ก.ส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

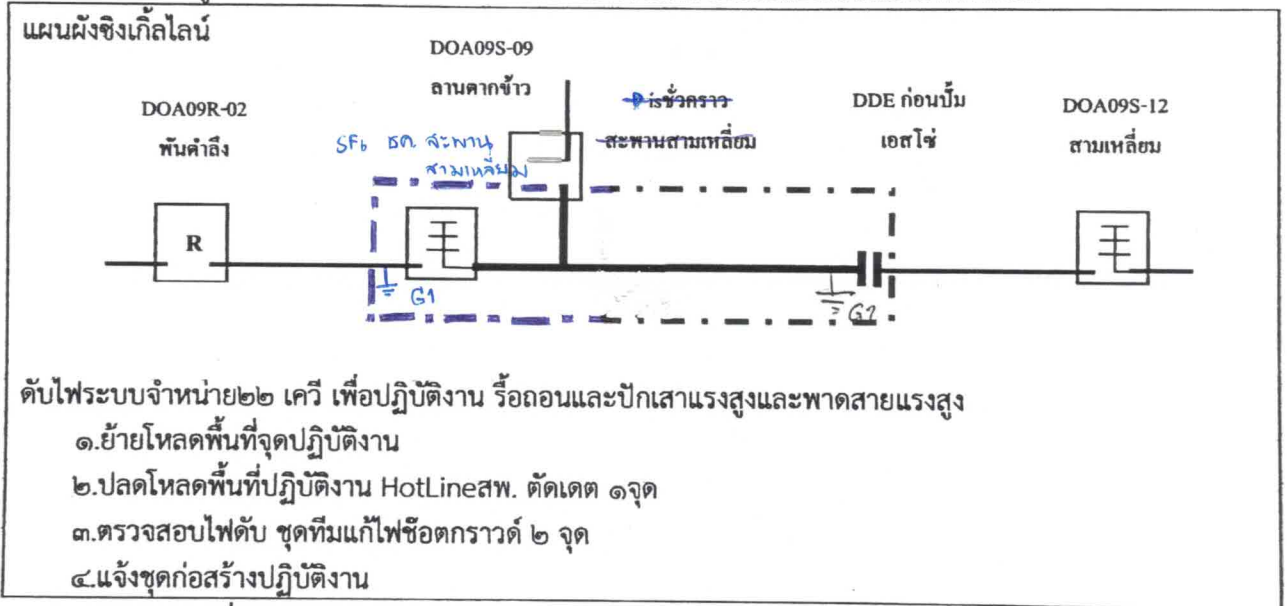

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)  
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนากร สุวรรณประทีป)  
พชง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐
